

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA

/ /

Nº

Nombre de la Obra:

"Rehabilitación de andador peatonal salida  
carretera Sayda - San Gabriel en la cabecera municipal,  
municipio de Sayda, Jalisco."

Número de Contrato:

SAH - OP/40/05/2020

Monto total de la obra:

\$ 1,230,230.44

Inicio de obra:

28 Febrero 2020.

Término de obra:

20 de Marzo 2020.

Director de Obras Públicas

Ing. Rodrigo Ponce Bernabe

SAVILA  
DIRECCIÓN  
DE OBRAS  
PÚBLICAS



Ing. ~~Rodrigo Ponce Bernabe~~  
Obras Públicas


Ing. ~~Sergio Cabrera~~  
Contratista.



FECHA 28 / 02 / 2020

Nº 001

Asistiendo en esta bitácora al día en curso  
se dan inicio a los trabajos de la obra:  
Rehabilitación de andador peatonal salida carretera  
de Sayda-San Gabriel en la cabecera municipal, municipio  
de Sayda, Jalisco, comenzando con los trabajos  
de trazo y nivelación a máquina ya que el andador  
cuenta con grietas y desniveles que impiden el  
buen funcionamiento para los usuarios.

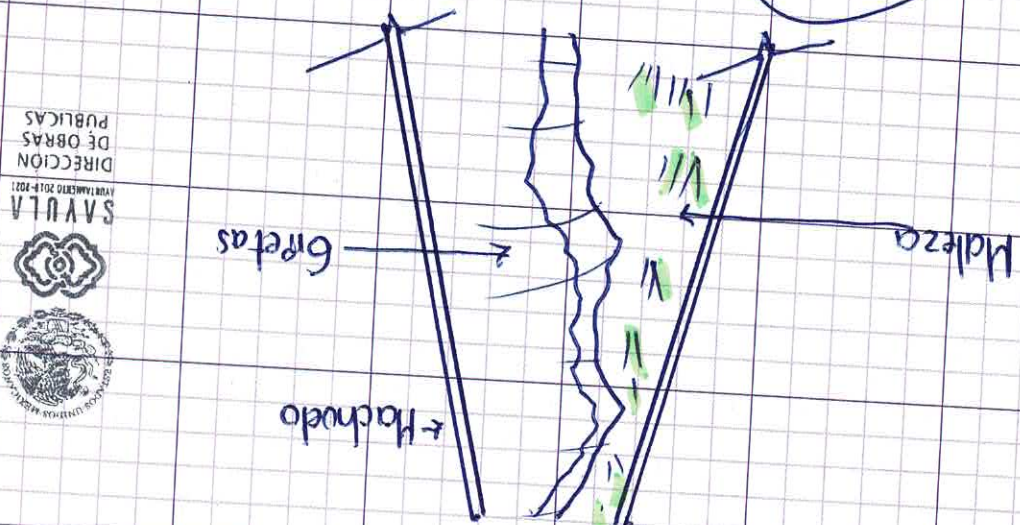

Ing. Sergio Cabrera

Ing. Rodrigo Lora Benítez




# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 06 / 03 / 2020

Nº 002

Asentando en ésta bitácora al día en curso  
continúan los trabajos de corte del terreno a máquina  
para recibir la base hidráulica, el ondador a  
rehabilitar cuenta con una longitud de 675 m  
por 2.80 m de ancho.

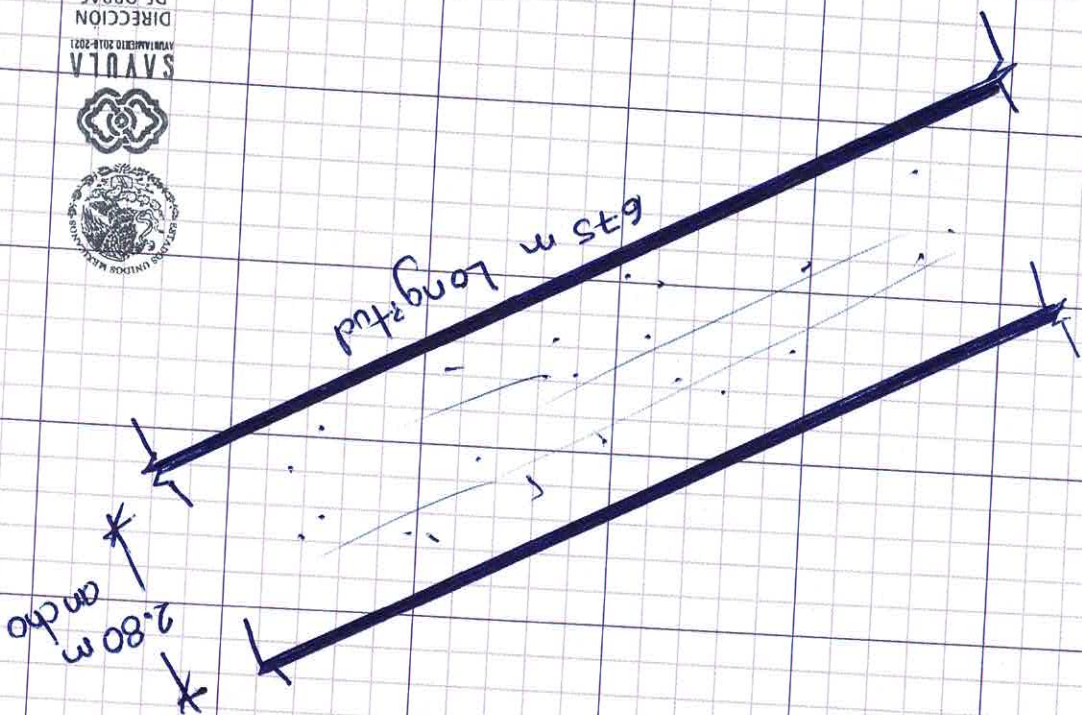

Ing. Rodrigo Lore Bernabe  
D. Obras Públicas

Ing. Sergio Cabrera  
Contratista



# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 13 / 03 / 2020

Nº 003

Se iniciaron con los trabajos de relleno de base hidráulica compactado al 95%, así como prosigue la elaboración de concreto pulido calor rojo oxidado integral al 6% con fibra de polipropileno



Ing. Rodrigo Fane Benabre  
Dir. Obras Públicas.

Ing. Sergio Cabrera  
Contratista.



# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 20 / 03 / 2020

Nº 004

Asentando en esta bitácora se conducen los trabajos de la obra, Rehabilitación de andador peatonal salida carretera Sayda San Gabán, los trabajos de concreto pido color rojo oxidado integral, lavado, cortado, lavado y sellado, quedado en funcionamiento para su correcto funcionamiento como andador peatonal. Se da por concluida la obra el 20/Marzo/2020.



Ing. Rodrigo Rave Berde.  
Obras Públicas.

Ing. Sergio Cabrera.  
Contratista.
