



# BITÁCORA

**“CONSTRUCCIÓN DE RED  
SANITARIA EN LA CALLE  
HERRERA Y CAIRO ENTRE LAS  
CALLES 5 DE FEBRERO Y  
LOPEZ COTILLA EN LA  
CABECERA MUNICIPAL DE  
SAYULA, JALISCO.  
SAYULA, JALISCO.”**



**NUMERO DE CONTRATO:**

SAY-OP/AD/19/2020

**MONTO TOTAL DE LA OBRA:**

953,661.71

**INICIO Y TERMINO DE OBRA:**

25/01/2021 AL 17/02/2021

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

ING. RODRIGO PONCE BERNABE

**Fecha: 25 de enero de 2021**

Queda asentado en esta bitácora de obra que el día viernes 25 de enero del año en curso se da inicio con la obra "CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y LOPEZ COTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO." estando presentes, el actual presidente Lic. Oscar Daniel Carrión, acompañado del director de obras públicas Ing. Rodrigo Ponce Bernabé.

- Se inician labores de trabajo, dando banderazo inicial funcionarios, vecinos de la colonia y encargados de obra.
- Se comienza con el trazo y nivelación para red de drenaje estableciendo ejes de referencia para proceder con la excavación.



**Fecha: 29 de enero de 2021.**

- Se da inicio a la excavación de cepas con maquinaria en ejes de referencia de fondo de cepas para la red de drenaje en tramo de calle Herrera y Cairo.
- Se da inicio al afine de taludes y fondo de cepa por medios manuales con pizon de mano en seco en tramo de calle.




**Fecha: 03 de febrero de 2021.**

- Se concluye excavación de eje de calle y se inicia la excavación para las descargas domiciliarias por medios manuales con pico y pala.
- Se da inicio al tendido de cama de arena con 10 centímetros de espesor para posteriormente recibir tubería de PVC para red de drenaje en tramo de calle Herrera y Cairo.



**Fecha: 08 de febrero de 2021**

- Se da por terminado el tendido de cama de arena de 10 centímetros de espesor y se inicia al tendido de tubería de PVC de 12”.
- Se continúa con el acostillado de la tubería con arena compactada con equipo y herramienta.
- Se comienza a realizar la conexión de tubería de PVC alcantarillado serie 25, de 12” de diámetro en eje de calle.

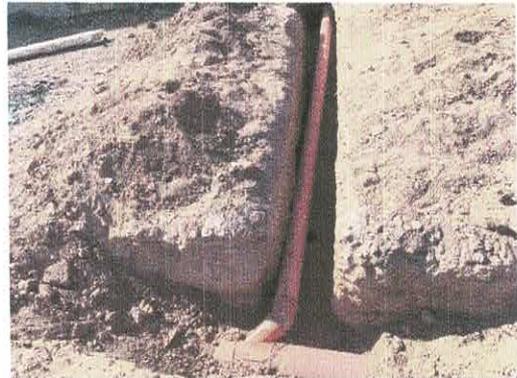

**Fecha: 10 de febrero de 2021**

- Se comienza con la construcción de pozos de visita tipo común de 1.20 mts de profundidad, acabado común con aplanado pulido sobre plantilla de mampostería.
- Se realiza la construcción de brocal y tapa de polietileno para pozo de visita de 60 centímetros de diámetro



**SAYULA**  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



**Fecha: 12 de febrero de 2021.**

- Se comienza con el relleno y compactación con material de la excavación en capas no mayores a 20 cm con humedad óptima y bailarina.




**Fecha: 17 de febrero de 2021.**

- Se asienta en esta bitácora que se comienza a retirar el material sobrante producto de la excavación de la obra en camión y se hace limpieza general de la obra.



**Fecha: 01 de marzo de 2021.**

- Se asienta en esta bitácora que se realiza la conexión con el pozo de vista existente.

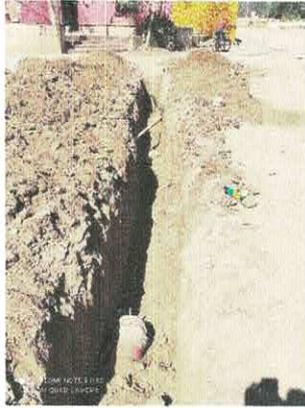

**Fecha: 08 de marzo de 2021.**

- Se realiza la colocación de los brocales de concreto en los pozos de vista realizados, asentados y nivelados con mortero a base de cemento y arena.



**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

  
**ING. RODRIGO PONCE BERNABÉ**



**SAYULA**  
AYUNTAMIENTO 2016-2021  
**DIRECCIÓN**  
**DE OBRAS**  
**PÚBLICAS**
