PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

Recibí
Brenda
30.may.18
8:19 hrs.

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN	SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
NUM. DE OFICIO	101/2018.
EXPEDIENTE	SG/NOT/ACTA55.

INGENIERO JORGE CAMPOS AGUILAR.
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL.
P R E S E N T E.

Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a bien hacer de su conocimiento que en el **Libro** de Actas de Ayuntamiento número **18** dieciocho, en el **Acta** Número **55** cincuenta y cinco de la **Sesión Extraordinaria** del Ayuntamiento, celebrada el día **16** dieciséis de **Abril** de **2018** dos mil dieciocho, en el **punto** número **3** tres del orden del día, quedó asentado el siguiente **acuerdo**:

"**Punto Número Tres**.- El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **unanimidad** la realización de la **obra** denominada **"PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ"** que a continuación se describe, por lo que este punto de acuerdo se aprueba en los siguientes términos: **Primero.-** Se autoriza al municipio de **Sayula, Jalisco,** la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2018 dos mil dieciocho, por el monto de **$1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)** con recursos provenientes del **FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL** con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 dos mil dieciocho, los cuales estarán sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Relación de Obras a ejecutar:

No.	Nombre de Obra	Monto
1	"PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ"	**$ 1,500,000.00**

Dichas obras ubicadas: calle Porfirio Díaz entre avenida Manuel Ávila Camacho Oriente y calle Independencia.

Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y a la encargada de Hacienda Pública Municipal Licenciada Adriana García Rodríguez para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. **Tercero.-** Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que afecte las participaciones federales

0000001

SECRETARIA GENERAL

y/o estatales, hasta por el monto de la obra referida en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas. Los costos derivados de las obras antes mencionadas se ejecutarán con recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2018 dos mil dieciocho por medio de la cuenta 8270-0300-6142, ocho, dos, siete, cero, guión, cero, tres, cero, cero, guion, seis, uno, cuatro, dos, con el número de partida presupuestal 6142, seis, uno, cuatro, dos. Autorizándose, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 26, 30, 31, 32, 33, 35 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, que las obras que se aprueban en este punto, se realicen por la modalidad de **administración directa**, en virtud de que así se aseguran las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad, además de que en las Direcciones de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano de nuestro Municipio se cuenta con la capacidad técnica y elementos necesarios para su realización."

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA."
SAYULA, JALISCO; MAYO 23 DE 2018.
CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

ABOGADO CARLOS FABIÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

SECRETARIA GENERAL

SAYULA
AYUNTAMIENTO 2015-2018
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

c.c.p. ABOGADO JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES. SÍNDICO MUNICIPAL.
c.c.p. LICENCIADA ADRIANA GARCÍA RODRÍGUEZ. ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
c.c.p. ARQUITECTO ALONSO SERRATOS VALLEJO. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
c.c.p. ABOGADO JUAN MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ. DIRECTOR DE CATASTRO.
c.c.p. CIUDADANO JUAN RAMON GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. DIRECTOR DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO.
c.c.p. ARCHIVO.

ACUSE

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN ADELANTE "GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADA POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, QUIEN ACTÚA ASISTIDO DE LOS CC. MTRO. ROBERTO LÓPEZ LARA Y MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO, EN ADELANTE "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR, LIC. JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES, LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ, EN SUS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y TESORERO RESPECTIVAMENTE, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo sucesivo "PEF 2018" en los anexos 21 y 21.2, correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el Renglón de Desarrollo Regional, se aprobó una asignación para el estado de Jalisco por la cantidad de $241,145,518.00 (doscientos cuarenta y un millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 00/100 M.n.) para Proyectos de Desarrollo Regional, en lo subsecuente **"LOS PROYECTOS"**

2.- En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 11 del "PEF 2018" la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los "Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2018.

3.- El Ejercicio y aplicación de los recursos de "LOS PROYECTOS" se deben realizar conforme a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4.- El Gobierno del Estado de Jalisco, presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario, solicitud de recursos para "LOS PROYECTOS"en términos del numeral 8, iniciso a) de "LOS LINEAMIENTOS".

DECLARACIONES

I. Declara "**GOBIERNO DEL ESTADO**", que:

a) Concurre a la celebración del presente Convenio a través del C. Gobernador Constitucional del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien actúa asistido de los CC. Roberto López Lara y Héctor Rafael Pérez Partida, en sus respectivos carácter de Secretario General de Gobierno y Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, quienes se encuentran facultados para ello, en términos de lo establecido en los artículos 36, 46 y 50 fracciones X, XVIII, XIX y XXVI de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los artículos

1, 2, 3 fracción I, 4 fracciones I, II y IX, 5 fracción II, 11 fracciones I, III y VI, 12 fracciones I y II, 13 fracciones I y IV y 14 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás disposiciones locales aplicables.

b) La Secretaría General de Gobierno:

I. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 12, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
II. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 fracción I de la Ley invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de conducir las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo del Estado con las autoridades federales, estatales o municipales, partidos y agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil.
III. Su titular el Mtro. Roberto López Lara, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por el artículo 13 fracciones I, IV y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

c) La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (la "SEPAF"):

I. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

II. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción XXXVII de la Ley invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de intervenir en los convenios que celebre el Gobierno del Estado con los gobiernos municipales.

III. Conforme a lo señalado por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas es la dependencia facultada para dirigir y coordinar el Sistema Estatal de Planeación para el desarrollo del Estado.

De conformidad a lo señalado por el artículo 14 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, entre sus atribuciones está la de promover en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, acuerdos de cooperación y colaboración entre el sector público y los sectores social y privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos del desarrollo de la entidad.

IV. Su titular el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por el artículo 14 fracciones I, II, III, VII, XIV y XX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

II. Declara "EL MUNICIPIO" que :

a) Es un municipio libre, que es un nivel de gobierno, así como una base de la organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco y que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Que el Ayuntamiento es el depositario del Gobierno y Administración Pública Municipal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3 4 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal.

00000004

b) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 79 y 81 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 38, fracciones II, V y VI de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal, tiene entre sus atribuciones y obligaciones: Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas tendientes a la realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado; celebrar convenios con el Estado a fin de que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio; y celebrar convenios de coordinación y asociación con otros municipios para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponden.

c) Los ciudadanos Ing. Jorge Campos Aguilar, Lic. Juan Gabriel Gómez Carrizales, Lic. Adriana Garcia Rodriguez, en sus respectivos cargos de Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, tienen facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, fracciones I, II y XI y 52, fracción II de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

d) Para los efectos de obligarse en los términos de este Convenio, conforme a los artículos 2 fracción II y 3 fracción III, en relación con los artículos 5, tercer párrafo y 13, fracción I, inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Honorable Ayuntamiento autorizó, por unanimidad de votos:

1) Que los CC. Ing. Jorge Campos Aguilar, Lic. Juan Gabriel Gómez Carrizales, Lic. Adriana Garcia Rodriguez, en nombre y representación del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, en sus calidades de Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, respectivamente, celebren y suscriban el presente convenio para la ejecución del proyecto de obra pública, contemplado en el Fondo Proyectos de Desarrollo Regional, con el Gobierno del Estado de Jalisco; 2) Que el Presidente Municipal, el Síndico y el Tesorero Municipal reciban el recurso correspondiente para canalizarlo exclusivamente a la ejecución de la obra pública validada por **"GOBIERNO DEL ESTADO"**; 3) A la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, a través de la Subsecretaría de Finanzas para que afecte las participaciones federales y estatales que correspondan al municipio para que realice las retenciones necesarias, hasta por la cantidad de **$1.500.000,00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)** en caso de incumplimiento de las obligaciones que adquiere el Gobierno Municipal por virtud del presente convenio, en el entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogará automáticamente la mencionada autorización para afectación de las aportaciones, las autorizaciones que se señalan en la presente declaración, constan en la respectiva acta de ayuntamiento, que para tales efectos presentó **"EL MUNICIPIO"**.

e) Sigue declarando, que conocen y se adhieren a **"LOS LINEAMIENTOS"**, del Fondo materia del presente Convenio de Subsidio, para los efectos de la aplicación de los recursos transferidos a **"EL MUNICIPIO"**, asumiendo la responsabilidad como Instancia Receptora, Ejecutora y Administradora del recurso federal.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15 fracción VI, 36, 46, 50 fracciones X, XIX, XXII y XXVI, 73, 77, 80 fracción VII y 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Jalisco; 1, 2, 3, 4 fracción I y II, 5 fracciones I y II, 6 fracciones I y IV, 8, 11 fracciones I y VI, 12 fracciones I y II , 13, 14 fracciones VII, XIV, XX y XXXVII, 35 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2, 38 fracciones V y VI, 47, fracciones I y XI, 52 fracciones I y II, de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal, **"LAS PARTES"** celebran el presente convenio, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente convenio tiene por objeto establecer la forma y términos para la transferencia, ejercicio, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que entrega **"El Gobierno del Estado"** a **"El Municipio"**, con cargo a **"Los Proyectos"**:

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS.- El **"GOBIERNO DEL ESTADO"** entregará a **"El Municipio"** la cantidad de $1.500.000,00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) monto que se entregará en dos exhibiciones, el 50% (cincuenta por ciento) en el mes de abril, el restante 50% (cincuenta por ciento) en el mes de junio de 2018, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, mismos que se destinarán a los proyectos descritos a continuación:

Proyecto	Monto
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL SOCIAL, EN SAYULA, JALISCO	1,500,000.00
TOTAL	1,500,000.00

TERCERA.- "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público" transferirá a la Auditoría Superior de la Federación el uno al millar de los proyectos convenidos para su fiscalización, asímismo podrá destinar hasta el uno por ciento del monto total asignado a **"Los Proyectos"** para su administración, de acuerdo al artículo 11 último párrofo del **"PEF 2018"** y los numerales 21 y 22 de **"Los Lineamientos"**

CUARTA.- CUENTA BANCARIA.- Previo a la entrega de los recursos a que se refiere la cláusula segunda, "El Municipio" deberá contratar en una institución de crédito legalmente autorizada, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo "La Cuenta", y registrarla en los términos de las disposiciones emitidas por la Tesorería de la Federación (TESOFE), para la identificación, registro y control de los recursos de "Los Proyectos".

El "Gobierno del Estado", a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se obliga a administrar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, únicamente en "La Cuenta", señalada para tal fin por "El Municipio". "Gobierno del Estado" se obliga a transferir los recursos en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los mismos. De igual manera el "Gobierno del Estado" deberá entregar, en la proporción que corresponda a "El Municipio", los rendimientos financieros generados, de acuerdo a lo señalado en el numeral 14 de "Los Lineamientos".

"Las Partes" acuerdan que los pagos relacionados directamente con la ejecución de las obras deberán realizarse exclusivamente desde "La Cuenta"que para tal efecto "El Municipio" aperturó para dicho fin.

00000006

QUINTA.- "LOS PROYECTOS".- Los recursos de "Los Proyectos" no pierden el carácter federal y tendrán como destino específico la ejecución de los proyectos descritos en el presente instrumento, los cuales deberán estar dentro de la circunscripción teritorial de "El Municipio".

De conformidad con lo establecido en el numeral 19 de "Los Lineamientos", los recursos objeto del presente convenio por ninguna circunstancia se podrán destinar a gasto corriente y de operación, salvo que se trate de los gastos indirectos mencionados en la cláusula Décima Primera de este instrumento.

SEXTA.- EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- La realización de "Los Proyectos" descritos en la Cláusula segunda del presente convenio, se llevará a cabo conforme al calendario de ejecución que se establece en el expediente técnico a que se refieren los numerales 4 fracción X y 8 inciso b) de "LOS LINEAMIENTOS". El calendario de ejecución de los proyectos inicia su vigencia a partir de que "El Municipio" reciba la primera ministración de los recursos.

La aplicación de los recursos de "EL FONDO" se sujetará a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

SÉPTIMA.- DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos a "Los Proyectos" podrán destinarse única y exclusivamente al aumento y mejora de las metas de los mismos que se describen en el presente instrumento, siempre y cuando la naturaleza de los mismos lo permitan, para lo cual deberán de estar vinculados a compromisos formales de pago antes del vencimiento del calendario de ejecución de cada proyecto. En caso contrario, los rendimientos financieros deberán reintegrarse a "La Tesofe".

En el supuesto de que se tengan economías o remanentes derivados de la ejecución de "Los Proyectos" deberán ser reintegrados a "La Tesofe".

OCTAVA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "El Municipio" deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la comprobación de la aplicación de los recursos que reciban para "Los Proyectos" en términos del presente convenio, de conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.

"El Municipio" deberá realizar de manera detallada y completa, el registro y control en materia jurídica, documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, que permitan acreditar y demostrar ante la autoridad federal o local competente, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria, integración de libros blancos y rendición de cuentas, corresponde a los recursos transferidos a través de este convenio.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" será responsable de la integración y veracidad de la información técnica que presenten, así como de los expediente técnicos correspondientes.

NOVENA.- DEL INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- Para el seguimiento de la ejecución de "Los Proyectos" "El Municipio" en términos en lo establecido en el numeral 17 de "LOS LINEAMIENTOS" deberá informar trimestralmente a La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos, en los términos del artículo 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

DÉCIMA.- DE LA AMPLIACIÓN DE CALENDARIO.- En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el calendario de ejecución definido en el presente convenio, "El Municipio" deberá solicitar por escrito a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, dentro del período otorgado para la aplicación de los recursosde cada obra, para que esta a su vez acuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que solicite la autorización para modificar el calendario de ejecución de obra.

DÉCIMA PRIMERA.- GASTOS INDIRECTOS.- Se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo total de la obra antes del Impuesto al Valor Agregado para cubrir erogaciones por concepto de gastos indirectos atribuíbles a la ejecución de "Los Proyectos". "El Municipio" deberá de asegurarse que estos gastos no excedan el porcentaje antes mencionado, de acuerdo al numeral 20 de "LOS LINEAMIENTOS".

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- "El Municipio" deberá asegurar a las instancias de control y fiscalización competentes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, Federal y Local, el total acceso a la información documental, contable y de cualquier otro índole relacionada con los recursos otorgados a "Los Proyectos".

De igual forma, en apego al numeral 27 de "Los Lineamientos", "El Municipio" asumirá plenamente los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con "Los Proyectos"

Las responsabilidades adminsitrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos municipales, así como los particulares, serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 28 de "Los Lineamientos".

Asímismo, las obras de infraestructura y las acciones que realice "EL MUNICIPIO" con cargo a recursos de este convenio, se sujetarán a las especificaciones y características de imagen y sobre la promoción de obras de infraestrucutra y acciones que realizan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2018.

"EL Municipio" deberá incluir en la presentación de su Cuenta Pública y de los informes sobre el ejercicio de los recursos otorgados para "Los Proyectos" objeto del presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 de "Los Lineamientos".

DÉCIMA TERCERA.- DIFUSIÓN.- Conforme a lo previsto en el numeral 30 de "Los Lineamientos" "El Municipio" deberá publicar y actualizar de manera trimestral, en su página de internet y en otros medios asequibles a los ciudadanos, la información relativa a la

00000008

descripción de las obras, montos, metas, proveedores y avances físicos y financieros de "Los Proyectos", así como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En apego a lo establecido en el numeral 32 y 33 de "Los Lineamientos", en la aplicación, erogación y publicidad de los recursos que se otorguen a "El Municipio" para "Los Proyectos", deberán observarse las disposiciones federales aplicables en materia electoral, por lo que la publicidad, documentación e información relativa a los mismos deberán de incluir la leyenda siguiente: *"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*. Adicionalmente en los proyectos de infraestructura que se realicen con cargo a los recursos otorgados a "Los Proyectos", se deberá incluir la leyenda siguiente: *"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"*.

DÉCIMA CUARTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- De conformidad con lo establecido por el numeral 23 de "Los Lineamientos", para el caso de obras ejecutadas por administración directa "EL MUNICIPIO" deberá destinar la cantidad equivalente al uno al millar de monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloría del Estado para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de "LOS PROYECTOS". Asimismo, en apego al numeral 24 de "LOS LINEAMIENTOS" en caso de que las obras se ejecuten mediante contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras deberán retener al momento del pago, un monto equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.- Se podrá suspender la ministración de los recursos cuando "El Municipio" incumpla con los plazos, términos y condiciones establecidos en el presente convenio y en "Los Lineamientos"

DÉCIMA SEXTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de suscripción, y terminará hasta que se haya aplicado la totalidad de los recursos de conformidad con el Calendario de ejecución a que se refiere la Cláusula Sexta del presente instrumento.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LAS PARTES" acuerdan que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente Convenio, cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por acuerdo de voluntades.

b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las siguientes:

i. Que **"EL MUNICIPIO"** destine los recursos federales previstos en el presente Convenio a fines distintos a los establecidos, o
ii. Incumplir con las obligaciones contraídas.

a) Por caso fortuito o fuerza mayor.

00000009

En caso de rescisión, **"EL MUNICIPIO"** deberá reintegrar a **"La Tesofe"**, el monto equivalente a los recursos que haya recibido, incluyendo los rendimientos financieros generados, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMA OCTAVA.- INTERPRETACIÓN.- "Las Partes" manifiestan su conformidad para interpretar en el ámbito de sus respectivas competencias y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente convenio, así como sujetar todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamentp y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMA NOVENA.- Todas las comunicaciones o notificaciones que **"LAS PARTES"** se hagan en relación con este Convenio, deberán ser por escrito y dirigirse a los domicilios señalados por las partes en la Cláusula Décima Séptima de este Convenio, conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas.

En caso que alguna de las partes cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, mediante aviso por escrito, con 15 (quince) días de anticipación a la fecha en que pretenda surta efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderán legalmente efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrumento.

VIGÉSIMA.- DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, **"LAS PARTES"** señalan como sus domicilios los siguientes:

GOBIERNO DEL ESTADO.- Av. Corona N°31, Palacio de Gobierno, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. Tel. 3668 -1700 ext. 33302.

EL MUNICIPIO.- Escobedo No.52 esq. Independencia Zona Centro C.P. 49300.

Enteradas **"LAS PARTES"** del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman en cuadriplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 09 nueve días del mes de abril del año 2018 dos mil dieciocho.

Por el "Gobierno del Estado"	Por el "Municipio"
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco	**Presidente Municipal**
Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz	Ing. Jorge Campos Aguilar

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

00000010

Secretario General de Gobierno

Mtro. Roberto López Lara

Síndico

Lic. Juan Gabriel Gómez Carrizales

Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida

Encargado de la Hacienda Municipal

Lic. Adriana Garcia Rodriguez

HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, EL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2018, EL CUAL CONSTA EN 09 NUEVES FOJAS ÚTILES POR EL ANVERSO, INCLUYENDO ÉSTA.

00000011

ACUSE

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN OBRAS PÚBLICAS.
NUM. DE OFICIO 0365/2018.
EXPEDIENTE ÚNICO.

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
JALISCO
27 MAR. 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
HORA: RECIBIÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Presente.

Anteponiendo un cordial saludo me permito solicitarle de manera formal los Recursos del Fondo PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 en el cual el municipio de Sayula, Jalisco se ha visto beneficiado con una asignación de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para la ejecución de la obra INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL SOCIAL EN SAYULA, JALISCO, para tal efecto entregamos la siguiente documentación:

Oficio de Solicitud de Recursos	
Número de las Facturas Electrónicas Entregadas (CFDI) ***SAY 1450*** y ***SAY 1451***	
Cuenta Bancaria	
Banco	BBVA Bancomer
Cuenta	0111654020
CLABE	012320001116540202
Beneficiario	SAYULA, FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018
Fecha de Apertura	26 de Marzo de 2018
Nombre y número de Sucursal	BANCA DE GOBIERNO JALISCO (0687)

Le agradezco su apoyo en los trámites de dicho fondo, me despido de Usted esperando contar con el apoyo para el municipio de SAYULA, JALISCO.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION."
SAYULA, JALISCO; MARZO 27 DEL AÑO 2018.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.

00000012

c.c.p. ARCHIVO.
J.C.A./rhpr

ACUSE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

RFC: MSA8501018C8

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ESCOBEDO N° Ext.52 Col.CENTRO CP.49300,SAYULA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 49300

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

RFC: SPC130227L99 **Registro de identificación fiscal:**

Residencia fiscal: -

Domicilio: C.PEDRO MORENO N° Ext.281 Col.CENTRO
CP.44100,GUADALAJARA,JALISCO,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2A3C0BA0-784B-4802-8E56-CA6B41A24E3A
Número de comprobante: SAY1450
Tipo de Comprobante: I-
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Fecha comprobante: 2018-03-27T08:50:25
Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-27T09:01:14
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
93161700	1	ACT - Actividad	Aportacion Federal del Fondo de PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 para la obra:Infraestructura para el Desarrollo municipal social en Sayula Jalisco Bancomer 012320001116540202 cta.0111654020	741,750.00	741,750.00

Subtotal	741,750.00
IVA (0) %	0.00
Total	**741,750.00**

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000304120483

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A3C0BA0-784B-4802-8E56-CA6B41A24E3A|2018-03-27T09:01:14|TSP080724QW6|Kwe42y6VOdvyJMDHYG7csbNmLYp9hJE2FBT1TF04e8Cr/CJaAhfT7pEB5BCuWXXWm1IwdcMFIAh00Sc8BAdlcMxS5WFnsnfeidNZLLripJNFabxu+htXs7WXrgpS4JckFx62WTwHd9IB3jJ1YCBWdzZpJFNj5s3wi+WUQAvNDT8=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

Kwe42y6VOdvyJMDHYG7csbNmLYp9hJE2FBT1TF04e8Cr/CJaAhfT7pEB5BCuWXXWm1IwdcMFIAh00Sc8BAdlcMxS5WFnsnfeidNZLLripJNFabxu+htXs7WXrgpS4JckFx62WTwHd9IB3jJ1YCBWdzZpJFNj5s3wi+WUQAvNDT8=

Sello digital del SAT:

EzFkQwqnVfbz9teoe536kAudnowebXrpaU5PasnDSGLh3cqvIXCRqEQc/IcUa/1fI5xHdiOEW83jYf0cPVp+xMc5B3UViS1DhYS6KJgrvTggZREwm9yoHUukZYzFrVS02I0ecdF0yw6fWOzJLHe1wDP038C1FKe3x7j3H3vZWPWBeh94CF8oeQclkvi8ost/FE8EatiH6LKTPm7FCdiAbWGLyXJpyDsOvdRDY94v8pyTc6IE8Pf6bjn8vCMOwbRw3S+9RbKNKyqX4AoZY0J3tpEgV5FrIPzbdMChynWGjV2MJnSy7Gt5D6V5W7XDrqj5+YtC7zjU4CewOaoGSw==

C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
FUNCIONARIO ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

Emitido por FACTUR@

00000013

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

RFC: MSA8501018C8

Factura

Domicilio y Expedido en:
ESCOBEDO N° Ext.52 Col.CENTRO CP.49300,SAYULA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 49300

Datos del receptor
Cliente: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
RFC: SPC130227L99 **Registro de identificación fiscal:**
Residencia fiscal: -
Domicilio: C.PEDRO MORENO N° Ext.281 Col.CENTRO
CP.44100,GUADALAJARA,JALISCO,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: BC673F5C-AF9D-4BF8-8D40-A5D3DDB18466
Número de comprobante: SAY1451
Tipo de Comprobante: I -
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Fecha comprobante: 2018-03-27T08:58:57
Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-27T09:07:41
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: P01 - Por definir

Tipo de relación: -
UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
93161700	1	ACT - Actividad	Aportacion Federal del Fondo de PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 para la obra:Infraestructura para el Desarrollo municipal social en Sayula Jalisco Bancomer 012320001116540202 cta.0111654020.	741,750.00	741,750.00

Subtotal	741,750.00
IVA (0) %	0.00
Total	**741,750.00**

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000304120483

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC673F5C-AF9D-4BF8-8D40-A5D3DDB18466|2018-03-27T09:07:41|TSP080724QW6|ULh5u7xtzZwG1tJp+ikLZ+eSVvfasAzO7grb3kr2WWVIq/123MfDYR0Acr3ulUYkAKids8GNKktHEXS0ifxBprALXN3uV4KfZw6fH98JVi4oO4MOoz8MJ6gS0rismVkTFuaSt3A0L16uzCZn0VOnsKe3Tij2iCPs3jNiqtJMxVU=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

ULh5u7xtzZwG1tJp+ikLZ+eSVvfasAzO7grb3kr2WWVIq/123MfDYR0Acr3ulUYkAKids8GNKktHEXS0ifxBprALXN3uV4KfZw6fH98JVi4oO4MOoz8MJ6gS0rismVkTFuaSt3A0L16uzCZn0VOnsKe3Tij2iCPs3jNiqtJMxVU=

Sello digital del SAT:

qQJmYitYSOQ89KSUPHOi6NcwANjIWkpWerI/OygWqJnLFrgRHghygWpxV6f8f5vc1uG17bwmTfUuP8e1xsUnTpkXpWqJIZVnrmGl8nSqkS+YXMPZIz6PEIJ6KZdWDGo5tWxTzQ5FLCurBnXC/dgBswxSN+Gu/n3PIu2dK2KC3o8el1wbpx1NoEhf3aWp50iWzPxY/QATPSW5p0lrp8V1rZ1pNIsr1e4NPYIfACeS8tGq/Jmocj59dEoxqJOzufZIw8fwx2jPb5mJzI+RCPCLrDO3jFDDHfQgjFcvbzGTA6xxM98fIHqqJuqeppnEMtkuHyIndxth1vIH5AIRU4Yw==

0000014

C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
FUNCIONARIO ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

Emitido por FACTUR@
Aspel de Mexico S.A. de C.V.

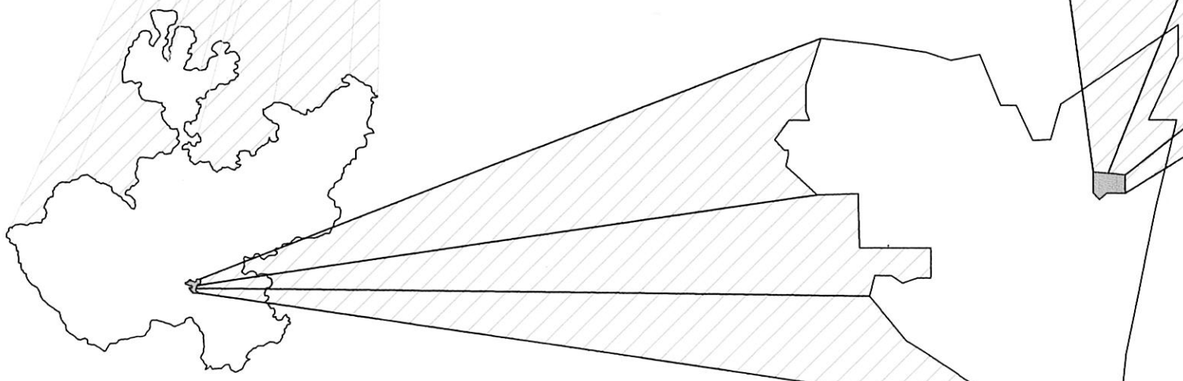

00000015

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 – 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OP DEURB

Localización:

Simbología:

Proyecto:
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:
MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN

Lugar:
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

Elaborado por:
ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala:	Lámina:
SIN ESCALA	01
Acotación: SIN ESCALA	
Fecha: MARZO 2018	

ÁREA DE APLICACIÓN

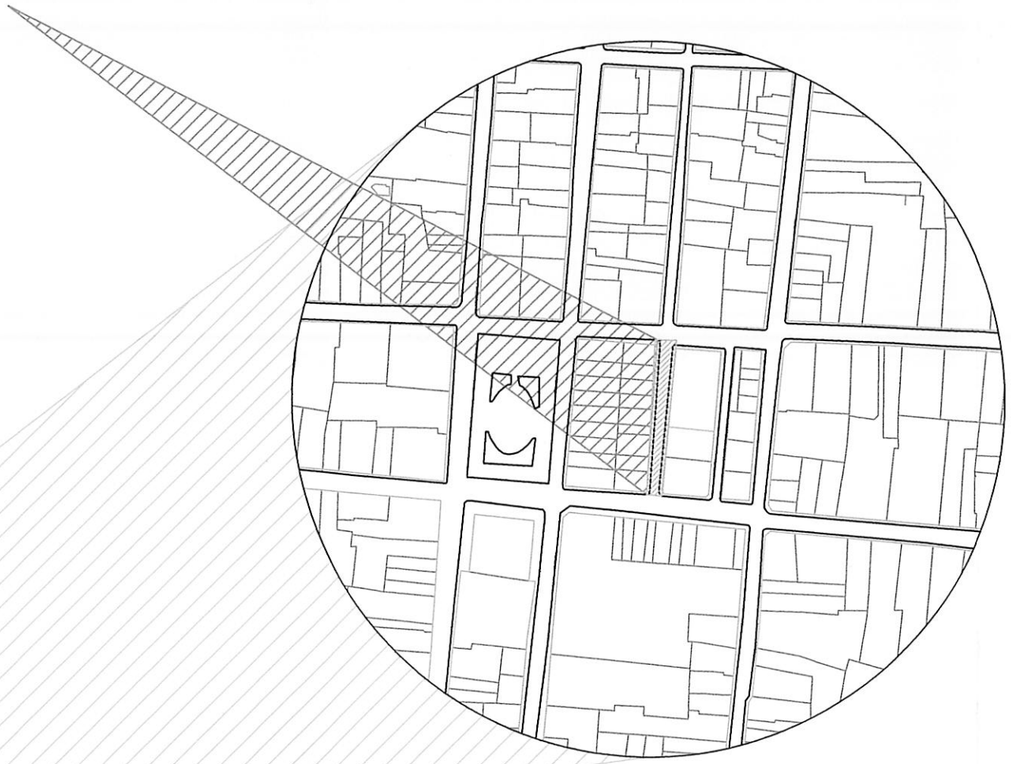

PLANO DE SAYULA, JAL

ÁREA DE APLICACIÓN

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OP DEURB

Localización:

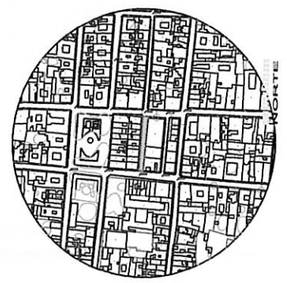

Simbología:

Proyecto:
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:
ÁREA DE APLICACIÓN

Lugar:
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

Elaborado por:
ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala:
SIN ESCALA

Acotación:
SIN ESCALA

Fecha:
MARZO 2018

Lámina:
02

00000016

LOCALIZACIÓN SATELITAL

PLANO DE SAYULA, JAL

ÁREA DE APLICACIÓN

00000017

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 – 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OP DEURB

Localización:

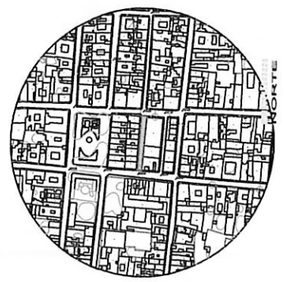

Simbología:

Proyecto:
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:
LOCALIZACIÓN SATELITAL

Lugar:
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

Elaborado por:
ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala:
SIN ESCALA

Acotación:
SIN ESCALA

Fecha:
MARZO 2018

Lámina:
03

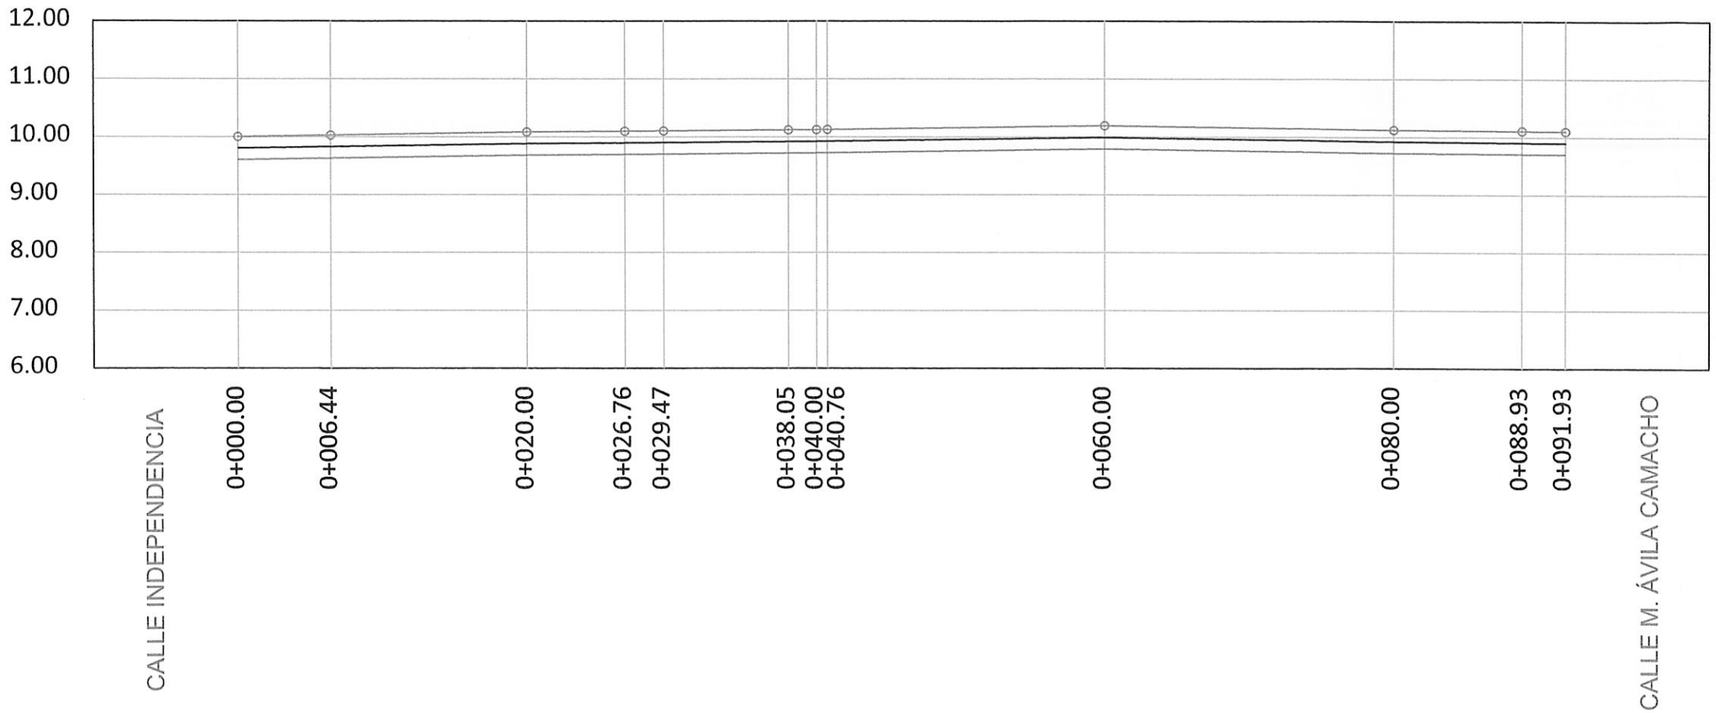

PERFIL DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

00000013

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DEURB

Localización:

Simbología:

Proyecto:
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:
PERFIL DE CALLE

Lugar:
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

Elaborado por:
ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala:
SIN ESCALA

Acotación:
SIN ESCALA

Fecha:
MARZO 2018

Lámina:
04

Estación 0+000.00



Estación 0+006.44



Estación 0+020.00



Estación 0+026.76



Estación 0+029.47



Estación 0+038.05



Estación 0+040.00



Estación 0+040.76



Estación 0+060.00



Estación 0+080.00



Estación 0+088.93



Estación 0+091.93



00000019

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Localización:

Simbología:

Proyecto:
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:
SECCIONES DE CALLE

Lugar:
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

Elaborado por:
ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala:
SIN ESCALA

Acotación:
SIN ESCALA

Fecha:
MARZO 2018

Lámina:
05

PLANTA DE CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

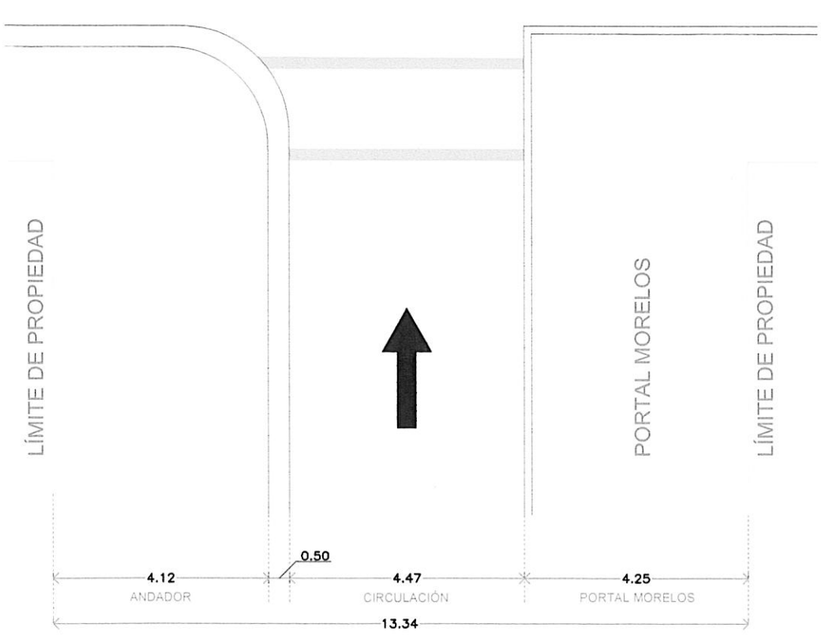

PLANTA EN CALLE

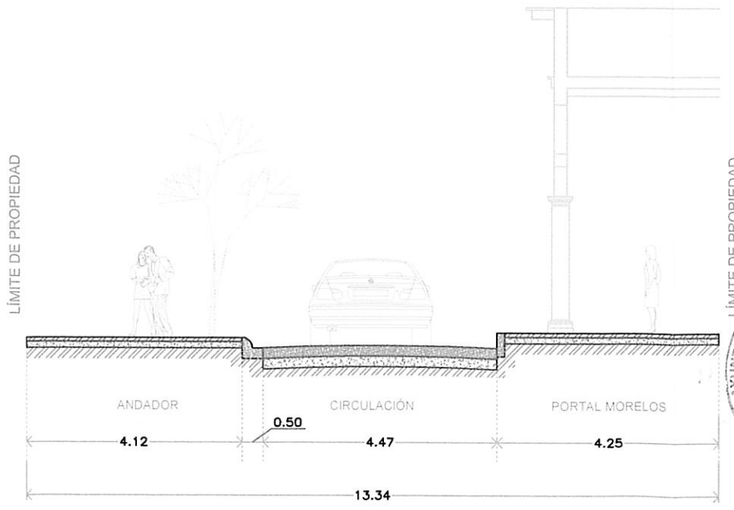

SECCIÓN DE CALLE

00000020

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Localización:

Simbología:

TOTAL: 411.10 M2
ÁREA DE CONCRETO ESTAMPADO

Proyecto:
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:
PLANO DE PAVIMENTO

Lugar:
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: **Sello:**

Elaborado por:
ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala: SIN ESCALA

Acotación: SIN ESCALA

Fecha: MARZO 2018

Lámina: 06

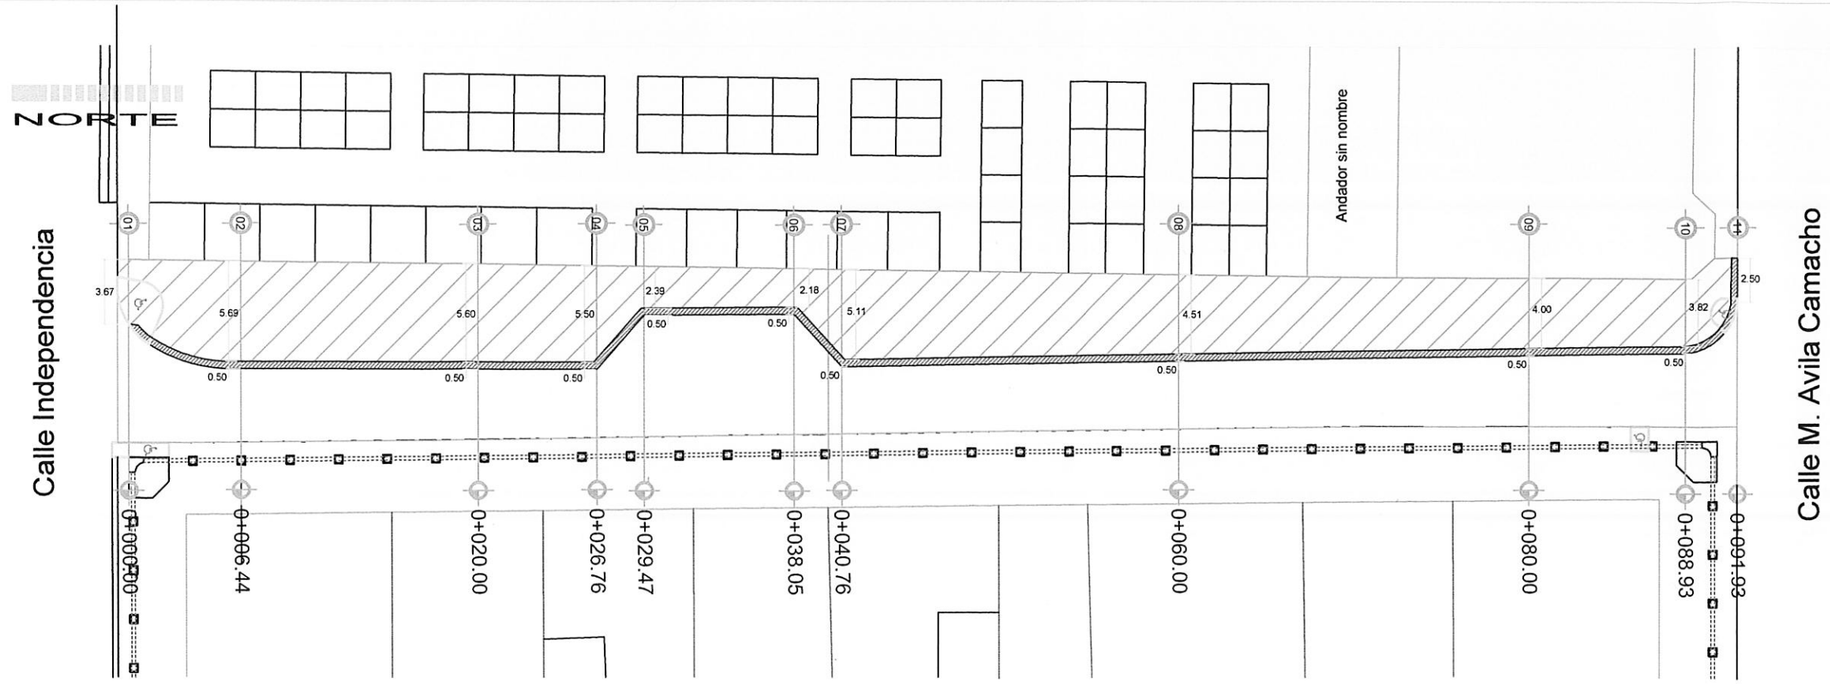

PLANTA DE MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

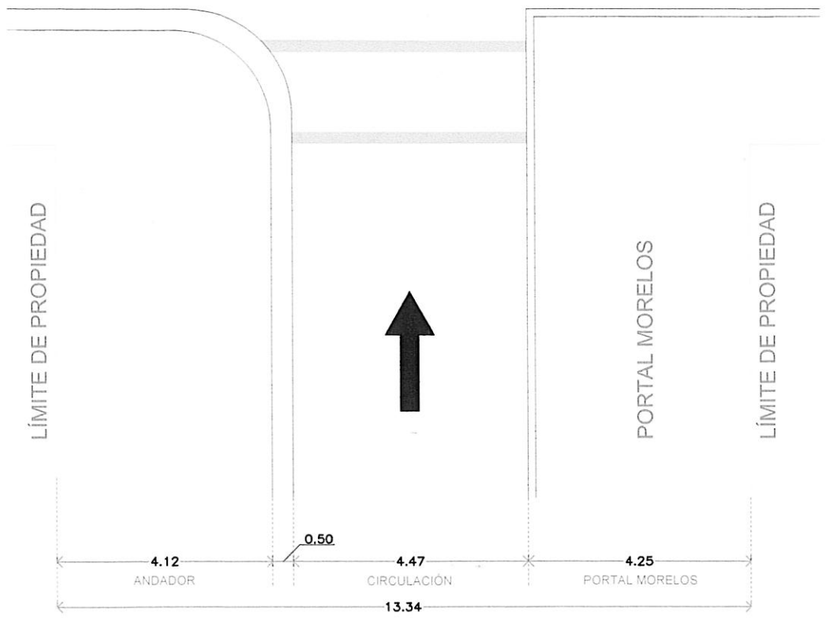

PLANTA EN CALLE

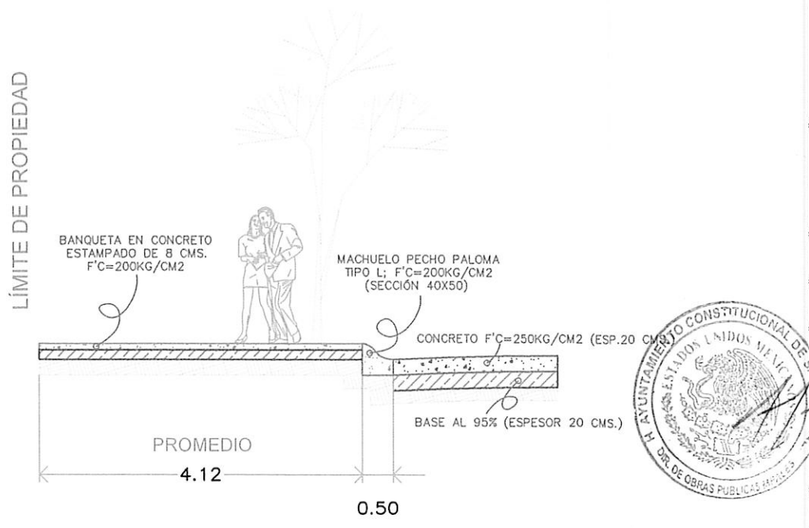

SECCIÓN TIPO DE BANQUETA

0000021

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Localización:

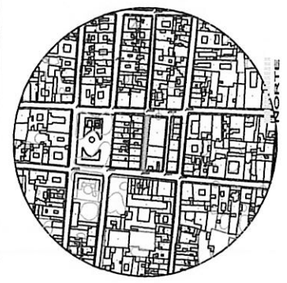

Simbología:

TOTAL: 409.52 M2
ÁREA DE BANQUETA

TOTAL: 99.39 ML
MACHUELO PECHO PALOMA 40X40

Proyecto:
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:
PLANO DE MACHUELOS Y BANQUETAS

Lugar:
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

Elaborado por:
ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala:
SIN ESCALA

Acotación:
SIN ESCALA

Fecha:
MARZO 2018

Lámina:
07

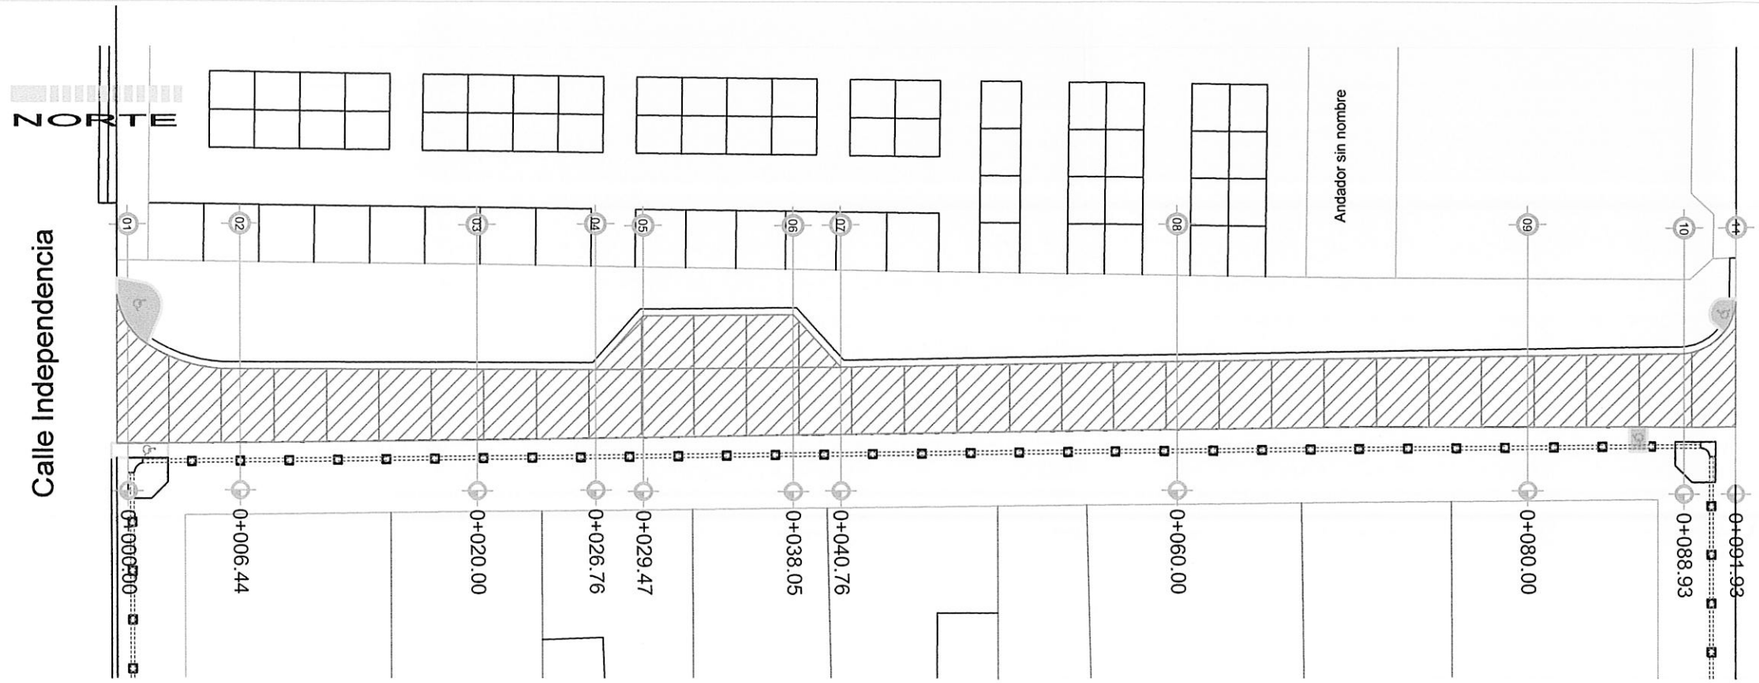

PLANTA DE RAMPAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

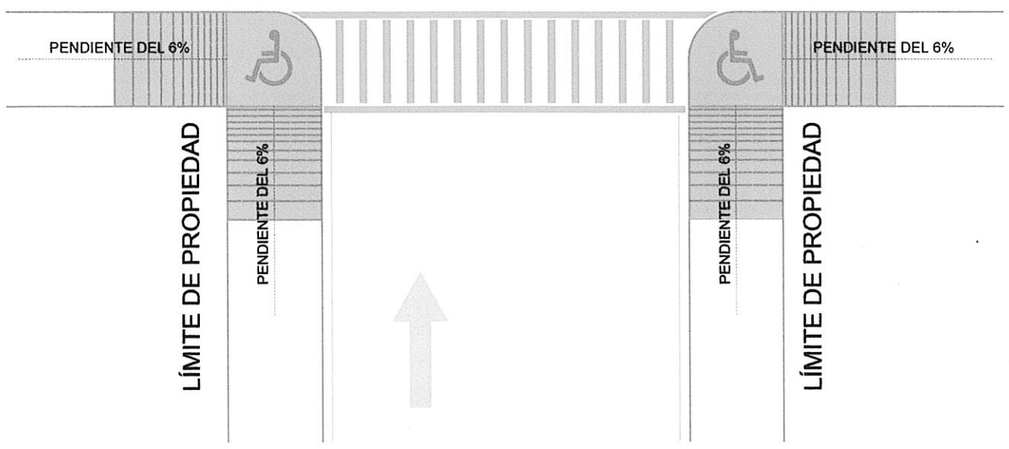

DETALLE DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

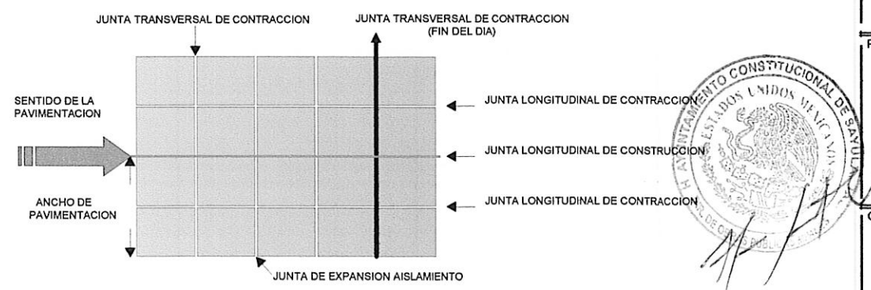

JUNTA LONGITUDINAL Y TRANSVERSALES



JUNTA LONGITUDINAL



JUNTA TRANVERSAL

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 – 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DEURB

Localización:

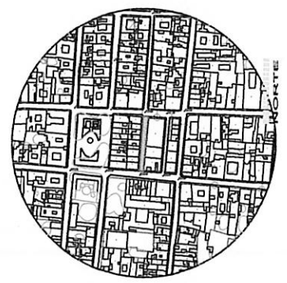

Simbología:

RAMPA PARA DISCAPACITADOS

BALIZAMIENTO

Proyecto:
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:
PLANO DE RAMPAS , BALIZAMIENTO Y CORTES DE PAVIMENTO.

Lugar:
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

Elaborado por:
ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala:
SIN ESCALA

Acotación:
SIN ESCALA

Fecha:
MARZO 2018

Lámina:
08

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000023

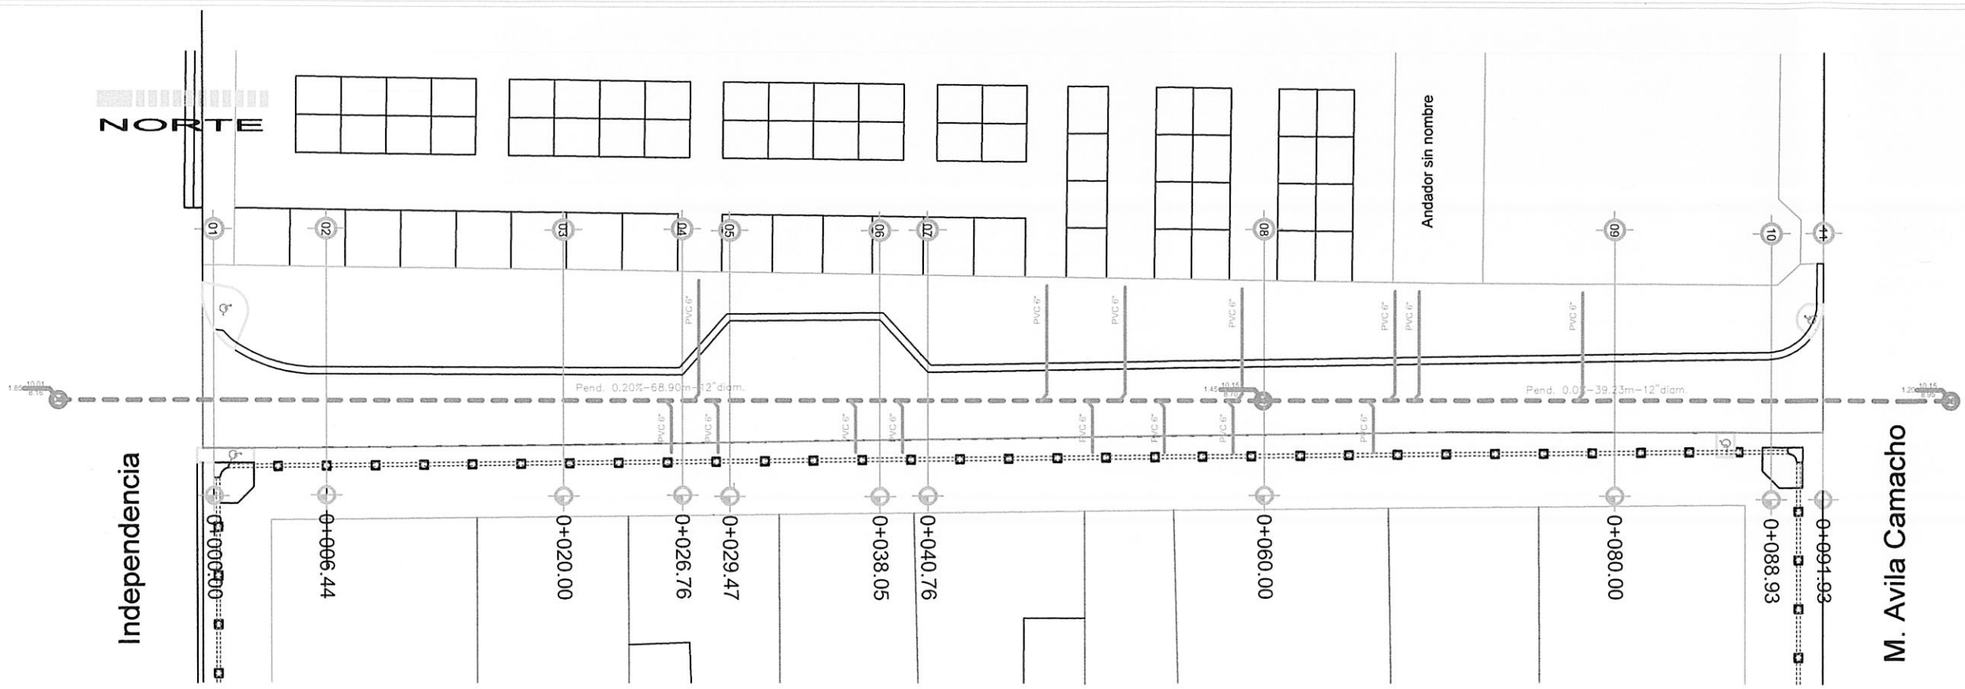

RED DE DRENAJE SANITARIO ACTUAL DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

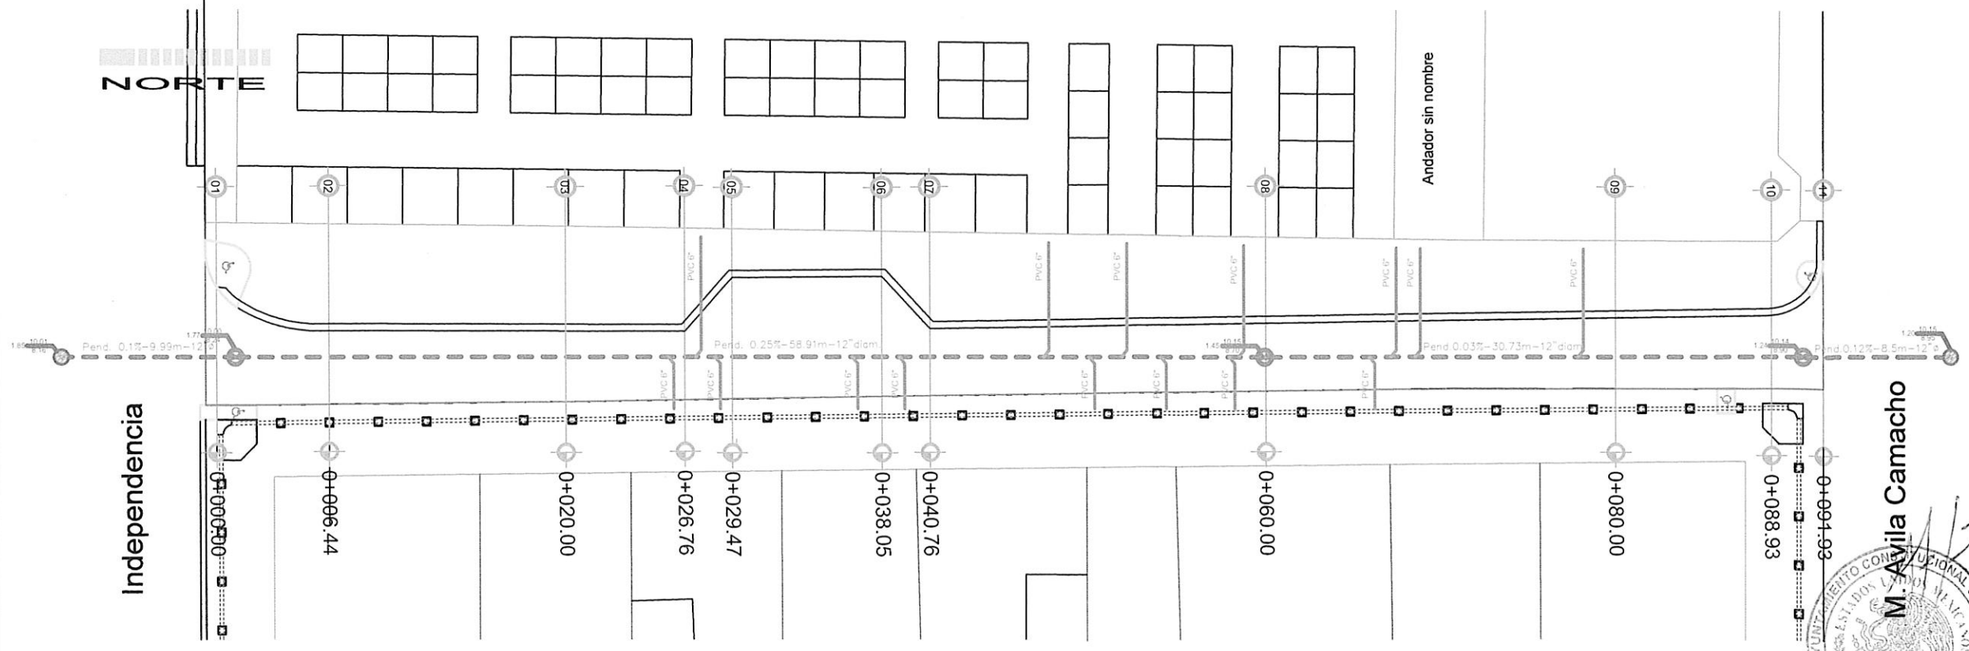

RED DE DRENAJE SANITARIO PROPUESTO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DEURB

Localización:

Simbología:

RED DE DRENAJE 12". TOTAL= 108.13 ML

RED DE DRENAJE DE 6". TOTAL= 15 PZA

01 POZO DE VISITA TOTAL= 3 PZA

No RASANTE / PROFUNDIDAD / ARRASTRE

Proyecto:

PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:

PLANO DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACTUAL Y PROPUESTO.

Lugar:

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

M. Avila Camacho

Elaborado por:

ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala: SIN ESCALA

Acotación: SIN ESCALA

Fecha: MARZO 2018

Lámina: 09

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
00000023

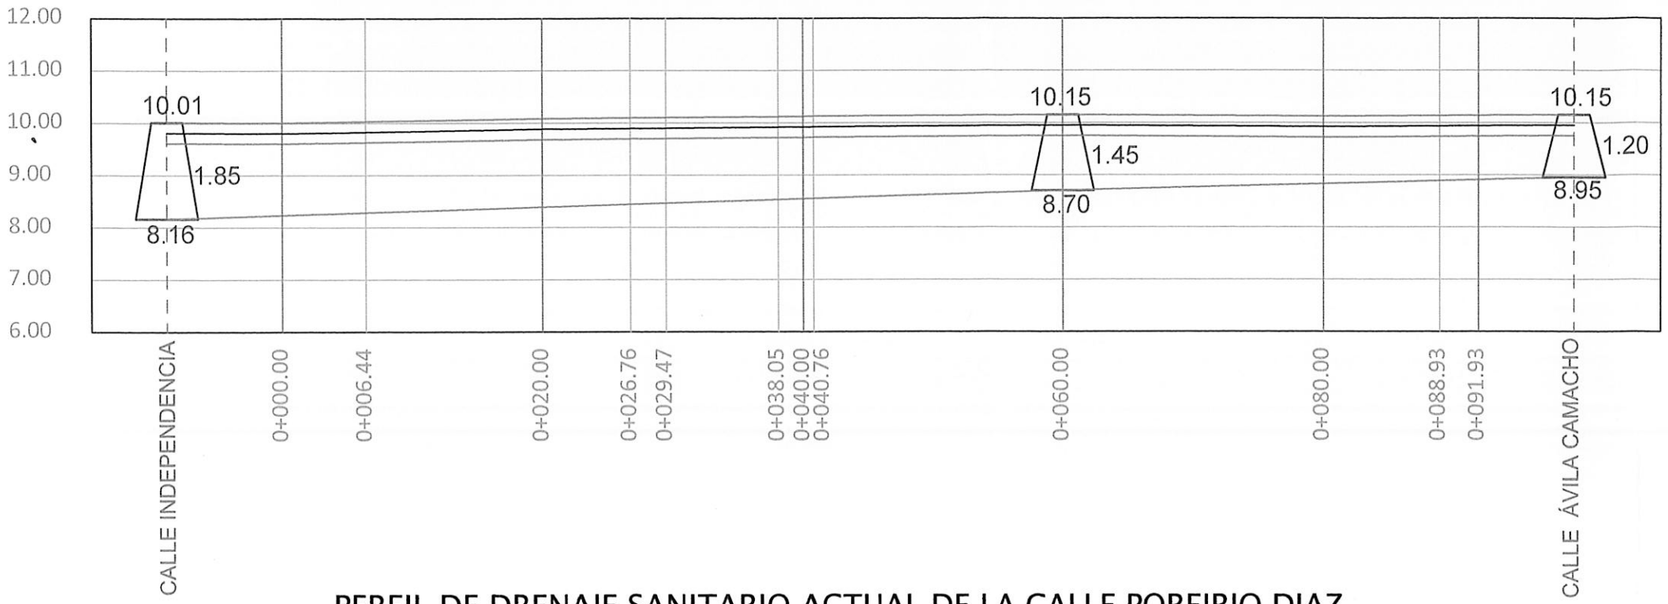

PERFIL DE DRENAJE SANITARIO ACTUAL DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

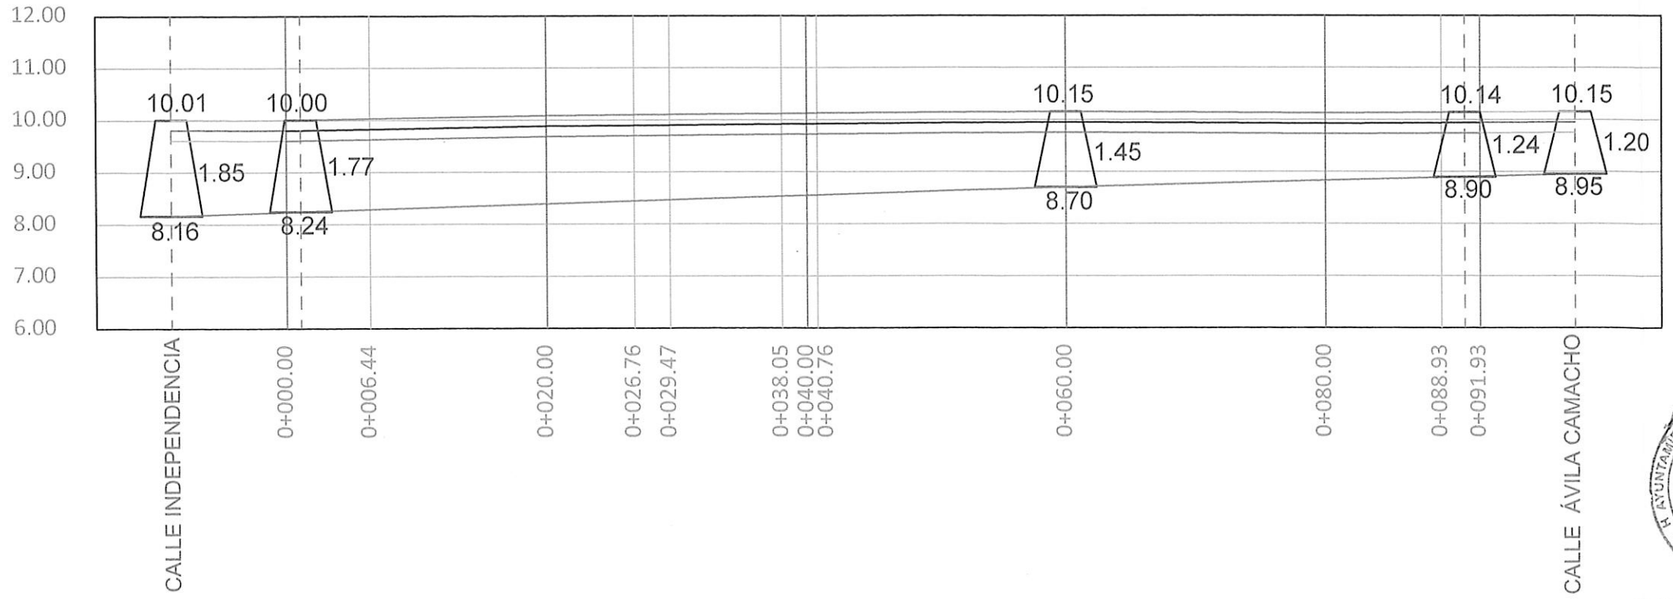

PERFIL DE DRENAJE SANITARIO PROPUESTO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 – 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DEURB

Localización:

Simbología:

Proyecto:
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:
PERFIL DE DRENAJE ACTUAL Y PROPUESTO.

Lugar:
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIS.

Elaborado por:
ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala:
SIN ESCALA

Acotación:
SIN ESCALA

Fecha:
MARZO 2018

Lámina:
10

00000024

ANCHO EN ZANJAS SEGUN LA PROFUNDIDAD DEL FONDO Y EL DIAMETRO DE LA TUBERIA.

DIAMETRO		PROFUNDIDAD										
CMS	PLGS	HASTA 1.25 M.	DE 1.26 A 1.75 M.	DE 1.76 A 2.25 M.	DE 2.76 A 2.75 M.	DE 2.76 A 3.25 M.	DE 3.25 A 3.75 M.	DE 3.76 A 4.25 M.	DE 4.26 A 4.75 M.	DE 4.76 A 5.25 M.	DE 5.26 A 5.75 M.	DE 5.76 A 6.25 M.
15	6	60	60	65	65	70	70	75	75	75	80	80
20	8	60	60	65	65	70	70	75	75	75	80	80
25	10		70	70	70	70	70	75	75	75	80	80
30	12		75	75	75	75	75	75	75	75	80	80
40	16		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
45	18		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
61	24		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
76	30			155	155	155	155	155	155	155	155	155
91	36			175	175	175	175	175	175	175	175	175
107	42				190	190	190	190	190	190	190	190
122	48				210	210	210	210	210	210	210	210
152	80				245	245	245	245	245	245	245	245
183	72					280	280	280	280	280	280	280
213	84					320	320	320	320	320	320	320
244	96					360	360	360	360	360	360	360

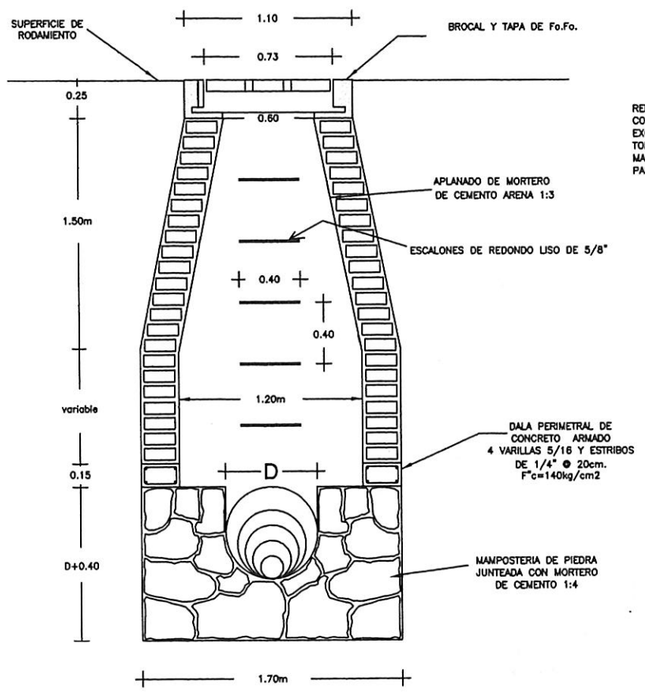

DETALLE DE POZO DE VISITA

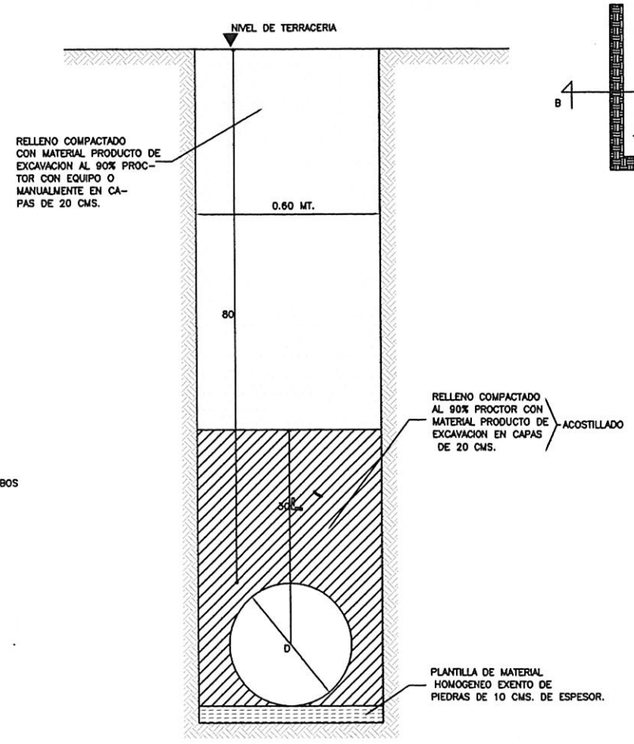

DETALLE DE ZANJA



DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO. (CORTE)



DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO (VISTA EN PLANTA)

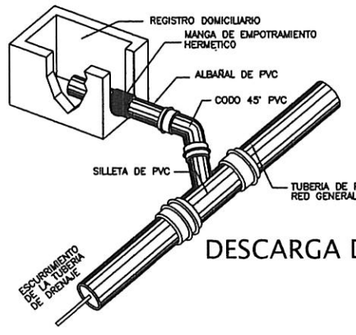

DESCARGA DE ALBAÑAL

000000

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 – 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DEURB

Localización:

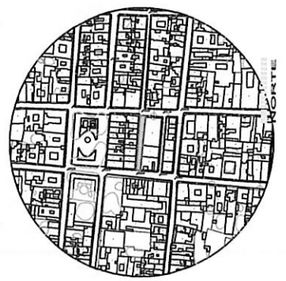

Simbología:

Proyecto:
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:
DETALLES CONSTRUCTIVOS RED DE DRENAJE SANITARIO.

Lugar:
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

Elaborado por:
ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala:
SIN ESCALA

Acotación:
SIN ESCALA

Fecha:
MARZO 2018

Lámina:
11

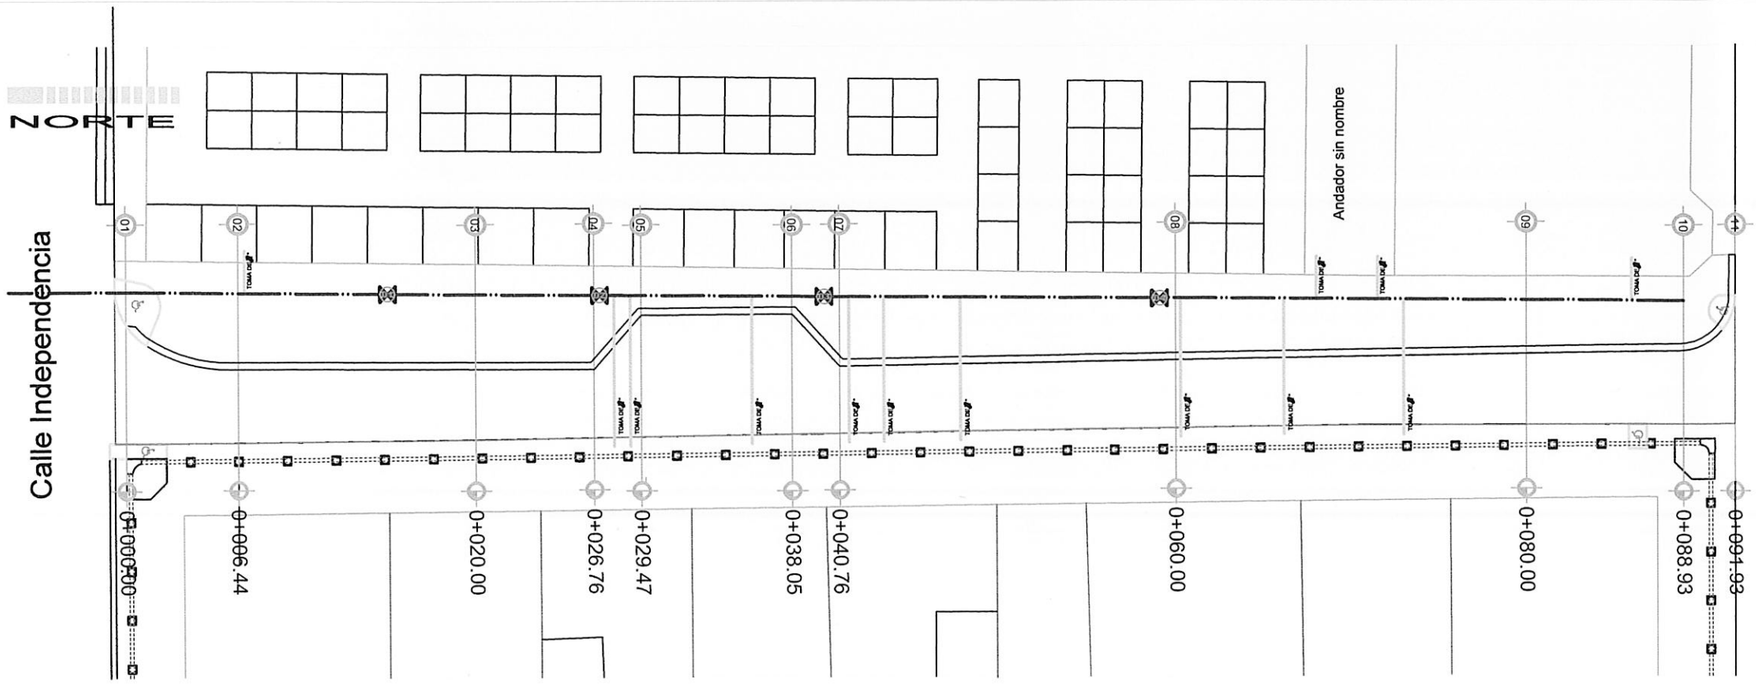

RED DE AGUA POTABLE ACTUAL DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

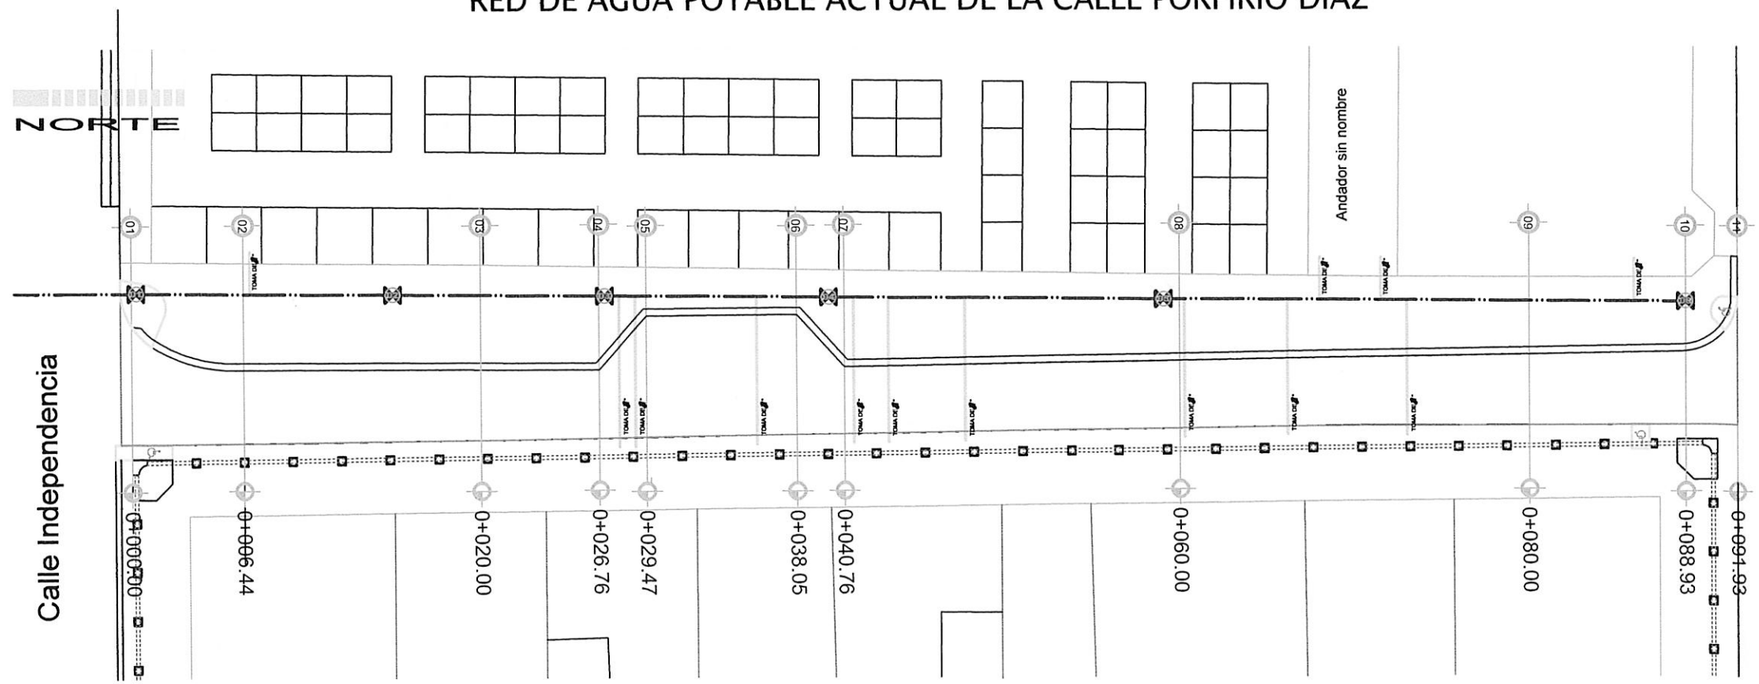

RED DE AGUA POTABLE PROPUESTA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DEURB

Localización:

Simbología:

RED DE AGUA POTABLE 3". TOTAL=95.63 ML

TOMA DOMICILIARIA 1/2". TOTAL= 13 PZA

CAJA DE VALVULAS TOTAL= 6 PZA

Proyecto:

PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:

PLANO DE RED DE AGUA POTABLE ACTUAL Y PROPUESTA.

Lugar:

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

Elaborado por:

ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala:

SIN ESCALA

Acotación:

SIN ESCALA

Fecha:

MARZO 2018

Lámina:

12

00000026

DISEÑO DE CRUCEROS

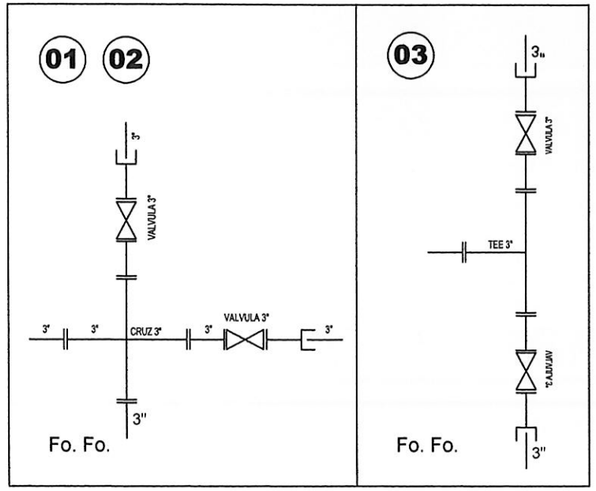

ESPECIFICACIONES DE LA EXCAVACION

DIAMETRO	NOMINAL	ANCHO
milimetros	pulgdas	en cms.
25.4	1	50
50.8	2	55
63.5	25	60
76.2	3	60
101.6	4	60
152.4	6	70
203.2	8	75
254.0	10	80
304.8	12	85
355.6	14	90
406.4	16	100
457.2	18	115
508.0	20	120
609.6	24	130

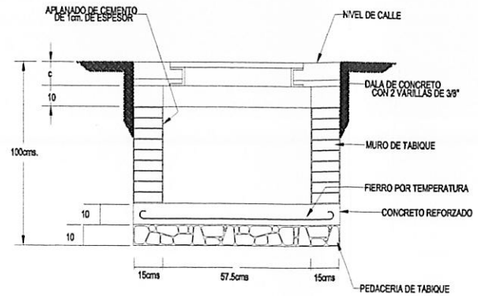

ELEVACION

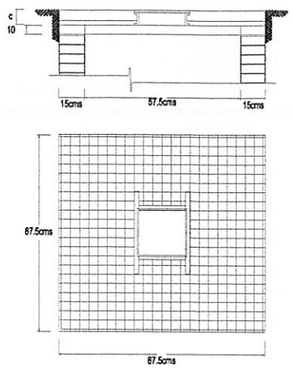





CORTE A-A



TAPA DE F.F.

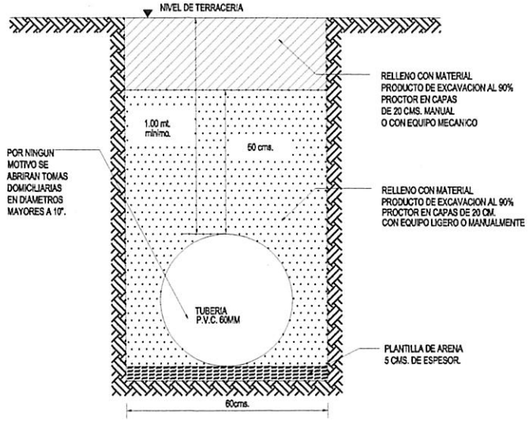

DETALLE DE CEPA

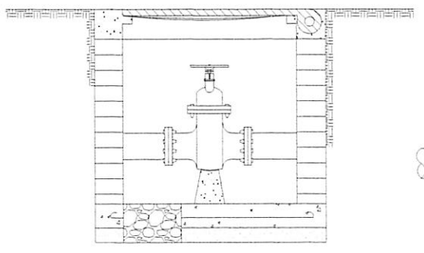

CAJA DE VALVULAS



TE

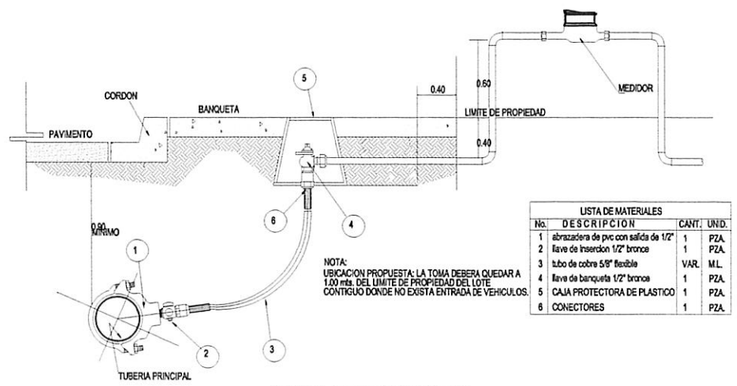

LISTA DE MATERIALES			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
1	abrazadera de pvc con salida de 1/2"	1	PZA.
2	llave de insercion 1/2" bronce	1	PZA.
3	tubo de cobre 5/8" flexible	VAR.	M.L.
4	llave de banqueta 1/2" bronce	1	PZA.
5	CAJA PROTECTORA DE PLASTICO	1	PZA.
6	CONECTORES	1	PZA.

TOMA DOMICILIARIA



DETALLE DE TAPA

H AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 – 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Localización:

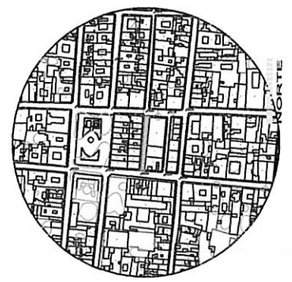

Simbología:

Proyecto:
PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ.

Contenido:
DETALLES CONSTRUCTIVOS RED DE AGUA POTABLE.

Lugar:
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.

Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Firma: Sello:

Elaborado por:
ARQ. YADIRA NATALIA RAMOS LARIOS

Escala:
SIN ESCALA

Acotación:
SIN ESCALA

Fecha:
MARZO 2018

Lámina:
13

00000027

OBRA: PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RED DE DRENAJE.

1. *Generalidades*

La ejecución de las obras de alcantarillado para las calles de las localidades deberá realizarse de acuerdo con los planos aprobados del proyecto por parte del departamento de obras públicas del h. ayuntamiento de Sayula. En caso de existir modificaciones durante el proceso de la obra, deberán de establecerse en los planos del proyecto de construcción, indicando así la ubicación definitiva de las obras ejecutadas.

2. Trabajos preliminares

2.1 *Trazo y nivelación de redes de alcantarillado*

Para realizar la ejecución de la obra se necesitaran datos sobre la topografía de la zona para establecer el área de ejecución del proyecto y así realizar el trazado de la red durante la excavación de las zanjas y en el asentamiento de las tuberías.

Los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de la obra se llevarán a cabo con la ubicación y fijación de ejes, líneas de referencia por medio de puntos ubicados con elementos inamovibles. Estos serán de acuerdo con la referencia indicada en los planos. El trazo, alineamiento, gradiente, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión de la nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes. En caso de existir alguna modificación de los perfiles por exigirlos, así circunstancias de carácter local, deberá recibir previamente la aprobación de la supervisión.

3. *Excavación*

3.1. Generalidades

Los trabajos de excavación deberán estar precedidos del conocimiento de las características físicas locales, tales como: naturaleza del suelo, topografía y

00000028

existencia de redes de servicios públicos. De acuerdo con las condiciones del suelo es recomendable hacer sondeos en sitio para verificar, y conocer con anticipación si es necesario hacer tablaestacado o cimbrado de zanjas.

La excavación será hecha a mano o con equipo mecánico de acuerdo al tipo de suelo, a trazos, anchos y profundidades necesarias para la construcción, de acuerdo a los planos replanteados en obra y/o presentes especificaciones.

3.2. Clasificación del terreno

Para los efectos de la ejecución de obras de saneamiento en el medio rural-urbano para este proyecto se considera el siguiente tipo de terreno

a) Terreno tipo II: Las excavaciones se pueden realizar sin dificultad a pulso y/o con equipo mecánico, y pueden ser: terreno consolidado o compacto: Conformado por terrenos consolidados tales como: hormigón compacto, afirmado o mezcla de ellos, etc., los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o equipo mecánico.

3.3. Excavación de zanjas

a) Se deberán eliminar las obstrucciones existentes que dificulten las excavaciones.

b) Las zanjas que van a recibir los colectores se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje (coincidente con el eje de los colectores), respetándose el alineamiento y las cotas indicadas en el diseño.

c) El ancho de las zanjas dependerá del tamaño de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación. En el cuadro 1, se presenta valores de ancho recomendables en función a la profundidad y diámetro de la tubería (véase a continuación).

d) El ancho de la zanja deberá ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto.

e) Si se emplea equipo mecánico, la excavación deberá estar próxima a la pendiente de la base de la tubería, dejando el aplanamiento de los desniveles del terreno y la nivelación del fondo de la zanja por cuenta de la excavación manual.

f) El material excavado deberá ser colocado a una distancia tal que no comprometa la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma,

sugiriéndose una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo no entibado, no menor de 30 cm.

DIAMETRO		PROFUNDIDAD										
CMS	PLGS	HASTA 1.25 M.	DE 1.26 A 1.75 M.	DE 1.76 A 2.25 M.	DE 2.76 A 2.75 M.	DE 2.76 A 3.25 M.	DE 3.25 A 3.75 M.	DE 3.76 A 4.25 M.	DE 4.26 A 4.75 M.	DE 4.76 A 5.25 M.	DE 5.26 A 5.75 M.	DE 5.76 A 6.25 M.
15	6	60	60	65	65	70	70	75	75	75	80	80
20	8	60	60	65	65	70	70	75	75	75	80	80
25	10		70	70	70	70	70	75	75	75	80	80
30	12		75	75	75	75	75	75	75	75	80	80
40	16		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
45	18		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
61	24		139	155	139	135	135	135	135	135	135	135
76	30			155	155	155	155	155	155	155	155	155
91	36			175	175	175	175	175	175	175	175	175
107	42				190	190	190	190	190	190	190	190
122	48				210	210	210	210	210	210	210	210
152	60				245	245	245	245	245	245	245	245
183	72					280	280	280	280	280	280	280
213	84					320	320	320	320	320	320	320
244	96					360	360	360	360	360	360	360

Cuadro 1. Ancho de la zanja según la profundidad del fondo y el diámetro de la tubería

j) En los planos generales se darán las recomendaciones de acuerdo al tipo de terreno. Las zanjas se realizarán con la profundidad indicada por el perfil longitudinal.

k) La utilización de taludes en ocasiones se utiliza de acuerdo al entorno urbano, debido a las superficies que requiere, la realización de taludes consiste en dar a las paredes una inclinación de acuerdo con la pendiente de la calle.

l) En caso de realizar taludes en las zanjas, se debe considerar como ancho útil es al espacio que existe entre las paredes del entibado, excluyendo el espesor del mismo.

m) En este punto es necesario especificar con las excavaciones para los pozos de visita deben tener las dimensiones de diseño aumentadas del espacio debido al entibado y a las formas, en caso sean necesarias.

n) En caso de reposiciones o reparación de redes y cuando el terreno se encuentre en buenas condiciones, se excavará hasta una profundidad mínima de 0,15 m por debajo del cuerpo de la tubería extraída.

o) Las excavaciones no deberán efectuarse con demasiada anticipación a la instalación de las tuberías, para evitar derrumbes y accidentes.

4. Suministro e instalación de tubería para línea de drenaje sanitario y sus ramales

4.1. Generalidades

El tipo y clase de material de la línea de alcantarillado será determinado por el proyectista de acuerdo a las características de la misma; topografía del terreno,

00000030

recubrimiento y mantenimiento de la línea a instalar, tipo y calidad de suelo. Toda tubería de drenaje deberá contar con su diseño específico de cruce, que contemple básicamente la protección de pozos de visita a una distancia no mayor de 50 mts.

4.2. Refine y nivelación

Para proceder a instalar las líneas de alcantarillado, previamente las zanjas excavadas deberán estar refinadas y niveladas.

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo.

La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobada de acuerdo a lo especificado en el siguiente punto.

- La nivelación del terreno a lo largo del recorrido de los colectores se realizará en intervalos de 20 mts.

4.3. Cama de apoyo

El tipo y la calidad del apoyo que tenga una tubería que ha sido tendida en una zanja, es otro factor que influye notablemente en la capacidad de soporte de los conductos enterrados. El fondo de la zanja debe conformarse para proveer un apoyo firme, estable y uniforme a lo largo de toda la longitud de la tubería.

Las características dentro del proyecto para la cama de apoyo se indican en las especificaciones técnicas del proyecto realizando una cama de arena fina de 10 cms.

Los materiales más económicos son: arena, fina o triturado pequeño, ya que su compactación se obtiene con un mínimo de apisonamiento, es por esto y su resistencia en el material que se utiliza arena de rio.

00000031

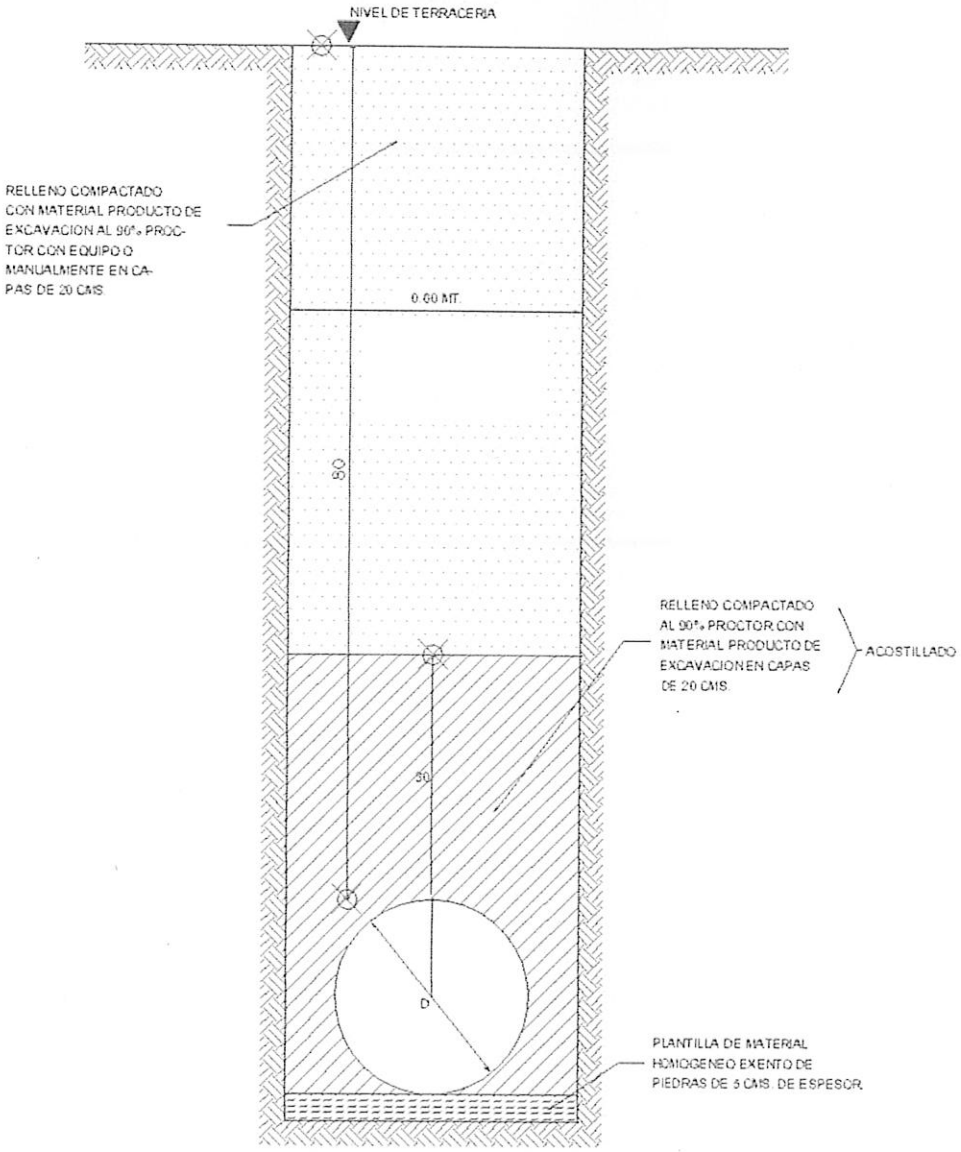

Imagen 1.- Detalle de zanja de drenaje. Visualización de cama de apoyo, acostillado y relleno

4.4. Instalación de tuberías de drenaje y sus ramales

Se describe a continuación el procedimiento de colocación de las líneas de drenaje.

a) Nivelación y alineamiento. Las tuberías deberán quedar alineadas según el eje de la excavación, sin que exista ninguna deformación a lo largo de la línea de

00000033

caída. La instalación de un tramo se empezará por su parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana de la tubería, quede con dirección aguas arriba.

Los ramales serán conectados de acuerdo a la inclinación y con el material indicado para obtener una pendiente como mínima del 2% además se iniciará la colocación de los tubos de aguas abajo para aguas arriba.

b) Uniones o juntas. Las uniones que juntarán las conexiones entre los tubos y su hermeticidad, se utiliza elásticas: anillos de jebe. Estas uniones deben tener las características de impermeabilidad, facilidad de operación, flexibilidad, disponibilidad, costo reducido. Estas uniones tendrán un aplicado de manteca vegetal dando como función lubricar la tubería y así realizar su conexión como se muestra en las siguientes imágenes.

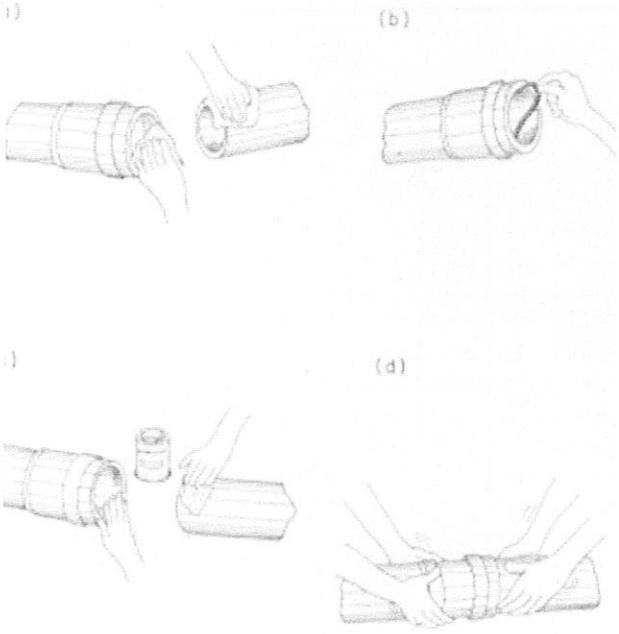

Imagen 2.- Instalación de tubería de drenaje

e) Acostillado de la tubería de drenaje. Se realiza una compactación con producto de material de excavación de banco en capas de 20 cm, donde la altura es determinada por el diámetro de la tubería.

Siempre que sea posible, se deberá utilizar el mismo material excavado para el relleno de la zanja. En caso de que el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por "Material de Préstamo", previamente aprobado, con relación a características y procedencia.

00000033

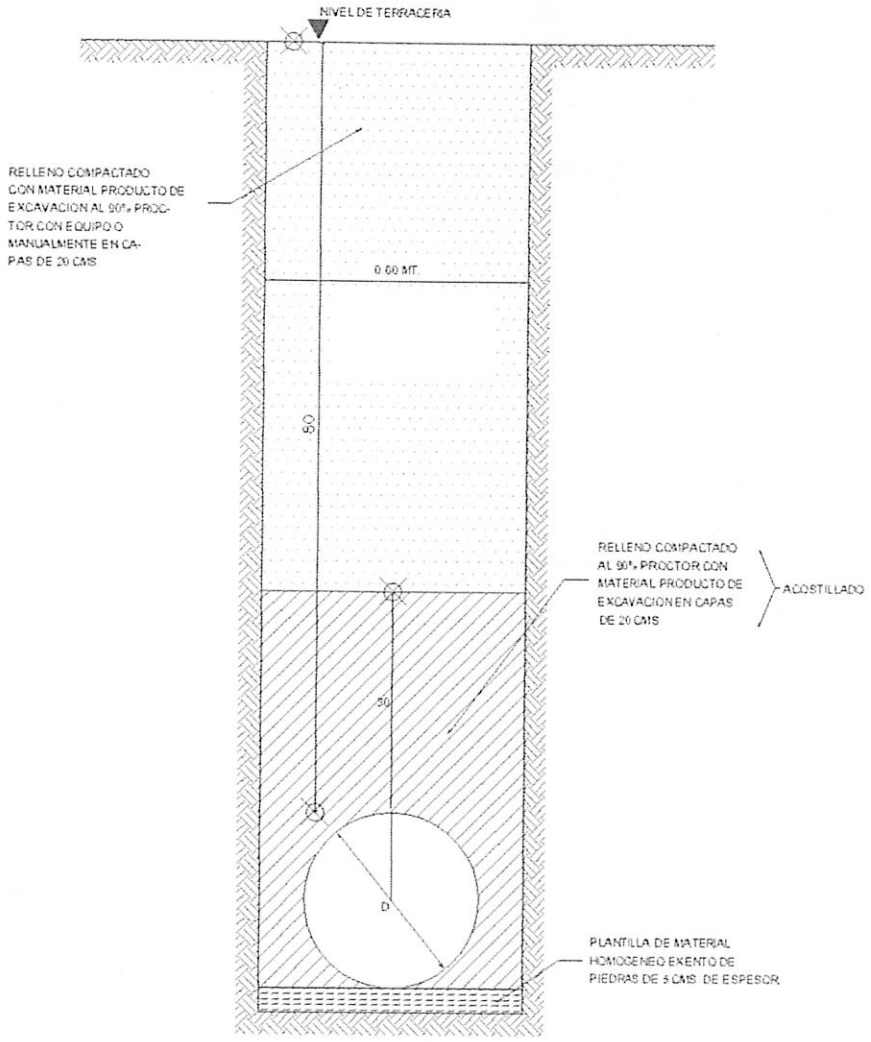

Imagen 3.- Detalle de zanja. Visualización de cama de apoyo, acostillado y relleno

5. Pozos de visita

Los pozos de visita deberán de establecerse en los puntos de cruces con líneas principales de servicio existente o a una distancia no mayor de 50mts. El colector de alcantarillado deberá de desplantarse por debajo de la tubería.

No se instalará ninguna línea de alcantarillado, que pase a través o entre en contacto con algún pozo destinado para luz, teléfono, etc., ni con canales para agua de regadío y potable.

00000034

El pozo de visita cuenta con una plantilla hecha de concreto y piedra bola con una base de 30 cm de altura y un diámetro de 1.70 mts. Esto se realiza con el fin de asentar un muro de block con una altura variable según lo especificado en los perfiles del proyecto y una terminación en el brocal de 60 cm

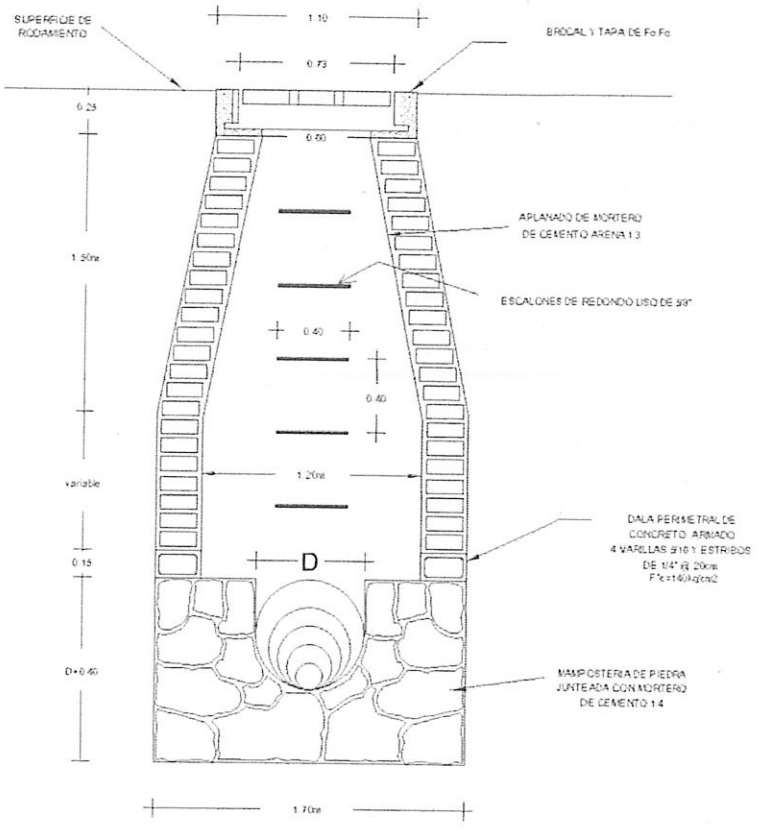

Imagen 4.- Pozo de visita

6. Limpieza de terreno

Al momento de terminar la compactación de la línea principal y los ramales de la tubería de drenaje se realizara la limpieza de todo aquel material deshecho, basura, material de construcciones temporales de la obra. Así mismo el material de los pozos de visita. De esta manera se restaurara algún daño realizado que haya sido alterada durante la ejecución de la obra dando el área totalmente limpia y aceptable por la dependencia encargada.

00000035

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RED DE AGUA POTABLE

1. *Generalidades*

La ejecución de las obras de agua potable para las calles de las localidades deberá realizarse de acuerdo con los planos aprobados del proyecto por parte del departamento de obras públicas del h. ayuntamiento de Sayula. En caso de existir modificaciones durante el proceso de la obra, deberán de establecerse en los planos del proyecto de construcción, indicando así la ubicación definitiva de las obras ejecutadas.

2. *Trabajos preliminares*

2.1 *Trazo y nivelación de redes de alcantarillado*

Para realizar la ejecución de la obra se necesitaran datos sobre la topografía de la zona para establecer el área de trabajo del proyecto y así realizar el trazado de la red de agua potable previamente para proyectar la excavación de las zanjas y en el asentamiento de las tuberías.

Se realizaran los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de la obra que se llevarán a cabo con la ubicación y fijación de ejes, líneas de referencia por medio de puntos ubicados con elementos inamovibles. Estos serán de acuerdo con la referencia indicada en los planos. El trazo, alineamiento, gradiente, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión de la nivelación de las calles y verificación de los cálculos correspondientes.

3. *Excavación*

3.1. Generalidades

Los trabajos de excavación deberán estar precedidos del conocimiento de las características físicas locales, tales como: naturaleza del suelo, topografía y existencia de redes de servicios públicos. De acuerdo con las condiciones del suelo es recomendable hacer sondeos en sitio para verificar, y conocer con anticipación las necesidades de algún cimbrado de zanjas.

00000036

La excavación será hecha a mano o con equipo mecánico de acuerdo al tipo de suelo, a trazos, anchos y profundidades necesarias para la construcción, esto según lo especificado en los planos replanteados en obra y/o presentes especificaciones.

3.2. Clasificación del terreno

Para los efectos de la ejecución de obras de agua potable en el medio rural-urbano y en específico para este proyecto se considera el siguiente tipo de terreno:

a) Terreno tipo II: Las excavaciones se pueden realizar sin dificultad a pulso y/o con equipo mecánico, y pueden ser: terreno consolidado o compacto. Conformado por terrenos consolidados tales como: hormigón compacto, afirmado o mezcla de ellos, etc., los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o equipo mecánico.

3.3. Excavación de zanjas

a) Se deberán eliminar las obstrucciones existentes que dificulten las excavaciones y el tendido de tubería.

b) Las zanjas que van a recibir los colectores se deberán excavar de acuerdo a una línea de eje principal (coincidente con el eje de los colectores), respetándose el alineamiento y las cotas indicadas en el proyecto.

c) El ancho de las zanjas dependerá del tamaño de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno. En el cuadro 2, se presenta valores de ancho recomendables en función a la profundidad y diámetro de la tubería (véase a continuación).

d) El ancho de la zanja deberá ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general debe obedecer a las recomendaciones del proyecto.

e) Para este caso se emplea equipo mecánico para la excavación, esta deberá estar próxima a la pendiente de la base de la tubería, dejando el aplanamiento de los desniveles del terreno y la nivelación del fondo de la zanja por cuenta de la excavación manual.

f) El material excavado deberá ser colocado a una distancia tal que no comprometa la estabilidad de la zanja y que no propicie su regreso a la misma, sugiriéndose una distancia del borde de la zanja equivalente a la profundidad del tramo, no menor de 30 cm del nivel de piso natural.

DIAMETRO	NOMINAL	ANCHO
milimetros	pulgdas	en cms.
25.4	1	50
50.8	2	55
63.5	25	60
76.2	3	60
101.6	4	60
152.4	6	70
203.2	8	75
254.0	10	80
304.8	12	85
355.6	14	90
406.4	16	100
457.2	18	115
508.0	20	120
609.6	24	130

Cuadro 2. Ancho de la zanja según la profundidad del fondo y el diámetro de la tubería

g) En este punto es necesario especificar las excavaciones para los pozos de visita deben tener las dimensiones de diseño aumentadas del espacio debido al entibado y a las formas, en caso sean necesarias.

k) En caso de reposiciones o reparación de redes y cuando el terreno se encuentre en buenas condiciones, se excavará hasta una profundidad mínima de 0.15 mts. por debajo del cuerpo de la tubería extraída.

l) Las excavaciones no deberán efectuarse con demasiada anticipación a la instalación de las tuberías, para evitar derrumbes y accidentes.

4. Suministro e instalación de tubería para línea de red de agua potable y tomas domiciliarias

4.1. Generalidades

El tipo y clase de material de la línea de la línea de agua potable será determinado por el proyecto ejecutivo de acuerdo a las características de la misma; topografía del terreno, recubrimiento y mantenimiento de la línea a instalar, tipo y calidad de suelo. Toda tubería de agua potable deberá contar con su diseño específico de cruce, que contemple cajas de válvulas en los cruces de líneas.

00000038

4.2. Refine y nivelación

Para proceder a instalar las líneas de agua potable previamente las zanjas excavadas deberán estar refinadas y niveladas.

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo.

La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobada de acuerdo a lo especificado en el siguiente punto.

- La nivelación del terreno a lo largo del recorrido de los colectores se realizará en intervalos de 6 mts.

4.3. Cama de apoyo

El tipo y la calidad del apoyo que tenga una tubería que ha sido tendida en una zanja, es otro factor que influye notablemente en la capacidad de soporte de los conductos enterrados. El fondo de la zanja debe conformarse para proveer un apoyo firme, estable y uniforme a lo largo de toda la longitud de la tubería.

Las características dentro del proyecto para la cama de apoyo se indican dentro de las especificaciones técnicas del proyecto dónde se realiza una cama de 10 cm con material de arena.

Los materiales más económicos son: arena, fina o triturado pequeño, ya que su compactación se obtiene con un mínimo de apisonamiento.

00000039

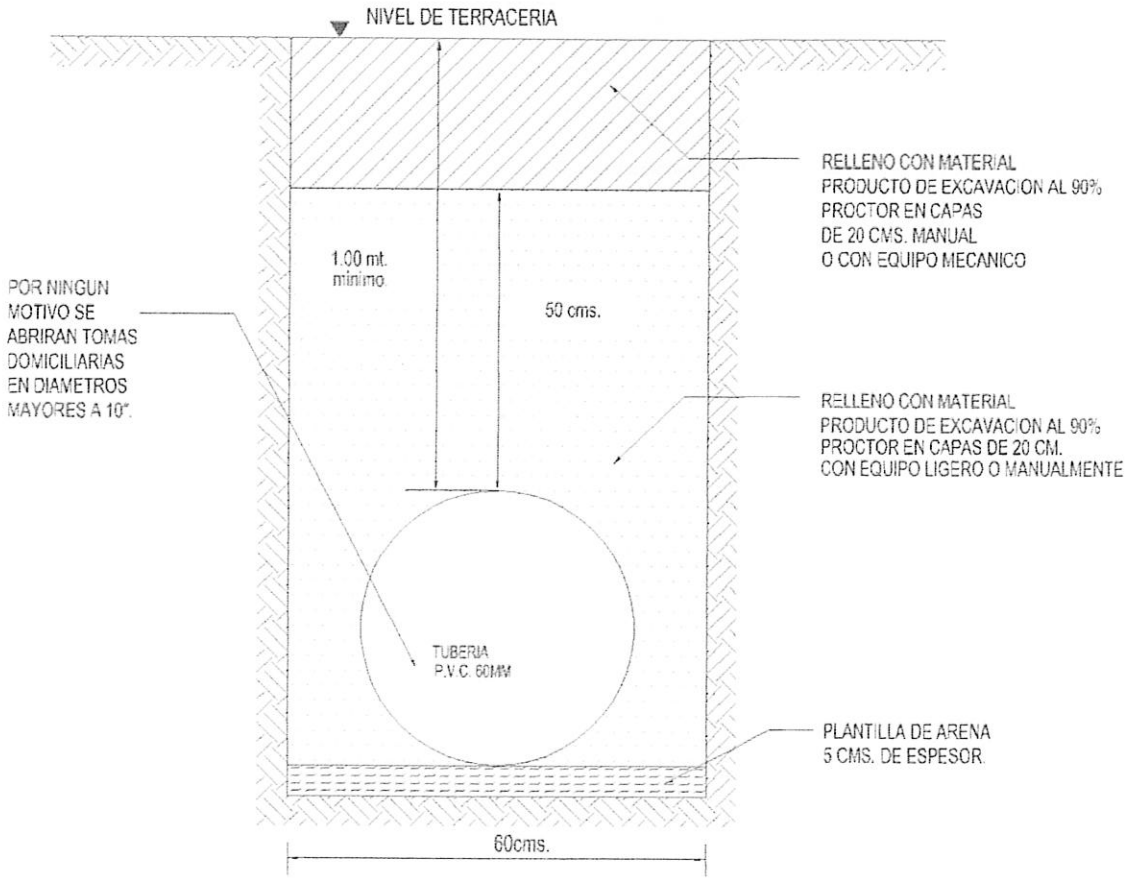

Imagen 5.- Detalle de zanja de red de agua potable

4.4. Instalación de tubería de red de agua potable

Se describe a continuación el procedimiento de colocación de las líneas de drenaje.

a) Nivelación y alineamiento. Las tuberías deberán quedar alineadas según el eje de la excavación, sin que exista ninguna deformación a lo largo de la línea de caída. La instalación de un tramo se empezará por su parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana de la tubería, quede con dirección aguas arriba.

Los ramales serán conectados con abrazaderas de 3" con salidas de ½", la tubería para las tomas domiciliarias serán las que se requiera según el proyecto. Se iniciará la colocación de los tubos de aguas abajo para aguas arriba.

b) Uniones o juntas. Las uniones que juntarán las conexiones entre los tubos y su hermeticidad, se utiliza elásticas: anillos de jebe. Estas uniones deben tener las características de impermeabilidad, facilidad de operación, flexibilidad, disponibilidad, costo reducido. Estas uniones tendrán un aplicado de manteca

vegetal dando como función lubricar la tubería y así realizar su conexión como se muestra en las siguientes imágenes.

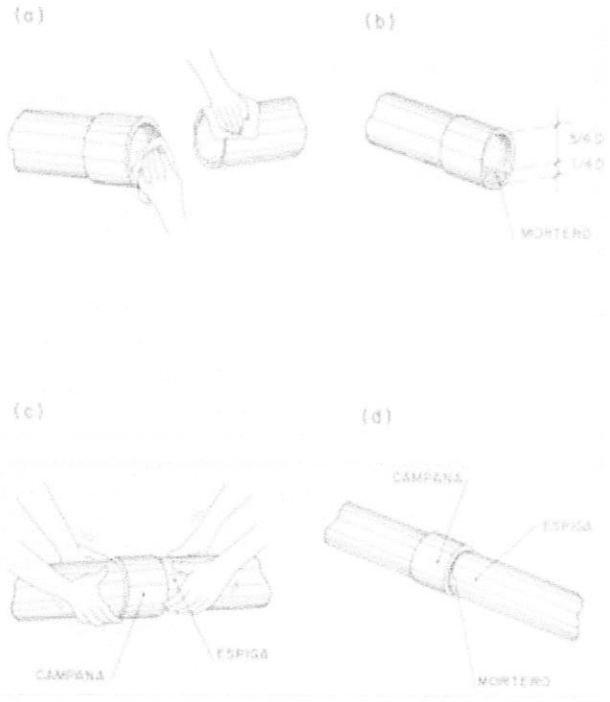

Imagen 6.- Detalle de intalación de tubería para la línea de red de agua potable

e) Relleno y compactación de la tubería, se realiza con producto de material de excavación en capas de 20 cm, donde la altura es determinada por el diámetro de la tubería.

Dentro de este proyecto se utiliza como relleno el mismo material excavado producto de la zanja. En caso de que el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por material de banco, previamente aprobado, con relación a características y procedencia.

5. Tomas domiciliarias

Las tomas domiciliarias se realizan de acuerdo a la ubicación de las salidas de cada vivienda. Estas se encuentran ubicadas en el área pública, las aceras.

Este elemento se realiza con la colocación de la línea principal donde se conecta una abrazadera de ½", para la unión de una llave de inserción de ½" con un tubo hidráulico para suministrar el agua potable hasta llegar a una llave en banqueta de ½" ubicada dentro de un registro domiciliario a base de block con una dimensión aproximada de 20 x 40 cm y con una tapa metálica para su protección.

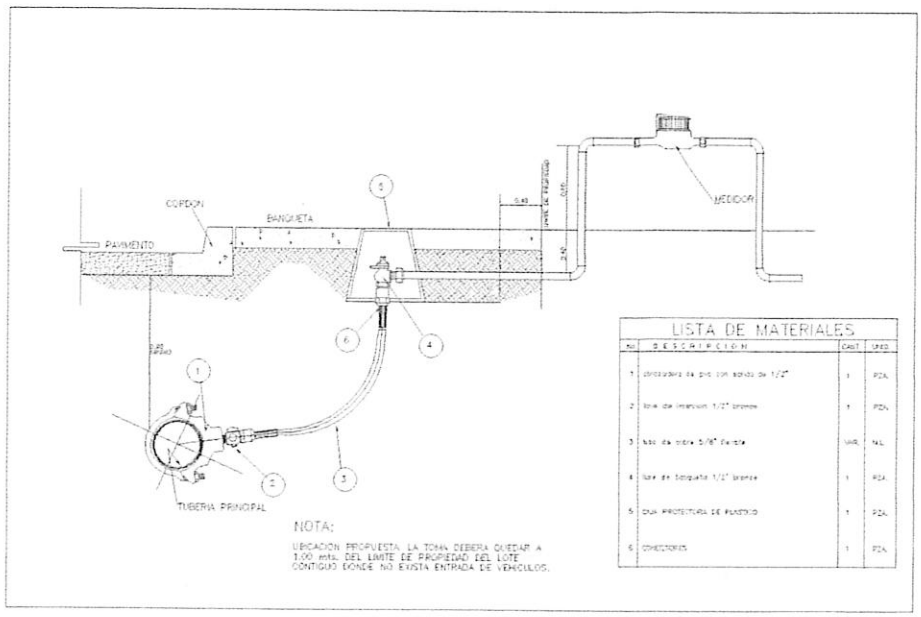

Imagen 6.- Toma domiciliaria en red de agua potable

6. Caja de válvulas

El objetivo de las cajas de válvulas es tener un sistema en red de agua potable debidamente para el caso de reparación o suspensión de agua de alguna línea en específica se pueda suministrar agua a la demás población sin que esta sea afectada.

La caja de válvulas se coloca de acuerdo con el diseño del proyecto y el cruce de las tuberías por las calles. El ancho aproximado de una caja de válvulas es de 1.5 mts, este varía según las válvulas instaladas en el cruce, su altura es determinada según la colocación y pendiente de la tubería hasta la rasante de la calle.

La hechura de este elemento se realiza con una plantilla de concreto pobre en el suelo para desplantar el muro. Después de realizar la plantilla se coloca una dala de desplante en el muro hecho a base de block y se colocan los castillos en cada una de las esquinas de la excavación de la caja. Para cubrir la caja se realiza un colado de losa de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 según las especificaciones técnicas del proyecto.

00000042

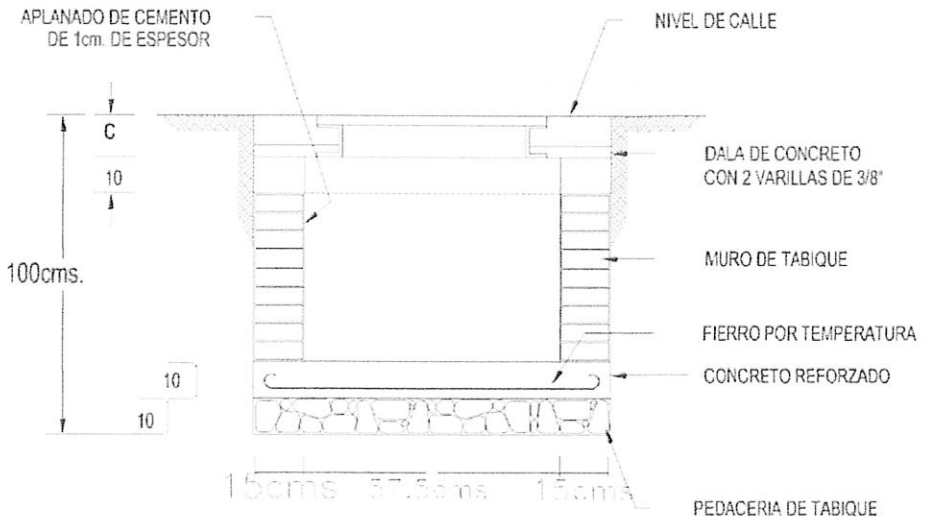

Imagen 7.- Elevación de toma domiciliaria en red de agua potable

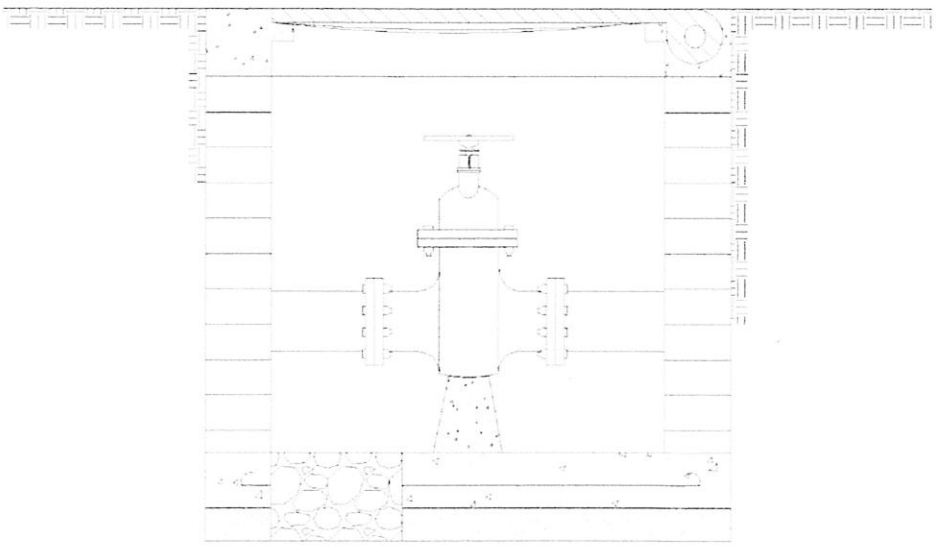

Imagen 8.- Elevación de toma domiciliaria en red de agua potable

7. Limpieza de terreno

Al momento de terminar la compactación de la línea principal y los ramales de la tubería de drenaje se realizara la limpieza de todo aquel material deshecho, basura, material de construcciones temporales de la obra. Así mismo el material de los pozos de visita. De esta manera se restaurara algún daño realizado que

haya sido alterada durante la ejecución de la obra dando el área totalmente limpia y aceptable por la dependencia encargada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.

1.- Trabajos preliminares

Consiste en retirar y limpiar totalmente de vegetación viva o muerta, las áreas que serán ocupadas por toda la construcción superficial de la obra. El trabajo incluye la remoción y eliminación de empedrado y todos los obstáculos existentes que intervengan en dicho proyecto.

1.1 Topografía

La topografía será utilizada para la delimitación de las áreas a trabajar, la conformación de las plataformas y para todos aquellos trazos necesarios en la construcción del proyecto.

1.2 Demolición de pavimento ecológico existente

Solo se contempla la demolición del empedrado, y otros designados en los planos. El material resultante de la democión será reutilizado y mejorado para la construcción de la nueva una nueva base.

2.- Corte de cajón

2.1 Definiciones

2.1.1 Corte y carga

El corte es la operación de cortar y remover cualquier clase de material independiente de su naturaleza o de sus características, dentro o fuera de los límites de construcción, para luego incorporarlo a un medio de transporte y depositarlo en los lugares previamente establecidos.

2.1.2 Acarreo libre

Es el transporte de materiales no clasificados, provenientes del corte, así como el transporte del material de desperdicio, a una distancia menor o igual a 1,000metros.

2.1.3 Acarreo

Es el transporte de materiales no clasificados, provenientes del corte, así como el transporte del material de desperdicio, a cualquier distancia que exceda de 1,000metros.

2.2 Medida.

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos, con aproximación de dos decimales, de corte, carga y acarreo, debidamente ejecutada y aceptada de acuerdo a estas Especificaciones Generales, Disposiciones Especiales y los planos correspondientes.

3. Capa de base

3.1 Descripción.

Este trabajo consiste en la obtención, explotación, acarreo, tendido, humedecimiento, mezcla, conformación y compactación del material de base; el control de laboratorio y operaciones necesarias para construir en una o varias capas, una base del espesor compactado requerido, sobre la sub-rasante previamente aceptada de acuerdo a estas Especificaciones; todo de acuerdo con lo indicado en los planos u ordenado por el Supervisor, ajustándose a los alineamientos horizontal, vertical y secciones típicas de pavimentación, dentro de las tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones Técnicas.

3.2 Espesor de la base.

La base debe tener un espesor compactado a un 95% o según lo que se indique en los planos del proyecto.

3.3 Materiales

4.3.1 Requisitos para el material de base

La capa de base común, debe estar constituida por materiales de tipo selecto en su estado natural o mezclados, que formen y produzcan un material que llene los requisitos necesarios para su compactación.

3.3.2 Requisitos de construcción

00000045

Se debe usar el material que tenga un mayor valor soporte, menor porcentaje que pase el Tamiz 0.075 mm, menor índice de plasticidad y mayor equivalente de arena.

3.3.3 Colocación y tendido

(a) Colocación. Se debe colocar el volumen de material correspondiente al espesor de base requerido por el diseño, sobre la sub-rasante recibida, previamente preparada y reacondicionada. El material puede ser colocado en pilas por medio de camiones de volteo, formando camellones o con máquina especial esparcidora.
(b) Tendido. El material de base, debe ser tendido en capas no mayores de 300milímetros ni menores de 100milímetros.

3.3.4 Mezcla

Después de haberse colocado y tendido el material, cuando no se use máquina especial esparcidora y conformadora, debe procederse a su homogeneización, mezclando el material en todo su espesor mediante la utilización de equipo apropiado, pudiéndose efectuar con motoniveladora o por otro método que produzca una mezcla homogénea.

Cuando se use equipo especial que permita tender el material sin segregación, no se debe requerir esta mezcla.

3.3.5 Riego de agua

El material de base debe esparcirse, homogeneizarse y conformarse, agregándole la cantidad de agua necesaria para lograr su compactación, cuya operación puede efectuarse simultáneamente con la mezcla indicada en 4.3.4. Cuando se use máquina especial esparcidora y conformadora, el material puede ser humedecido previamente en la planta de producción del mismo, pudiéndose en este caso, proceder a su compactación inmediata.

3.3.6 Conformación y compactación

La capa de base debe conformarse, ajustándose a los alineamientos y secciones típicas de pavimentación y compactarse en su totalidad, hasta lograr el 95% de la densidad máxima determinada por la prueba de compactación.

00000046

4. Pavimentos de concreto hidráulico

4.1 Definición.

Pavimento de Concreto. Es un pavimento rígido, de concreto de cemento hidráulico, con o sin refuerzo, que se diseña y construye para resistir las cargas o como indiquen los planos.

4.2 Descripción.

Este trabajo consiste en la construcción sobre subrasante, y base preparada y aceptada previamente, de la losa de pavimento de concreto, de acuerdo con los planos, incluyendo la fabricación y suministro del concreto estructural, y el manejo, colocación, compactación, acabado, curado y protección del concreto de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones típicas de pavimentación, dentro de las medidas y tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones, Disposiciones Especiales y/o planos de este proyecto.

4.3 Materiales

4.3.1 Requisitos para los materiales

Los materiales para pavimentos de concreto de cemento hidráulico, deben llenar los requisitos siguientes:

(a) Cementos Hidráulicos. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 28MPa (4,000 psi, 250kg/cm²) o mayor.

(b) Agregado Fino. Debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de partículas duras y durables, que llene los requisitos sobre cantidad de finos allí estipuladas, para concreto de pavimentos y para concreto sujeto a desgaste superficial.

El agregado fino debe ser almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

(c) Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra trituradas, trituradas parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado

clasificado, que llene los requisitos de desgaste o abrasión y la limitación de partículas planas y alargadas.

(d) Agua. El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales como cloruros o sulfatos, material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero.

(e) Aditivos. Los aditivos para concreto se deben emplear con la aprobación previa del Supervisor y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Debe demostrarse que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del concreto de la mezcla básica. No se permitirá el uso de aditivos que contengan iones de cloruro, en ningún tipo de concreto reforzado o preesforzado o concretos que contenga elementos galvanizados o de aluminio. Previa a la autorización del uso de aditivos, el contratista deberá realizar mezclas de pruebas de campo, utilizando los materiales y equipo a emplear en el proyecto u obra. Si se emplea más de un aditivo, debe cuidarse de que los efectos deseables de cada uno se realicen y no interfieran entre si. Cuando se empleen aditivos acelerantes en tiempo caluroso, deben tomarse las precauciones necesarias para evitar un fraguado del concreto.

(f)Requisitos para la Clase y Resistencia del Concreto.

El concreto de cemento hidráulico para pavimentos, debe ser como mínimo clase 28 (4,000psi o 250kg/cm²) con una resistencia a compresión AASHTO T 22 (ASTM C 39), promedio mínima de 28 MPa (4,000psi o 25kg/cm²) y una resistencia a la flexión AASHTO T 97 (ASTM C 78), promedio mínima de 4.2 MPa (600psi o 42.2kg/cm²), determinadas sobre especimenes preparados según AASHTO T 126 (ASTM C 192) y T 23 (ASTM C 31), ensayados a los 28 días.

4.4 Requisitos de construcción

4.4.1 Equipo para pavimentación

Se debe suministrar el equipo adecuado al procedimiento de construcción previsto. El equipo propuesto debe ser inspeccionado y/o ensayado y aprobado previamente por el supervisor.

4.5 Colocación del concreto hidráulico

(a) Acondicionamiento de la Superficie. Las losas de concreto deben ser construidas sobre la superficie de la subrasante, sub-base o base, previamente preparadas.

(b) Colocación del Concreto utilizando Formaleta Fija. Debe usarse para áreas irregulares o en áreas inaccesibles al equipo de pavimentación de formaleta deslizante o en casos de tramos cortos donde no sea práctico el empleo de este último. Las formaletas deben colocarse en cantidad suficiente y por lo menos 100 metros adelante de las operaciones de colocación del concreto, debiendo ser asentadas sobre la superficie, sin dejar espacios vacíos y de acuerdo con los alineamientos y secciones típicas mostradas en los planos, fijándolas a la base o sub-base con pernos de acero, de modo que soporten sin deformación o movimiento, las operaciones de colocación y vibrado del concreto. El espaciamiento de los pernos, no debe ser mayor de 1 metro, debiendo colocarse en el extremo de cada pieza, un perno a cada lado de la junta. Las formaletas no deben desviarse respecto al eje de colocación, en cualquier punto y dirección más de 3 mm por cada 3 metros, y deben limpiarse y engrasarse previamente a la colocación del concreto.

4.7 Alisado

Después del enrasado y nivelado indicados, la superficie debe ser uniformizada, alisándola transversal o longitudinalmente, o en ambos sentidos, por medio de una llana o flotador de tipo adecuado. De preferencia, el alisado se debe ejecutar en el sentido longitudinal, excepto en los lugares en los que esta forma no sea factible. El alisado puede ser efectuado manualmente o por máquinas alisadoras que produzcan resultados equivalentes.

a) Alisado longitudinal: La llana o flotador de tipo longitudinal, operado desde un andamio, debe ser aplicado con un movimiento de aserrado, conservándolo en posición paralela al eje de la vía y desplazándolo gradualmente de un lado al otro del pavimento. La llana o flotador debe moverse hacia adelante, la mitad de su longitud y la operación se repite hacia atrás.

b) alisado transversal: La llana o flotador transversal debe ser operado a lo ancho del pavimento, principiando en uno de sus bordes, moviéndolo gradualmente hasta el centro y regresándolo de nuevo al borde. El flotador se debe mover luego hacia adelante y a la mitad de su longitud y la operación se debe repetir. Se debe poner cuidado especial en no modificar la sección transversal del pavimento.

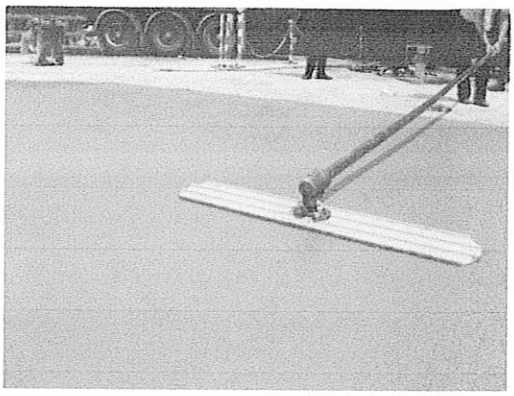

Foto 1 Alisado de concreto hidráulico.

4.6 Acabado, texturizado y ranurado del concreto.

(a) Acabado Final. El acabado final se debe efectuar siguiendo el procedimiento estipulado en la sección 553.17 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, Noviembre 2002 utilizando el equipo indicado en 501.04 de las mismas especificaciones, (a) y (b), según corresponda.

(b) Texturizado y Ranurado utilizando Pavimentadora de Formaleta Deslizante. Inmediatamente detrás de la alisadora o llana mecánica de la pavimentadora, y una vez el concreto está próximo a perder el brillo se procede al texturizado y ranurado.

(c) Texturizado y Ranurado utilizando Formaletas Fijas. Debe hacerse preferentemente con un carro o marco texturizado o ranurador como los indicados para la pavimentadora deslizante. En zonas pequeñas e irregulares donde esto no sea factible tanto el texturizado fino longitudinal como el texturizado grueso o ranurado transversal pueden hacerse manualmente con ayuda de rastrillos o escobas adecuados.

Foto 2 Txturizado del concreto hidráulico.

00000050

4.7 Corte de concreto

El corte debe iniciarse tan pronto como sea posible, con el fin de evitar que las grietas de contracción aparezcan en las losas antes de cortar las juntas en las cuales se las desea canalizar.

A su vez el corte de juntas debe realizarse tan pronto el concreto este duro, entre 4 y 8 horas. la profundidad del corte debe ser entre 1/2 y 1/4 del espesor de la losa. es necesario verificar que las medidas del corte sean las indicadas por cuestiones de seguridad.

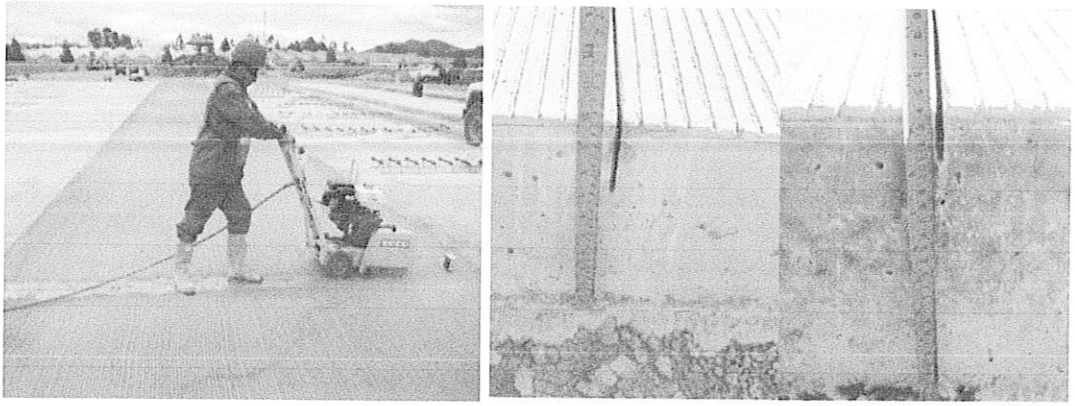

Foto 3 Corte de l concreto con equipo especializado.

4.7.1 Tiempo de corte en juntas.

Corte convencional: se debe comenzar con la ventana de corte inicia de 8 a 12 horas después del colado del concreto hidráulico, dependiendo del clima y características de la mezcla. La profundidad del corte va de 1/3 a 1/4 del espesor. (Cortadora autopropulsada).

4.8 Relleno y sellado de juntas.

Se debe hacer conforme a lo indicado en los planos del proyecto y estas especificaciones mencionadas:

a) Limpieza de juntas: es necesario limpiar las zanjas producto del corte del concreto para un buen una buena adherencia de la mezcla para calafateo.

b) Se coloca el cordón de respaldo o cintilla de poliuretano, en las juntas transversales y longitudinales en las secciones donde se realizo el corte del pavimento.

c) Calafetear los cortes: después de haber colocado la cintilla de poliuretano es necesario rellenar, sellar e impermeabilizar con una mezcla (materiales asfalticos

con polímeros) en los cortes para evitar la introducción de materias extrañas o de agua.

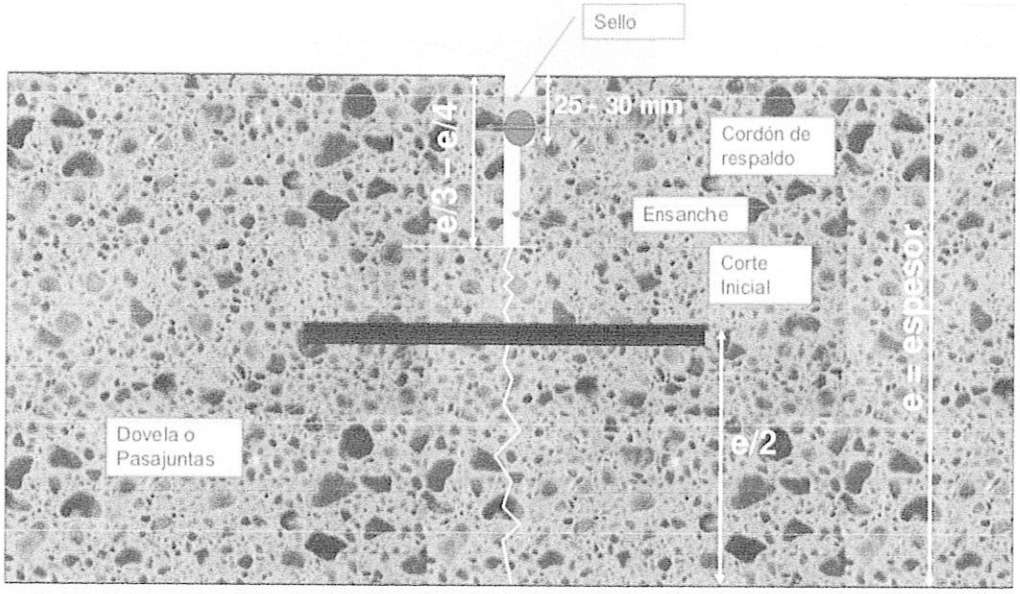

Foto 4 Corte, colocacion de cordon de respaldo y sello.

5. LIMPIEZA FINAL

Al terminar la obra y antes de la aceptación final del trabajo, se debe quitar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, deshechos, basura y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable toda la propiedad, tanto pública como privada que pudiera haber sido dañada o alterada durante la ejecución de este trabajo, dejando el área totalmente limpia.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

00000052

GRECO SUMINISTROS SA DE CV

R.F.C. : GSU160425JK8

CD. GUZMAN JALISCO A 9 DE FEBRERO DEL 2018

MPO. SAYULA JALISCO

AT`N: *ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO*
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Por este medio enviamos a ustedes el estudio de mecánica de suelos en el cual se determinó la capacidad de carga para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle ***"PORFIRIO DIAZ"*** *en el municipio de Sayula Jalisco.*

No habiendo otro particular, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario con respecto a la presente.

A T E N T A M E N T E

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

Ing. José Guadalupe López Rufino.
Cef. Prof. 9561584

00000053

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 124 45 54
RFC. LORM640415UB2 email: ilr_060292@hotmail.com

GRECO SUMINISTROS SA DE CV

R.F.C. : GSU160425JK8

INFORME

*ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE **"PORFIRIO DIAZ"** EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO.*

ELABORADO PARA:

OBRAS PÚBLICAS

POR:

PAG LABORATORIO

GRECO SUMINISTROS S. A. DE C. V. R.F.C. GSU 160425 JK8

00000054

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 124 45 54
RFC. LORM640415UB2 email: jlr_060292@hotmail.com

CONTENIDO

I.	ANTECEDENTES.
II.	ESTRUCTURAS ADYACENTES.
III.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE EXPLORACION Y OBSERVACIONES.
1V.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE LABORATORIO.
V.	CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL SUB-SUELO.
VI.	RESULTADOS DE LOS ENSAYES DE LABORATORIO (EN FORMA GRAFICA O TABULAR).
VII.	ANALISIS Y ALTERNATIVAS DE CIMENTACION.
VIII.	ANALISIS DE ASENTAMIENTOS.
IX.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

GRECO SUMINISTROS R.F.C. GSU 160425 JK8

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL
RFC. LORM640415UB2 email: jlr_060292@hotmail.com

I. ANTECEDENTES.

EL MPO. DE SAYULA JALISCO, *tiene en proyecto la pavimentación con concreto hidráulico de la calle* ***"PORFIRIO DIAZ"*** *en el municipio de Sayula Jalisco, con el fin de obtener la información del subsuelo necesaria, para poder determinar la capacidad de carga y proponer el tipo de cimentación adecuada, se encomendó a PAG, determinar la naturaleza y estratigrafía del subsuelo, y realizar los ensayes de laboratorio necesarios para establecer los valores de las propiedades del subsuelo que intervienen en el cálculo, e influyen en la construcción de la cimentación. En el presente informe se describen los trabajos y estudios llevados al cabo para satisfacer las necesidades planteadas.*

En la zona de estudio, por efecto de los movimientos tectónicos se acentuó la diferencia de los niveles de los bloques hundidos y semihundidos de la fosa de Colima, que combinados con el acarreo de particulas a la depresión, se terminó por formar dentro del Graben (hundimiento) de sayula una cuenca cerrada, observandose las formaciones características de esta zona, consistentes en cordones montañosos, volcanes y una depresión en la parte central.

Los tipos de roca existentes en el área, corresponden a rocas ígneas extrusivas de tipo básico y naturaleza piroclástica; además, de rocas sedimentarias representadas por las rocas calcáreas del Cretácico inferior, las areniscas y conglomerados del Terciario, y por los sedimentos Cuaternarios de tipo aluvial y lacustre.

La estratigrafía regional para la laguna de sayula, se encuentra constituida por rocas ígneas extrusivas rocas sedimentarias marinas y continentales. El basamento que sostiene a toda la secuencia volcánica, está integrado por rocas volcánicas, volcano sedimentarias y sedimentarias marinas relacionadas con procesos de arco magmático insular (Pantoja-Ajor y Estrada-Barraza, 1986), el cual se encuentra aflorando al oriente y suroriente del volcán de Colima, correspondiendo con brechas volcánicas bien consolidadas y andesitas masivas zeolitizadas; las rocas carbonatadas, que afloran en Tenaxcamilpa, pertenecientes al basamento, se encuentran bastante metamorfizadas, como producto de la intrusión de diques andesíticos.

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

Las unidades del Terciario, se encuentran constituidas por derrames de basalto y andesitas, y por derrames piroclásticos de composición riodacitica, representados por un paquete de ignimbritas de textura eutaxitica.

El Terciario superior-Pleistocenotardío, esta representado por el grupo Nevado, el cual se encuentra constituido principalmentepor un conjunto de unidades litoestratigráficas de composición dominantemente andesítica, formadas por derrames de lava y material piroclástico, originadas por diversas emisiones del volcán del Nevado de Colima. Las unidades litoestratigráficas que integran este grupo son: andesita la calle, formación atenquique, toba los mazos y dacita loma alta.

Finalmente, el reciente se encuentra representado por la andesita la membrillera, la avalancha los lobos y la avalancha san Antonio. Del último periodo de actividad del volcán de Colima, se tienen los derrames andesíticos denominados: andesita la lumbre, el lahar Cofradía, andesita

II. ESTRUCTURAS ADYACENTES EXISTENTES.

La zona en estudio se encuentra delimitada por viviendas.

GRECO SUMINISTROS
S. [illegible]
R.F.C. [illegible]

III. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE EXPLORACION Y OBSERVACIONES

Para determinar la naturaleza y condiciones estratigráficas del subsuelo, así como su variación en el área en estudio, se determinó realizar la exploración de los materiales naturales de la parte superficial del subsuelo, donde se alojará y apoyará la cimentación, mediante la excavación de dos pozos a cielo abierto a una profundidad de 1.00 m.

Se clasificaron en campo los materiales hallados y se obtuvo una muestra cúbica inalterada.

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE LABORATORIO.

Con la muestra obtenida durante la exploración, se efectuaron los ensayes de laboratorio requeridos, tanto para precisar la clasificación de los distintos materiales, como para determinar las propiedades mecánicas que interesa conocer. Para el análisis de la cimentación, se efectuaron los ensayes que se enuncian a continuación:

A) ENSAYES EFECTUADOS.

1. *- Pruebas índice y clasificación.*

   - Clasificación visual y al tacto, en húmedo.

   - Contenido natural de agua.

   - Reclasificación visual y al tacto en seco.

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

00000058

Estas pruebas índice se efectuaron para poder encasillar a los suelos encontrados de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), y obtener información para correlacionar los distintos estratos encontrados en el sondeo y justificar la aplicación de los parámetros de resistencia de deformación, determinados de las muestras colectadas.

2. *- Pruebas para determinar las propiedades mecánicas.*

   - *Resistencia a la compresión simple.*

   - *Resistencia al esfuerzo cortante determinado en pruebas de compresión triaxial rápidas, efectuadas en probetas sujetas a esfuerzos de confinamiento variables, en el rango que representa las condiciones naturales y aquellas que impondrán la cimentación.*

   - *Consolidación Unidimensional.*

V. CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL SUBSUELO.

Tomando en cuenta las características regionales y los tipos de materiales hallados en el sondeo de exploración, se puede establecer que la estratigrafía del lote en estudio es uniforme con la siguiente secuela de estratos:

De nivel de la superficie y hasta la profundidad de 0.20 mts., se encuentra un empedrado y de 0.70 mts a 0.90 mts UN MATERIAL DE CASCAJO Y DE 0.90 A 1.20 MTS que fue la máxima profundidad explorada un limo arcilloso color cafe.

El nivel freático no se detectó a la profundidad de 1.20 mts.

GRECO SUMINISTROS
S. A
R.F.C. GSU 160425 JK8
00000059

VI. RESULTADOS DE LOS ENSAYES DE LABORATORIO.

Las propiedades índice obtenidas en las pruebas correspondientes se consideran en el perfil estratigráfico del sondeo, Figura No. 2.

Los valores de resistencia a la compresión simple y al esfuerzo cortante en pruebas de compresión triaxial rápida obtenidos en las pruebas efectuadas, se muestran tabularmente en las Figuras No. 3.

VII. ANALISIS Y ALTERNATIVAS DE CIMENTACION.

a) Alternativas.

Los factores dependientes de la naturaleza y propiedades del subsuelo, que son decisivos en la selección del tipo de pavimentación y tienen influencia en el comportamiento de la estructura en el proceso de construcción general, se analizaron para establecer los límites entre los que deberán manejarse tanto en el diseño como en la construcción de la estructura en estudio.

Dichos factores corresponden a la definición de la presión de reacción admisible correspondientes a los tipos de pavimentación que se definan como convenientes tomando en cuenta la naturaleza del subsuelo. Para el análisis de las bases únicamente se considerará la zona superficial.

GRECO SUMINISTROS
R.F.C. GSU 160425 JK8

00000060

Donde:

Qa **=** *Capacidad de carga a la falla para la cimentación Analizada (Ton/m2).*

Además se empleó:

$$Qadm = \frac{Qult}{F.S.} \qquad F.S. = 3$$

Qadm **=** *Capacidad de carga admisible, (en ton/m2).*

C **=** *Cohesión media del suelo a lo largo de las superficies potenciales de falla (Ton/m2).*

Nc ,Nq y $N\gamma$ = *Factor de capacidad de carga (adimensional).*

Df **=** *Profundidad de desplante = 0.60 mts.*

.

Bajo estas condiciones ***LA CAPACIDAD DE CARGA ES DE 11 TON/M2.***

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8
0000061

VIII. ANALISIS DE ASENTAMIENTOS.

Para el análisis de asentamientos, se considero la forma general para su cálculo siendo esta la siguiente:

$$\Delta H = m_v \Delta P H$$

Dónde:

ΔH = *asentamiento en cm*

m_v = *coeficiente obtenido de la curva de consolidación.*

ΔP = *incremento de carga*

H = *espesor de estrato considerado en cm.*

Considerando que la descarga es igual al esfuerzo del suelo, se tiene que el asentamiento total será de ***5 cm****.*

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

00000062

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES.

De acuerdo con los ensayes de laboratorio efectuados y tomando en cuenta las condiciones estratigráficas determinadas, se concluye que para efectuar los análisis de los sistemas de pavimentación en estudio, deberán usarse los valores antes mencionados ya que dentro de la seguridad, son representativos del comportamiento esperado en el estrato del subsuelo.

La profundidad de desplante a la que se calculó la capacidad de carga fue a 1.00 mts.

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37. CEL. 045 341 [illegible]
RFC. LORM640415UB2 email: jlr_060292@hotmail.com

GRECO SUMINISTROS SA DE CV
R.F.C. : GSU160425JK8
FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 124 45 54
RFC. LORM640415UB2 em@il: jlr_060292@hotmail.com

POZO A CIELO ABIERTO

PROYECTO: pavimentacion con concreto hidraulico de la calle "PORFIRIO DIAZ"

LOCALIZACION: municipio de sayula jalisco

P C A - 1

DESCRIPCION GEOTECNICA DEL MATERIAL	SIMBOLOGIA	CLASIF. S.U.C.S.	PROF. m.	● CONTENIDO DE AGUA % ✚ LIMITE PLASTICO LP ▲ LIMITE LIQUIDO LL 0 20 40 60 80	OBSERVACIONES
EMPEDRADO					
CASCAJO					
ARCILLA LIMOSA		ML	1 2 3 4	✚ ▲	

SIMBOLOGIA

- EMPEDRADO
- TERRENO NATURAL ARCILLA LIMOSA
- CASCAJO
- ARENA

RESISTENCIA CON PENETROMETRO DE BOLSILLO, Kg/cm2
MC = MUESTRA CUBICA
NF = NIVEL FREATICO
VRS = VALOR RELATIVO DE SOPORTE
F = PORCENTAJE DE FINOS

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

90000000

GRECO SUMINISTROS SA DE CV

R.F.C. : GSU160425JK8

croquis de localizacion

*Localización: calle **"PORFIRIO DIAZ"** en el municipio de Sayula en el estado de Jalisco.*

ZONA DE ESTUDIO

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

00000065

FERNANDO CALDERON N°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 124 45 54
RFC. LORM640415UB2 email: jlr_060292@hotmail.com

GRECO SUMINISTROS SA DE CV
R.F.C. : GSU160425JK8

CD. GUZMAN JALISCO A 9 DE FEBRERO DEL 2018

MPO. SAYULA JALISCO

AT`N: *ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO*
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Por este medio enviamos a ustedes el diseño para la pavimentación que se pretende construir *para la pavimentación con concreto hidráulico de la calle* ***"PORFIRIO DIAZ"*** *en el municipio de Sayula Jalisco*.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

GRECO SUMINISTROS S. A. DE C. V. R.F.C. GSU160425 JK8

Ing. José Guadalupe López Rufino.
Cef. Prof. 9561584

00000066

INTRODUCCION

En relación a la necesidad de pavimentar la calle ***"PORFIRIO DIAZ*** y con el fin de obtener la información del subsuelo para diseñar la estructura de las terracerías, se le solicito al laboratorio de PAG que realizara un diseño de estructura para cubrir las necesidades y proponer que tipo de materiales son los más adecuados para su construcción.

Para la construcción de la estructura de la calle a mejorar con concreto hidráulico de la cual se encontraron con un VRS estándar de 8%, Y aquí le envió el diseño de la estructura que es el más conveniente para su proyecto.

Para las vialidades una base hidráulica de 20 cm de espesor respectivamente.

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8
00000067

CONTENIDO

I.- INTRODUCCION

II.- ANTECEDENTES

III.- CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LAS TERRACERIAS

IV.- ALTERNATIVAS DE SECCIONES ESTRUCTURALES

V.- BANCOS DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8
00000068

II.- ANTECEDENTES

2.1 Descripción del proyecto.

Como se menciono anteriormente en el municipio de Sayula Jalisco, se pretende construir y mejorar la calle ***"PORFIRIO DIAZ"***.

Desde el punto de vista geométrico el proyecto es que las vialidades sea de 1 o 2 carriles, con un ancho promedio de 8 y 10 metros.

Las condiciones antes descritas, han conducido a una serie de lineamientos y recomendaciones para la implantación de estructuras y vialidades con el objeto de que su financiamiento y operación no se vean afectadas por la respuesta y comportamiento de los materiales del subsuelo.

III.- CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS

Como quedo expresado en el inciso anterior el área en que se ubicaran los pavimentos esta caracterizada por condiciones particularmente poco adversas, aunado a su llana topografía, da lugar a un deficiente drenaje natural del agua pluvial. En tal virtud el proyecto estructural de las terracerías y pavimentos deberá establecerse en forma tal que se satisfagan adecuadamente los requisitos básicos de estabilidad y deformabilidad al actuar a la acción de las cargas producidas por el transito que para este caso en particular será de poca intensidad y muy esporádicamente transitaran vehículos de 2 ejes.

De acuerdo con todo lo anterior se considera importante que en el proyecto se tomen en cuenta los lineamientos que se presentan a continuación:

- La sección estructural de los pavimentos deberán construirse necesariamente en trinchera con el objeto fundamental de compensar su peso en el mayor grado posible con la descarga representada por la excavación del terreno.

- Paralelamente a la recomendación anterior atendida y con el mismo objetivo se deberá hacer uso extensivo por una parte de materiales ligeros para la construcción de la infraestructura del pavimento y por otra abatir el espesor de la rasante el cual resulta aconsejable que la elevación media no sea más de 60 cms.

En cuanto al drenaje este deberá ser de tal forma que el bombeo, sea hacia ambos lados de arroyo de acuerdo al proyecto.

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

FERNANDO CALDERON N°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 [illegible]
RFC. LORM640415UB2 correo il: jlr_060292@hotmail.com

IV.- ALTERNATIVAS DE SECCIONES ESTRUCTURALES

Tomando en cuenta lo planteado y con base a estudios geotécnicos de antemano se elaboraron dos propuestas de pavimento a manera de alternativas, una de tipo rígido y la otra flexible, considerando que ambas deben tener un comportamiento satisfactorio, presentándose en la Fig. No. 1 las secciones estructurales típicas, las que en forma sucinta se describen a continuación:

PAVIMENTO FLEXIBLE

Elemento	Espesor (cm)
a) Carpeta de concreto asfáltica	05
Base hidráulica	20
Sub-base hidráulica	15
	40

PAVIMENTO RIGIDO

Elemento	Espesor (cm)
Carpeta de concreto hidráulico f'c 250 kg/cm^2	20
Base hidráulica	20
	40

Debe tenerse presente que en las soluciones propuestas se tomo en cuenta además de las características del subsuelo comentadas el siguiente patrón de transito cuya configuración y volumen se ha estimado en base al propio criterio y la experiencia profesional a falta de información especifica disponible.

- Transito diario promedio anual TDPA = 800 vehículos en ambos sentidos
- Tasa de crecimiento anual = 2%
- Periodo de diseño = 15 años
- Numero de carriles = 2
- Por ciento de transito pesado = 30%
- Composición de transito:

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

A	560	70%
B	80	10%
C 2	160	20%
	800	100%

Aun cuando como quedo expresarlo de ambas alternativas debe esperarse un comportamiento satisfactorio existen en cada una de ellas, ciertas características que convendría ponderar el tratar de elegir la mas conveniente.

Al respecto se puede comentar que la principal ventaja que puede atribuirse a la sección de tipo rígido, radica en su mayor durabilidad y menor costo de conservación, la desventaja que podría ofrecerse como contrapartida a lo anterior se relaciona con su mayor costo inicial o de construcción.

Otra desventaja que podría adquirir cierta importancia seria el requerimiento de un mayor tiempo de ejecución.

Por lo que se refiere a la sección propuesta de pavimento flexible, se debe presentar a su favor la mayor experiencia que se dispone en cuanto a su construcción e incluso en cuanto a su comportamiento, otra ventaja de este pavimento y en contrapartida con los rígidos, seria como ya quedo expresado, su menor costo de construcción, si bien esta aparente ventaja no deja de ponerse en duda por el hecho de requerir mayores gastos de conservación. Al respecto conviene dar como comentario que una de las causas que se consideran como frecuentes de fallo en los pavimentos flexibles, en el área de vialidades, sometidos a transito intenso es debido al fenómeno de fatiga en la carpeta como consecuencia de la alta resilencia que experimenta el subsuelo, este tipo de falla puede ser contrarrestado mediante la rigidez que proporciona una losa como la propuesta en la sección de tipo rígido.

V.- BANCOS DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

En cuanto a las posibles fuentes de aprovisionamiento de los materiales para la construcción de la estructura del pavimento, se tendrá que utilizar las Bancos más cercanos a la zona y que de alguna forma cumplan con lo que especifica la S.C.T., para tal fin.

En lo que respecta a las especificaciones de calidad se deben satisfacer los materiales que habrán de utilizarse en las diferentes capas proyectadas para la construcción de la plataforma y del pavimento, esencialmente son las mismas que establece la propia Secretaria, siendo las siguientes:

GRECO SUMINISTROS
S.A. DE C.V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

FERNANDO CALDERON N°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 124 45
RFC. LORM640415UB2 email: jlr_060292@hotmail.com

1.- Material de sub-base hidráulica.

a) La curva granulométrica deberá quedar alojada ente el límite inferior de la zona 1 y el superior de la zona 3, sin presentar cambios bruscos de pendiente.

b) Además deberá satisfacer los valores siguientes:

Tamaño máximo de partículas	2 ½" máximo
Contracción lineal	4.5 máximo
Valor cementante	3 K/cm2 mínimo
Valor relativo de soporte	90 mínimo
Compactación	95%

2.- Material de base hidráulica.

a) La curva granulométrica deberá quedar alojada entre el límite inferior de la zona 1 y el superior de la zona 2 sin presentar cambios bruscos de pendiente.

b) Además, deberá cumplir con los valores siguientes:

Tamaño máximo de partículas	1 ½" máximo
Contracción lineal	3.5% máximo
Valor cementante	4.5 Kg/cm2 mínimo
Valor relativo de soporte	100% mínimo
Compactación	100%

3.- Material para carpeta asfáltica

Para la elaboración de la carpeta, deberá utilizarse concreto asfáltico, mezclado en caliente con las siguientes características en pruebas Marshall:

Relación de vacíos	3-5%
Estabilidad	700 Kg. Mínimo
Flujo	2-4 mm.

En agregado para carpeta deberá cumplir con los valores siguientes:

Tamaño máximo	¾"
Contracción lineal	2" máximo
Desgaste " Los Ángeles"	40% máximo
Equivalente de arena	55% mínimo

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 [illegible]
RFC. LORM640415UB2 email: jlr_060292@hotmail.com

El grado de compactación para las diferentes capas que constituirán el pavimento será la siguiente:

Terreno Natural	90%
Base hidráulica	100%
Carpeta Asfáltica	95%

El grado de compactación será con respecto a la prueba proctor en el caso de materiales finos y con respecto a la prueba porter en materiales granulares (sub-base y base)
Para el concreto asfáltico.

Se tomara el peso volumétrico máximo obtenido en pruebas Marshall, para el cálculo de grado de compactación

4.- Concreto hidráulico

a) El concreto que se empleara deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
   - Resistencia mínima a la compresión a 28 días de edad = 250 Kg/cm2
   - Módulo de ruptura mínima 28 días de edad = 30 Kg/cm2
   - Revenimiento = 8 a 10 cm.

b) Las juntas que requiere el pavimento rígido serán dimensionadas y espaciadas, tomando en consideración el proyecto que se tenga para ubicar las vialidades.

Los materiales pétreos (sello) deberán cumplir como sello 3A O 3E de acuerdo a las normas y especificaciones de la secretaría de comunicaciones y transportes y deberá ser verificada su calidad por el laboratorio de la dependencia contratante.

RIEGOS DE IMPREGNACION

Sobre la base hidráulica terminada superficialmente seca y barrida se aplicara en todo lo ancho de la corona y en los taludes del material que forme el pavimento un riego de impregnación asfáltica cationica de rompimiento medio a razón de 1.3 a 1.6 L/m2 aproximadamente que garantice la compactación de la base.

Y deberá cumplir con los análisis físicos y químicos q marca la secretaría de comunicaciones y transportes.

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

RIEGO DE LIGA

Sobre la base impregnada y debidamente barrida se aplicara un riego de impregnación RR2K a razón de 1.5 a 1.7 L/M2 para recibir el sello debidamente lavado y libre polvos y arcillas será debidamente supervisado su colocación por la dependencia contratante y deberá cumplir con todas las normas y especificaciones q marca la sct.

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- La excavación de la trinchera para alojar el cuerpo del pavimento, deberán efectuarse mecánicamente.

2.- Una vez llegado al nivel de desplante del terreno natural esta deberá compactarse al 90% de su peso volumétrico seco máximo, el cual deberá mantenerse "seco", durante la etapa constructiva, es decir libre de encharcamientos.

3.- Los procedimientos requeridos para la construcción de las capas que constituyen la estructura del mejoramiento, serán semejantes a las usuales en la generalidad d las obras.

Sin otro particular por le momento, quedo a su disposición para aclarar o completar cualquier punto que al respecto tuviera o bien solicitarme.

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

FERNANDO CALDERON N°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 124 45 54
RFC. LORM640415UB2 email: jlr_060292@hotmail.com

PAVIMENTO FLEXIBLE

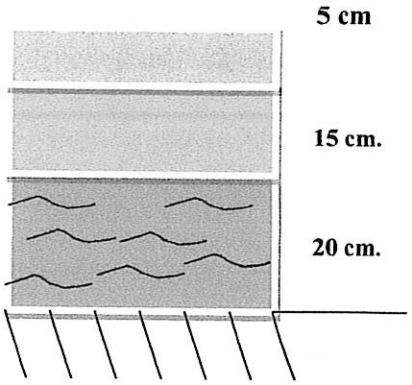

CARPETA ASFALTICA

BASE HIDRAULICA

SUB RASANTE

TERRENO NATURAL

GRECO SUMINISTROS
S.A. DE C.V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

GRECO SUMINISTROS
SA DE CV
R.F.C.: GSU160425JK8

PAVIMENTO RIGIDO

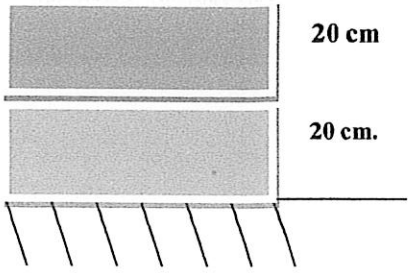

CONCRETO HIDRAULICO

BASE HIDRAULICA

TERRENO NATURAL

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C.V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

FERNANDO CALDERON N°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 124 45 54
RFC. LORM640415UB2 email: jlr_060292@hotmail.com

00000076

GRECO SUMINISTROS SA DE CV

R.F.C. : GSU160425JK8

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C.V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL
RFC. LORM640415UB2 em@il: jlr_060292@hotmail.com

00000077

GRECO SUMINISTROS SA DE CV

R.F.C. : GSU160425JK8

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 [illegible]
RFC. LORM640415UB2 em@il: jlr_060292@hotmail.com

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

00000078

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 124
RFC. LORM640415UB2 em@il: jlr_060292@hotmail.com

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

00000079

GRECO SUMINISTROS SA DE CV

R.F.C. : GSU160425JK8

GRECO SUMINISTROS S. A. DE C. V.
R. GSU 160425 JK8
00000080

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 124 45 5
RFC. LORM640415UB2 em@il: jlr_060292@hotmail.com

GRECO SUMINISTROS
SA DE CV

R.F.C. : GSU160425JK8

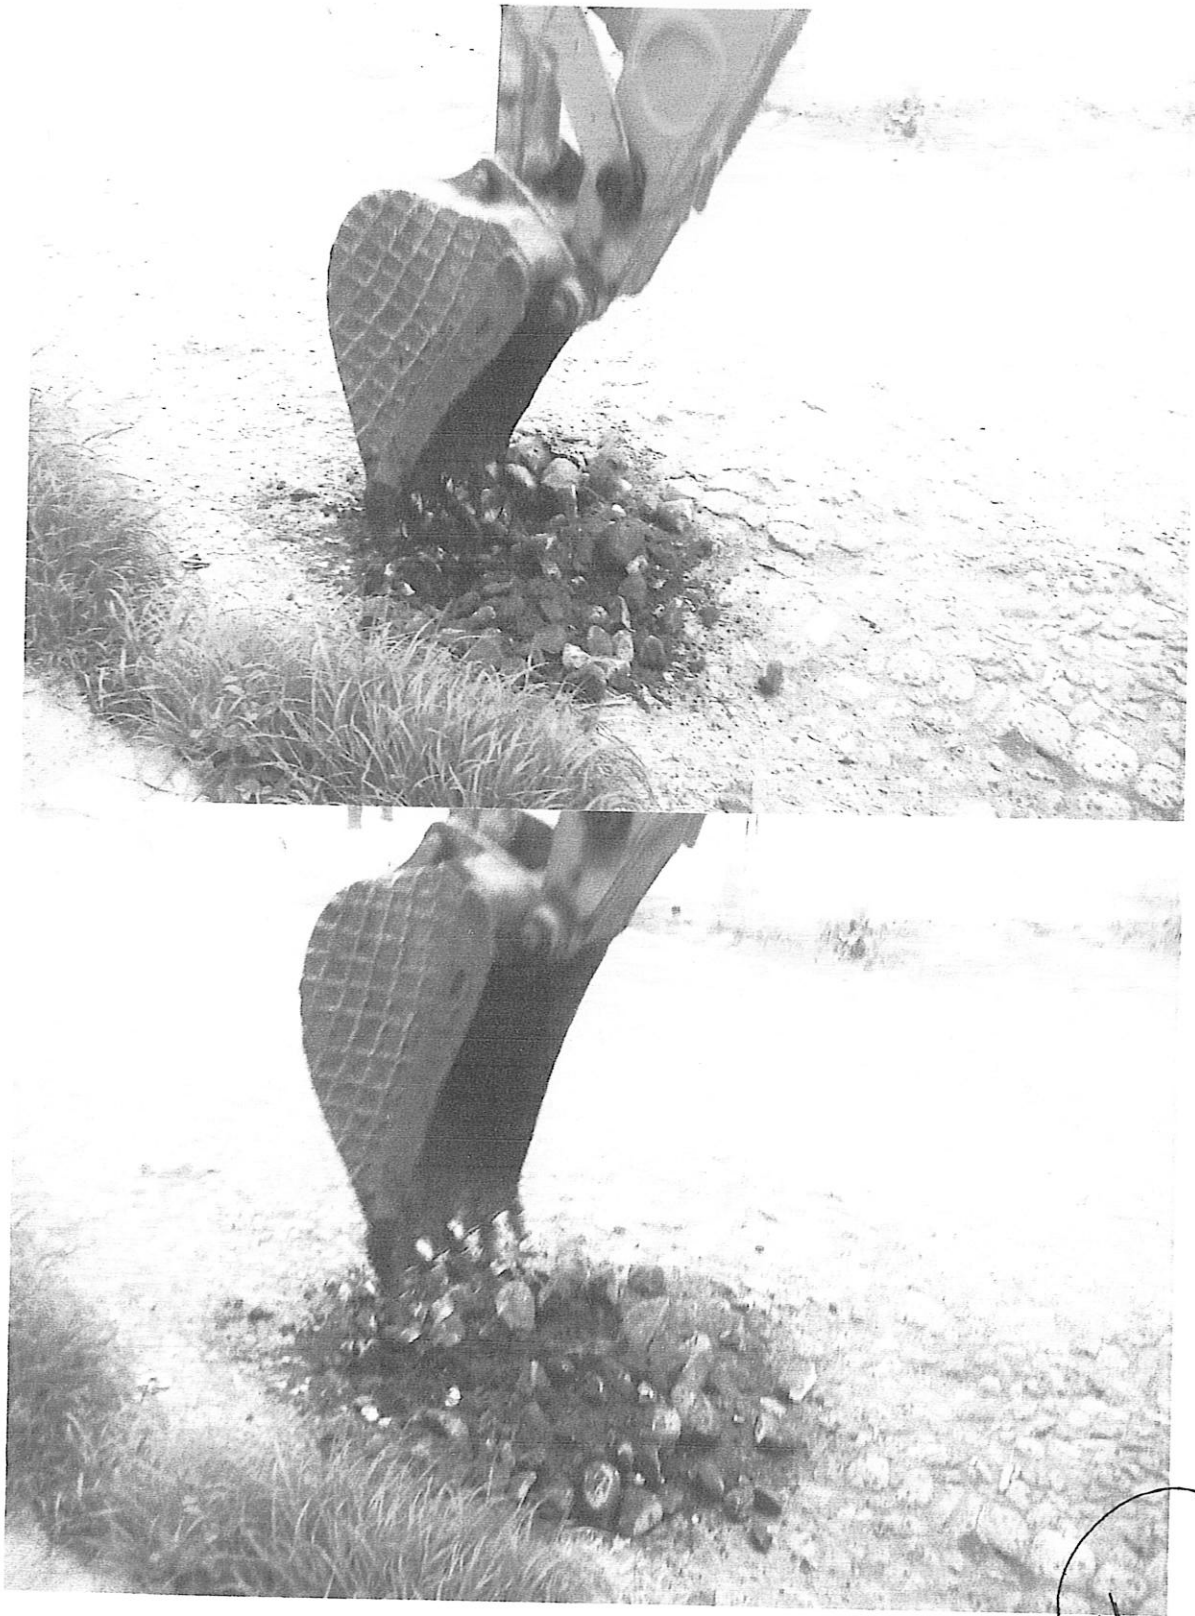

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 124 45 44
RFC. LORM640415UB2 em@il: jlr_060292@hotmail.com

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

00000081

GRECO SUMINISTROS
SA DE CV
R.F.C. : GSU160425JK8

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C.V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 124 45 54
RFC. LORM640415UB2 em@il: jlr_060292@hotmail.com

GRECO SUMINISTROS SA DE CV

R.F.C. : GSU160425JK8

00000083

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 1[illegible]
RFC. LORM640415UB2 em@il: jlr_060292@hotmail.com

GRECO SUMINISTROS
S. A. DE C. V.
R.F.C. GSU 160425 JK8

GRECO SUMINISTROS SA DE CV

R.F.C. : GSU160425JK8

00000084

FERNANDO CALDERONN°173 COL. CENTRO CD. GUZMAN JAL. TEL 341 108 48 37, CEL 341 1
RFC. LORM640415UB2 em@il: jlr_060292@hotmail.com

GRECO SUMINISTROS
S.A. DE C.V.
R.F.C. GSU 160425 JK3

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
Responsable	OBRAS PUBLICAS		

PRESUPUESTO

Partida: RED DE DRENAJE SANITARIO

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
TRA-025	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA.	M2	860.00	$11.24	$9,670.00
EXC-282	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	121.81	$86.45	$10,530.47
AFI-388	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA, EN MATERIAL "B" EN SECO.	M2	405.92	$37.22	$15,110.04
TEN-026	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA DE P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25 (INCLUYE MATERIAL) ESP=10 CMS.	M3	8.11	$591.88	$4,800.18
SUM-279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25, (MARCA REXOLIT) (ALCANTARILLADO)	ML	108.13	$431.66	$46,675.85
ACO-530	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE PVC 12" CON MATERIAL DE BANCO (TIERRA AMARILLA)	M3	28.85	$171.63	$4,951.65
DES-579	DESCARGA ALCANTARILLADO A BASE DE TUBERIA P.V.C. 6" DE DIAM. CON CAMPANA (TUBERIA ALCANTARILLADO DE MORMA MARCA REXOLIT), SILLETA 12"X6"; EMPAQUE DE 6", CODO DE 6"X90°; PEGAMENTO P.V.C. Y LIJA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION.	PZA	15.00	$1,993.72	$29,905.74
REG-365	REGISTRO SANITARIO DE 60X60X100 CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO PULIDO. INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO.	PZA	15.00	$1,405.51	$21,082.59
POZ-035	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 MTS. DEPROF. PARA TUBERIA DE 12" DE DIAM. INCLUYE: EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL.	PZA	3.00	$7,994.06	$23,982.17
REL-054	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	M3	77.20	$124.45	$9,607.54
RET-001	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA. AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	57.98	$67.33	$3,904.04
CAR-005	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM. APROX.)	M3	405.89	$14.60	$5,927.69
LIM-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	860.00	$11.21	$9,644.20
				SUBTOTAL RED DE DRENAJE	**$ 195,792.18**

Partida: RED DE AGUA POTABLE

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
TRA-025	TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA.	M2	760.58	$11.24	$8,552.11
EXC-282	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	57.38	$86.45	$4,960.50

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
Responsable	OBRAS PUBLICAS		

PRESUPUESTO

AFI-388	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA, EN MATERIAL "B" EN SECO.	M2	248.64	$37.22	$9,255.42
TEN-026	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA DE CONCRETO (INCLUYE MATERIAL) ESP=10 CMS.	M3	5.74	$591.88	$3,397.42
SUM-299	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO RD=26 (LÍNEA DE AGUA POTABLE)	ML	95.63	$291.71	$27,896.63
CAJ-298	CAJA PARA VALVULAS TIPO1-1-A INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA PIEDRA BRAZA, PISO DE CONCRETO SIMPLE, MURO DE TEZON A BASE DE BLOCK DE CEMENTO CADENA DE REPARTICION, APLANADO EN MUROS, LOSA DE CONCRETO REFORZADO, CONTRA MARCO SENCILLO DE 4" X 1.40 ML. (CENTRADO), TAPA DE FOFO C/MARCO METALICO DE 50 X 50 CMS. TIPO STANDART, RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA.	PZA	6.00	$7,401.09	$44,406.52
TOM-432	TOMA DOMICILIARIA DE (3 MTS.) CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. DE 2 1/2" DE DIAM., TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, TENDIDO DE MANGUERA RD 8 1/2" DE DIAM., TERRAPLEN Y COMPACTACION.	PZA	13.00	$1,539.84	$20,017.87
REL-054	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	M3	51.64	$124.45	$6,426.60
RET-001	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA. AL 1er KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	7.46	$67.33	$502.31
ACA-005	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL 1o EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM)	M3	52.21	$14.60	$762.48
LIM-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	760.58	$11.21	$8,529.29
				SUBTOTAL RED DE AGUA	**$ 134,707.15**

Partida: MACHUELOS Y BANQUETAS

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
TRA-025	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIBAS, CON TRANSITO Y NIVEL	M2	409.52	$11.24	$4,604.72
DEM-113	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO Y/O BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR,NO INCLUYE EL FIRME, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	M2	141.79	$104.36	$14,797.80
EXC-024	EXCAVACION A MANO PARA CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" (TEPETATE) EN SECO DE 0.00 MTS. A 2.00 MTS. DE PROF.	M3	29.82	$86.45	$2,577.94

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
Responsable	OBRAS PUBLICAS		

PRESUPUESTO

MAC-263	MACHUELO DE CONCRETO TIPO L, PECHO PALOMA HECHO EN OBRA DE F´C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 40 X 50 CMS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN.	ML	99.39	$672.80	$66,869.59
MAC-254	MACHUELO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 35 X 10 CMS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN.	ML	91.93	$210.50	$19,351.27
ACA-002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DE LA DEMOLICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA.	M3	26.38	$67.33	$1,776.28
ACA-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA.	M3	184.63	$14.60	$2,696.37
BAS-497	BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.	M3	49.14	$369.27	$18,146.13
BAN-306	BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8, RR 28 DIAS, DE 8 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO, ESTAMPADO TIPO PATA DE ELEFANTE EN BANQUETA, CON COLOR OCRE.	M2	409.52	$835.20	$342,031.10
RAM-167	RAMPAS DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS (F´c=150 kg/cm2) ESP. = 8 CMS. INCLUYE: FORJADO, CIMBRADO Y COLADO, ACABADO ESCOBILLADO, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 4% Y MÁXIMA 10%; CON SEÑALIZACIÓN VISUAL Y TÁCTIL SEGÚN NMX-R-050-2009. ANCHO MÍNIMO LIBRE DE RAMPA PARA CIRCULAR DE 0.90 MTS, CON ACABADO FINAL ANTI-DERRAPANTE.	M2	10.08	$835.20	$8,418.82
LIM-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	409.52	$11.21	$4,592.44
				SUBTOTAL MACHUELOS Y BANQUETAS	**$ 485,862.45**

Partida: PAVIMENTACION

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
DEM-113	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR CON ROTOMARTILLO, NO INCLUYE EL FIRME, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	M2	731.16	$194.35	$142,100.95
TRA-025	TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMPO, INCLUYE: TRAZO, POR MEDIO DE TEODOLITO O ESTACION TOTAL, NIVEL, CINTA Y EQUIPO COMPLEMENTARIO COMO, BALISA, ESTADAL, PRISMA ESTACAS, MOJONERAS, PINTURA, CLAVOS, HILOS, MANO DE OBRA, ETC.	M2	411.10	$11.24	$4,622.49
CAJ-036	PREPARACION DE CAJON PARA COLOCACION DE BASE Y PAVIMENTO HIDRAULICO, INCLUYE: EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, MANO DE OBRA, AFINE Y COMPACTACION DE LA MISMA CON UNA SECCION PROMEDIO DE 25 CMS	M3	82.22	$52.27	$4,297.98

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	Lugar	SAYULA, JALISCO
Responsable	OBRAS PUBLICAS		

PRESUPUESTO

ACA-002	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL TIPO I Y II, PRODUCTO DE EXCAVACION, A UN KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN SECCIONES.	M3	296.99	$81.55	$24,220.78
ACA-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM. APROX.)	M3	2078.91	$18.99	$39,487.21
BAS-020	ELABORACION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA) COMPACTADA AL 95% (PROCTOR), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. ESPESOR DE 20 CMS.	M3	82.22	$369.27	$30,361.72
PAV-001	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8, RR 28 DIAS, DE 20 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRADO DE FRONTERAS.	M2	411.10	$1,017.28	$418,203.94
COR-056	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO EN PAVIMENTOS DE 8 A 15 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO	ML	138.63	$38.60	$5,351.70
CAL-057	CALAFATEO DE JUNTA DE CONCRETO HIDRAULICO CON SELLADOR DE POLIURETANO. INCLUYE: RASPADO DE POLIURETAN O POLIESTIRENOEN JUNTA DE 0.50 ML. POR 2 CM.	ML	138.63	$33.57	$4,654.39
LIM-158	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE BARRIDO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	M2	411.10	$10.21	$4,199.05

SUBTOTAL PAVIMENTACION $ 677,500.22

GRANTOTAL $ 1,493,861.99

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000088

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
		Fecha de inicio	Jueves 12 de abril de 2018
Responsable	OBRAS PUBLICAS	**Fecha de terminacion**	Miercoles 22 de agosto de 2018

CALENDARIO DE OBRA

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Abril				Mayo					Junio					Julio					Agosto			
				S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4
Partida: RED DE DRENAJE SANITARIO																										
TRA-025	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA.	M2	860.00																							
EXC-282	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	121.81																							
AFI-388	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA, EN MATERIAL "B" EN SECO.	M2	405.92																							
TEN-026	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA DE P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25 (INCLUYE MATERIAL) ESP=10 CMS.	M3	8.11																							
SUM-279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25, (MARCA REXOLIT) (ALCANTARILLADO)	ML	108.13																							
ACO-530	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE PVC 12" CON MATERIAL DE BANCO (TIERRA AMARILLA)	M3	28.85																							
DES-579	DESCARGA ALCANTARILLADO A BASE DE TUBERIA P.V.C. 6" DE DIAM. CON CAMPANA (TUBERIA ALCANTARILLADO DE MORMA MARCA REXOLIT), SILLETA 12"X6"; EMPAQUE DE 6", CODO DE 6"X90º; PEGAMENTO P.V.C. Y LIJA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION.	PZA	15.00																							
REG-365	REGISTRO SANITARIO DE 60X60X100 CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO PULIDO. INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO.	PZA	15.00																							

68000000

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
		Fecha de inicio	Jueves 12 de abril de 2018
Responsable	OBRAS PUBLICAS	**Fecha de terminacion**	Miercoles 22 de agosto de 2018

CALENDARIO DE OBRA

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Abril				Mayo					Junio				Julio					Agosto			
				S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4
POZ-035	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 MTS. DEPROF. PARA TUBERIA DE 12" DE DIAM. INCLUYE: EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL.	PZA	3.00																							
REL-054	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	M3	77.20																							
RET-001	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA. AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	57.98																							
CAR-005	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM.)	M3	405.89																							
LIM-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	860.00																							
Partida:	**RED DE AGUA POTABLE**																									
TRA-025	TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA.	M2	760.58																							
EXC-282	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	57.38																							
AFI-388	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA, EN MATERIAL "B" EN SECO.	M2	248.64																							
TEN-026	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA DE CONCRETO (INCLUYE MATERIAL) ESP=10 CMS.	M3	5.74																							
SUM-299	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO RD=26 (LÍNEA DE AGUA POTABLE)	ML	95.63																							

0000090

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
		Fecha de inicio	Jueves 12 de abril de 2018
Responsable	OBRAS PUBLICAS	**Fecha de terminacion**	Miercoles 22 de agosto de 2018

CALENDARIO DE OBRA

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Abril				Mayo					Junio				Julio					Agosto			
				S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4
CAJ-298	CAJA PARA VALVULAS TIPO1-1-A INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA PIEDRA BRAZA, PISO DE CONCRETO SIMPLE, MURO DE TEZON A BASE DE BLOCK DE CEMENTO CADENA DE REPARTICION, APLANADO EN MUROS, LOSA DE CONCRETO REFORZADO, CONTRA MARCO SENCILLO DE 4" X 1.40 ML. (CENTRADO), TAPA DE FOFO C/MARCO METALICO DE 50 X 50 CMS. TIPO STANDART, RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y RETIRO DE MAT. EXCEDENTE DE LA OBRA.	PZA	6.00																							
TOM-432	TOMA DOMICILIARIA DE (3 MTS.) CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. DE 2 1/2" DE DIAM., TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, TENDIDO DE MANGUERA RD 8 1/2" DE DIAM., TERRAPLEN Y COMPACTACION.	PZA	13.00																							
REL-054	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	M3	51.64																							
RET-001	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA. AL 1er KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	7.46																							
ACA-005	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL 1o EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM)	M3	52.21																							
LIM-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	760.58																							

16000000

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
		Fecha de inicio	Jueves 12 de abril de 2018
Responsable	OBRAS PUBLICAS	**Fecha de terminacion**	Miercoles 22 de agosto de 2018

CALENDARIO DE OBRA

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Abril				Mayo					Junio					Julio					Agosto			
				S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4
Partida:	**MACHUELOS Y BANQUETAS**																									
TRA-025	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIBAS, CON TRANSITO Y NIVEL .	M2	409.52																							
DEM-113	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO Y/O BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR,NO INCLUYE EL FIRME, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	M2	141.79																							
EXC-024	EXCAVACION A MANO PARA CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" (TEPETATE) EN SECO DE 0.00 MTS. A 2.00 MTS. DE PROF.	M3	29.82																							
MAC-263	MACHUELO DE CONCRETO TIPO L, PECHO PALOMA HECHO EN OBRA DE F´C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 40 X 50 CMS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN.	ML	99.39																							
MAC-254	MACHUELO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 35 X 10 CMS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN.	ML	91.93																							
ACA-002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DE LA DEMOLICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA.	M3	26.38																							
ACA-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA.	M3	184.63																							

2600000

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
		Fecha de inicio	Jueves 12 de abril de 2018
Responsable	OBRAS PUBLICAS	**Fecha de terminacion**	Miercoles 22 de agosto de 2018

CALENDARIO DE OBRA

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Abril				Mayo					Junio					Julio					Agosto			
				S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4
BAS-497	BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.	M3	49.14																							
BAN-306	BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8, RR 28 DIAS, DE 8 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO, TERMINADO MARTELINADO DE BANQUETA, CON COLOR PREFERIDO Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	409.52																							
RAM-167	RAMPAS DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS (F´c=150 kg/cm2) ESP. = 8 CMS. INCLUYE: FORJADO, CIMBRADO Y COLADO, ACABADO ESCOBILLADO, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 4% Y MÁXIMA 10%; CON SEÑALIZACIÓN VISUAL Y TÁCTIL SEGÚN NMX-R-050-2009. ANCHO MÍNIMO LIBRE DE RAMPA PARA CIRCULAR DE 0.90 MTS, CON ACABADO FINAL ANTI-DERRAPANTE.	M2	10.08																							
LIM-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	409.52																							
Partida:	**PAVIMENTACION**																									
DEM-113	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR CON ROTOMARTILLO, NO INCLUYE EL FIRME, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	M2	731.16																							

00000093

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
		Fecha de inicio	Jueves 12 de abril de 2018
Responsable	OBRAS PUBLICAS	**Fecha de terminacion**	Miercoles 22 de agosto de 2018

CALENDARIO DE OBRA

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Abril				Mayo					Junio					Julio					Agosto			
				S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4
TRA-025	TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMPO, INCLUYE: TRAZO, POR MEDIO DE TEODOLITO O ESTACION TOTAL, NIVEL, CINTA Y EQUIPO COMPLEMENTARIO COMO, BALISA, ESTADAL, PRISMA ESTACAS, MOJONERAS, PINTURA, CLAVOS, HILOS, MANO DE OBRA, ETC.	M2	411.10																							
CAJ-036	PREPARACION DE CAJON PARA COLOCACION DE BASE Y PAVIMENTO HIDRAULICO, INCLUYE: EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, MANO DE OBRA, AFINE Y COMPACTACION DE LA MISMA CON UNA SECCION PROMEDIO DE 25 CMS.	M3	82.22																							
ACA-002	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL TIPO I Y II, PRODUCTO DE EXCAVACION, A UN KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN SECCIONES.	M3	296.99																							
ACA-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM. APROX.)	M3	2078.91																							
BAS-020	ELABORACION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA) COMPACTADA AL 95% (PROCTOR), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. ESPESOR DE 20 CMS.	M3	82.22																							

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
		Fecha de inicio	Jueves 12 de abril de 2018
Responsable	OBRAS PUBLICAS	**Fecha de terminacion**	Miercoles 22 de agosto de 2018

CALENDARIO DE OBRA

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Abril				Mayo					Junio					Julio					Agosto			
				S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4
PAV-001	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8, RR 28 DIAS, DE 20 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRADO DE FRONTERAS.	M2	411.10																							
COR-056	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO EN PAVIMENTOS DE 8 A 15 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO.	ML	138.63																							
CAL-057	CALAFATEO DE JUNTA DE CONCRETO HIDRAULICO CON SELLADOR DE POLIURETANO. INCLUYE: RASPADO DE POLIURETAN O POLIESTIRENOEN JUNTA DE 0.50 ML. POR 2 CM.	ML	138.63																							
LIM-158	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE BARRIDO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	M2	411.10																							

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

000000095

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
Responsable	OBRAS PUBLICAS		

CATALOGO DE CONCEPTOS

Partida: RED DE DRENAJE SANITARIO

Código	Nombre	Unidad	Cantidad
TRA-025	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA.	M2	860.00
EXC-282	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	121.81
AFI-388	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA, EN MATERIAL "B" EN SECO.	M2	405.92
TEN-026	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA DE P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25 (INCLUYE MATERIAL) ESP=10 CMS.	M3	8.11
SUM-279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25, (MARCA REXOLIT) (ALCANTARILLADO)	ML	108.13
ACO-530	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE PVC 12" CON MATERIAL DE BANCO (TIERRA AMARILLA)	M3	28.85
DES-579	DESCARGA ALCANTARILLADO A BASE DE TUBERIA P.V.C. 6" DE DIAM. CON CAMPANA (TUBERIA ALCANTARILLADO DE MORMA MARCA REXOLIT), SILLETA 12"X6"; EMPAQUE DE 6", CODO DE 6"X90°; PEGAMENTO P.V.C. Y LIJA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION.	PZA	15.00
REG-365	REGISTRO SANITARIO DE 60X60X100 CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO PULIDO. INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO.	PZA	15.00
POZ-035	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 MTS. DEPROF. PARA TUBERIA DE 12" DE DIAM. INCLUYE: EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL.	PZA	3.00
REL-054	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	M3	77.20
RET-001	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA. AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	57.98
CAR-005	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM. APROX.)	M3	405.89
LIM-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	860.00

Partida: RED DE AGUA POTABLE

Código	Nombre	Unidad	Cantidad
TRA-025	TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA.	M2	760.58
EXC-282	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	57.38
AFI-388	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA, EN MATERIAL "B" EN SECO.	M2	248.64
TEN-026	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA DE CONCRETO (INCLUYE MATERIAL) ESP=10 CMS.	M3	5.74
SUM-299	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO RD=26 (LÍNEA DE AGUA POTABLE)	ML	95.63
CAJ-298	CAJA PARA VALVULAS TIPO1-1-A INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA PIEDRA BRAZA, PISO DE CONCRETO SIMPLE, MURO DE TEZON A BASE DE BLOCK DE CEMENTO CADENA DE REPARTICION, APLANADO EN MUROS, LOSA DE CONCRETO REFORZADO, CONTRA MARCO SENCILLO DE 4" X 1.40 ML. (CENTRADO), TAPA DE FOFO C/MARCO METALICO DE 50 X 50 CMS. TIPO STANDART, RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA.	PZA	6.00
TOM-432	TOMA DOMICILIARIA DE (3 MTS.) CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. DE 2 1/2" DE DIAM., TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, TENDIDO DE MANGUERA RD 8 1/2" DE DIAM., TERRAPLEN Y COMPACTACION	PZA	13.00

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	Lugar	SAYULA, JALISCO
Responsable	OBRAS PUBLICAS		

CATALOGO DE CONCEPTOS

REL-054	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	M3	51.64
RET-001	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA. AL 1er KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	7.46
ACA-005	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL 1o EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM)	M3	52.21
LIM-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	760.58

Partida: MACHUELOS Y BANQUETAS

Código	Nombre	Unidad	Cantidad
TRA-025	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL.	M2	409.52
DEM-113	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO Y/O BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR,NO INCLUYE EL FIRME, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	M2	141.79
EXC-024	EXCAVACION A MANO PARA CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" (TEPETATE) EN SECO DE 0.00 MTS. A 2.00 MTS. DE PROF.	M3	29.82
MAC-263	MACHUELO DE CONCRETO TIPO L, PECHO PALOMA HECHO EN OBRA DE F´C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 40 X 50 CMS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN.	ML	99.39
MAC-254	MACHUELO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 35 X 10 CMS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN.	ML	91.93
ACA-002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DE LA DEMOLICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA.	M3	26.38
ACA-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA.	M3	184.63
BAS-497	BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.	M3	49.14
BAN-306	BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8, RR 28 DIAS, DE 8 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO, TERMINADO MARTELINADO DE BANQUETA, CON COLOR PREFERIDO Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA.	M2	409.52
RAM-167	RAMPAS DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS (F´c=150 kg/cm2) ESP. = 8 CMS. INCLUYE: FORJADO, CIMBRADO Y COLADO, ACABADO ESCOBILLADO, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 4% Y MÁXIMA 10%; CON SEÑALIZACIÓN VISUAL Y TÁCTIL SEGÚN NMX-R-050-2009. ANCHO MÍNIMO LIBRE DE RAMPA PARA CIRCULAR DE 0.90 MTS, CON ACABADO FINAL ANTI-DERRAPANTE.	M2	10.08
LIM-158	LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	M2	409.52

Partida: PAVIMENTACION

Código	Nombre	Unidad	Cantidad
DEM-113	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR CON ROTOMARTILLO, NO INCLUYE EL FIRME, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	M2	731.16
TRA-025	TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMPO, INCLUYE: TRAZO, POR MEDIO DE TEODOLITO O ESTACION TOTAL, NIVEL, CINTA Y EQUIPO COMPLEMENTARIO COMO, BALISA, ESTADAL, PRISMA ESTACAS, MOJONERAS, PINTURA, CLAVOS, HILOS, MANO DE OBRA, ETC.	M2	411.10
CAJ-036	PREPARACION DE CAJON PARA COLOCACION DE BASE Y PAVIMENTO HIDRAULICO, INCLUYE: EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, MANO DE OBRA, AFINE Y COMPACTACION DE LA MISMA CON UNA SECCION PROMEDIO DE 25 CMS	M3	82.22

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018
OBRAS PUBLICAS

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.	**Lugar**	SAYULA, JALISCO
Responsable	OBRAS PUBLICAS		

CATALOGO DE CONCEPTOS

ACA-002	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL TIPO I Y II, PRODUCTO DE EXCAVACION, A UN KILOMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN SECCIONES.	M3	296.99
ACA-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM. APROX.)	M3	2078.91
BAS-020	ELABORACION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA) COMPACTADA AL 95% (PROCTOR), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. ESPESOR DE 20 CMS.	M3	82.22
PAV-001	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8, RR 28 DIAS, DE 20 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRADO DE FRONTERAS.	M2	411.10
COR-056	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO EN PAVIMENTOS DE 8 A 15 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO.	ML	138.63
CAL-057	CALAFATEO DE JUNTA DE CONCRETO HIDRAULICO CON SELLADOR DE POLIURETANO. INCLUYE: RASPADO DE POLIURETAN O POLIESTIRENOEN JUNTA DE 0.50 ML. POR 2 CM.	ML	138.63
LIM-158	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE BARRIDO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	M2	411.10

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000098

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: TRA-025 TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA
Unidad: m
Código: PU-25
Fecha de cot.:
Código de proy.:
Costo unitario: 11.24 Moneda: Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA-4	MAD-004 MADERA DE PINO DE 2A.	pt	0.0350000	39.00	1.37
MA-5	EST-005 ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 2A.	pt	0.0925000	39.00	3.61
MA-6	CLA-006 CLAVO C/CAB.REFORZADO 2 1/2"	Kg	0.0050000	47.87	0.24
MA-7	HIL-007 HILOS DE NYLON (PIOLA PLASTICA) No. 100	pza	0.0100000	60.10	0.60
MA-8	VAR-008 VARILLA 3/8" P/FIJAR B.N.	Kg	0.0150000	20.62	0.31
				SUBTOTAL:	**6.12**
Mano de obra					
MO-8	Top-008 Topografo + 2 Cadeneros	Jor	0.0030500	1,309.32	3.99
				SUBTOTAL:	**3.99**
Maquinaria					
MQ-4	REN-004 RENTA DE APARATOS TOPOGRAFICOS	Jor	0.0030300	372.00	1.13
				SUBTOTAL:	**1.13**
				TOT. INSUMOS:	***11.24***
Cargos en porcentaje				**Base**	
				COSTO DIRECTO	**11.24**
				SUBTOTAL:	**0.00**

PRECIO UNITARIO **11.24**

ONCE PESOS 24/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES

00000039

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: EXC-282 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD

Unidad: m3 **Código:** PU-282

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 86.45 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Maquinaria					
MQ-23	RET-023 RETRO EXCAVADORA	HR	0.2129300	406.00	86.45
				SUBTOTAL:	86.45

PRECIO UNITARIO 86.45

OCHENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

00000100

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: AFI-388 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA, EN MATERIAL "B" EN SECO.

Unidad: m2 **Código:** PU-388

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 37.22 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Mano de obra					
MO-42	Cua-042 Cuad. No.15 (Peon + 1/10 Cabo)	Jor	0.0949500	392.00	37.22
				SUBTOTAL:	37.22

PRECIO UNITARIO 37.22

TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000101

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: TEN-026 TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA DE PVC (INCLUYE MATERIAL) ESP=10 CMS.

Unidad: m3 Código: PU-26

Fecha de cot.: Código de proy.:

Costo unitario: 591.88 Moneda: Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA-9	ARE-009 ARENA DE RIO LAVADA	m3	1.1000000	480.00	528.00
				SUBTOTAL:	528.00
Mano de obra					
MO-42	Cua-042 Cuad. No.15 (Peon + 1/10 Cabo)	Jor	0.1629500	392.00	63.88
				SUBTOTAL:	63.88
				TOT. INSUMOS:	*591.88*
				COSTO DIRECTO	591.88

PRECIO UNITARIO 591.88

QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000102

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ		
Especialidad	OBRA PUBLICA	Lugar	SAYULA, JALISCO
Analista		Clave	2015- 2018
		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25 (MARCA REXOLIT) (ALCANTARILLADO)

Unidad: ML
Fecha de cot.: SEP/2016
Costo unitario: $ 431.66 Moneda: Pesos

Código:
Código de proy.:

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
MATERIALES					
MA	TUBO DE PVC SANITARIO RD 25 DE 12"	ML	1.030	306.88	316.09
				SUBTOTAL:	**316.09**
MANOD E OBRA					
MO	*CUADRILLA No. 20 (1 PLOMERO + AY. ESP.)*	JOR	*0.174*	*646.7*	*112.21*
				SUBTOTAL:	**112.21**
CARGOS EN PORCENTAJE					
	HERRAMIENTA MENOR	%	0.03000	112.21	3.37
				SUBTOTAL:	**3.37**

PRECIO UNITARIO **$ 431.66**

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000103

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ		
Especialidad	OBRA PUBLICA	Lugar	SAYULA, JALISCO
Analista		Clave	2015- 2018
		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: ACO-530 ACOSTILLADO DE TUBERIA DE PVC 12" DIAM. Y RELLENO CON ESP.= 0.30 MTS. X 1.00 MT. DE ANCHO CON MATERIAL DE BANCO (TIERRA AMARILLA)

Unidad: M3 **Código:** PU-530

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 171.63 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA-2	TIE-002 TIERRA AMARILLA	m3	1.3000000	124.89	162.36
				SUBTOTAL:	**162.36**
Mano de obra					
MO-6	Peo-006 Peon	Jor	0.0500000	185.50	9.28
				SUBTOTAL:	**9.28**
				TOT. INSUMOS:	***171.63***
Cargos en porcentaje				**Base**	
				COSTO DIRECTO	**171.63**

PRECIO UNITARIO **171.63**

UN CIENTO SETENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000104

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: POZ-035 POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.50 MTS. DEPROF. PARA TUBERIA DE 10" DE DIAM. INCLUYE: EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL.

Unidad: pza **Código:** PU-35

Fecha de cot.: 15- Feb- 2016 **Código de proy.:**

Costo unitario: 7,994.06 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
MATERIALES					
MA	TABIQUE ROJO RECOCIDO	MIL	0.7500000	3,749.55	2,812.16
MA	TUBO DE PVC SANITARIO DE 12"	M	2.0000000	306.88	613.76
MA	PIEDRA BRAZA	M3	0.5000000	397.70	198.85
MA	VARILLA DE 3/4" 19.1 MM	KG	12.0000000	20.19	242.28
				SUBTOTAL:	**3,867.05**
MANO DE OBRA					
MO	CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	3.4807600	846.63	2,946.92
MO	CUADRILLA No.1 (1 PEON)	JOR	3.4807600	304.50	1,059.89
				SUBTOTAL:	**4,006.81**
VARGOS EN PORCENTAJE					
	HERRAMIENTA MENOR	%	3.0000000	4,006.81	120.20
				SUBTOTAL:	**120.20**
				TOT. INSUMOS:	***7,994.06***
Cargos en porcentaje				**Base**	
				COSTO DIRECTO	**7,994.06**
PRECIO UNITARIO					**7,994.06**

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000105

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: REL-054 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.

Unidad: m3 **Código:** PU- 54

Fecha de cot.: 15- Feb- 2016 **Código de proy.:**

Costo unitario: 124.45 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA-1	AGU-001 AGUA	m3	0.3000000	54.75	16.43
				SUBTOTAL:	**16.43**
Mano de obra					
MO-6	Peo-006 Peon	Jor	0.1428800	365.07	52.16
				SUBTOTAL:	**52.16**
	Herramienta		0.0000%	(0.00)	0.00
	Mandos intermedios		3.0000%	(52.16)	1.56
	Consumibles		0.0000%	(0.00)	0.00
	Desperdicios		0.0000%	(0.00)	0.00
	BAILARINA		0.142880	(380.00)	54.29
				SUBTOTAL	**55.86**
	Utilidad		10.0000%	(0.00)	0.00
	Infonavit		0.0000%	(0.00)	
				SUBTOTAL	**0.00**
	RENTA DE BAILARINA		0.0000%	(0.00)	0.00

PRECIO UNITARIO 124.45

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 45/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000106

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: RET-001 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA.

Unidad: m3 **Código:** PU- 1

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 67.33 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Mano de obra					
MO-32	Cua-032 Cuad.12 (4 Peones)	Jor	0.0255100	1,199.21	30.59
				SUBTOTAL:	**30.59**
Maquinaria					
MQ-1	CAM-001 CAMION DE VOLTEO	Jor	0.0255100	1,440.00	36.73
				SUBTOTAL:	**36.73**
	Herramienta		0.0000%	(0.00)	0.00
	Mandos intermedios		0.0000%	(0.00)	0.00
	Consumibles		0.0000%	(0.00)	0.00
	Desperdicios		0.0000%	(0.00)	0.00
	Indirectos de seguros y fianzas		0.0000%	(0.00)	0.00
				SUBTOTAL	**0.00**
					67.33
	Utilidad		0.0000%	(0.00)	0.00
	Infonavit		0.0000%	(0.00)	0.00
				SUBTOTAL	**0.00**
	Capacitación ICIC		0.0000%	(0.00)	0.00

PRECIO UNITARIO 67.33

SESENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS MPALES

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000107

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: LIM-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA
Unidad: m2
Código: PU-158
Fecha de cot.:
Código de proy.:
Costo unitario: 11.21 Moneda: Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Mano de obra					
MO-6	Peo-006 Peon	Jor	0.0368000	304.50	11.21
				SUBTOTAL:	11.21
				TOT. INSUMOS:	*11.21*

Cargos en porcentaje	Base	
	COSTO DIRECTO	11.21
	SUBTOTAL	11.21

PRECIO UNITARIO 11.21
ONCE PESOS 21/100 M.N

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000108

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: TRA-025 TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA
Unidad: m
Código: PU-25
Fecha de cot.:
Código de proy.:
Costo unitario: 11.24 Moneda: Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA-4	MAD-004 MADERA DE PINO DE 2A.	pt	0.0350000	39.00	1.37
MA-5	EST-005 ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 2A.	pt	0.0925000	39.00	3.61
MA-6	CLA-006 CLAVO C/CAB.REFORZADO 2 1/2"	Kg	0.0050000	47.87	0.24
MA-7	HIL-007 HILOS DE NYLON (PIOLA PLASTICA) No. 100	pza	0.0100000	60.10	0.60
MA-8	VAR-008 VARILLA 3/8" P/FIJAR B.N.	Kg	0.0150000	20.62	0.31
				SUBTOTAL:	**6.12**
Mano de obra					
MO-8	Top-008 Topografo + 2 Cadeneros	Jor	0.0030500	1,309.32	3.99
				SUBTOTAL:	**3.99**
Maquinaria					
MQ-4	REN-004 RENTA DE APARATOS TOPOGRAFICOS	Jor	0.0030300	372.00	1.13
				SUBTOTAL:	**1.13**
				TOT. INSUMOS:	***11.24***
Cargos en porcentaje				**Base**	
				COSTO DIRECTO	**11.24**
				SUBTOTAL:	**0.00**

PRECIO UNITARIO **11.24**
ONCE PESOS 24/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000109

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: EXC-282 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD

Unidad: m3 **Código:** PU-282

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 138.80 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Maquinaria					
MQ-23	RET-023 RETRO EXCAVADORA	HR	0.2129300	406.00	86.45
				SUBTOTAL:	**86.45**

PRECIO UNITARIO **86.45**

OCHENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS MPALES

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000110

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: AFI-388 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA, EN MATERIAL "B" EN SECO.

Unidad: m2 **Código:** PU-388

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 37.22 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Mano de obra					
MO-42	Cua-042 Cuad. No.15 (Peon + 1/10 Cabo)	Jor	0.0949500	392.00	37.22
				SUBTOTAL:	**37.22**

PRECIO UNITARIO **37.22**

TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000111

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ		
		Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: TEN-026 TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA DE PVC (INCLUYE MATERIAL) ESP=10 CMS.

Unidad: m3 **Código:** PU-26

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 591.88 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA-9	ARE-009 ARENA DE RIO LAVADA	m3	1.1000000	480.00	528.00
				SUBTOTAL:	528.00
Mano de obra					
MO-42	Cua-042 Cuad. No.15 (Peon + 1/10 Cabo)	Jor	0.1629500	392.00	63.88
				SUBTOTAL:	63.88
				TOT. INSUMOS:	*591.88*
				COSTO DIRECTO	591.88

PRECIO UNITARIO **591.88**

QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000117

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: SUM-299 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO RD=26 (LINEA DE AGUA POTABLE

Unidad: m **Código:** PU-299

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 291.71 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA-208	TUB-208 TUBO P.V.C. HIDRAULICO 3" DIAM. RD=32.50	m	1.0300000	97.50	100.43
MA-209	COP-209 COPLE PARA REPARACION DE 3" HIDRAULIC	pza	0.0670000	66.50	4.46
MA-210	EXT-210 EXTREMIDAD CAMPANA O ESPIGA HID. 3"	pza	0.0440000	65.60	2.89
MA-211	EMP-211 EMPAQUES DE PLOMO P/BRIDA DE 3" DE DIA	pza	0.0440000	23.86	1.05
MA-212	TOR-212 TORNILLO 1/2" DIAMETRO X 4" DE LONGITUD	pza	0.1770000	2.30	0.41
MA-213	EMP-213 EMPAQUE ANGER PARA PVC DE 3" DIAM.	pza	0.0440000	6.58	0.29
MA-214	LUB-214 LUBRICANTE PARA P.V.C.	Kg	0.0600000	43.16	2.59
				SUBTOTAL:	**112.10**
Mano de obra					
MO-15	Cua-015 Cuad.2 (2 Tuberos [b])	Jor	0.0850000	621.32	52.81
MO-16	Tub-016 Tubero [a]	Jor	0.0850000	310.66	26.41
MO-17	Cua-017 Cuad.3 (4 Ayudantes)	Jor	0.0850000	1,181.03	100.39
				SUBTOTAL:	**179.61**
				TOT. INSUMOS:	***291.71***
Cargos en porcentaje				**Base**	
				COSTO DIRECTO	**291.71**

PRECIO UNITARIO **291.71**

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS 2015-2018

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000113

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: CAJ-298 CAJA PARA VALVULAS TIPO1-1-A INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA PIEDRA BRAZA, PISO DE CONCRETO SIMPLE, MURO DE TEZON A BASE DE BLOCK DE CEMENTO CADENA DE REPARTICION, APLANADO EN MUROS, LOSA DE CONCRETO REFORZADO, CONTRA MARCO SENCILLO DE 4" X 1.40 ML. (CENTRADO), TAPA DE FOF C/MARCO METALICO DE 50 X 50 CMS. TIPO STANDART, RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA.

Unidad: pza **Código:** PU-298

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 7,401.09 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA-207	CON-207 CONTRAMARCO SENCILLO DE 4"X1.40 ML (C	pza	1.0000000	250.00	250.00
MA-206	MAR-206 TAPA DE Fo. Fo. C/MARCO METALICO 50X50 (	pza	1.0000000	127.35	127.35
				SUBTOTAL:	**377.35**
Unitarios					
PU-66	TRA-066 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO LAS VECES QUE SE REQUIERA (UN SOLO PAGO)	m2	3.0000000	11.24	33.72
PU-48	EXC-048 EXCAVACION A MANO EN CEPAS TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROF. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO	m3	3.8000000	138.80	527.44
PU-29	PLA-029 PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA SIN LABRAR ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3	m3	0.4500000	791.74	356.28
PU-63	PIS-063 PISO DE CONCRETO SIMPLE (f'c=150 kg/cm2) ESPESOR DE 8 CMS. TERMINADO ESCOBILLADO.	m2	3.0000000	305.31	915.92
PU-109	*MUR-109 MURO DE TEZON A BASE DE BLOCK DE* CEMENTO (10x14x28) ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA-CEMENTO PROP.1:3 DE 0.00 A 2.50 MTS. DE ALTURA	*m2*	*4.0000000*	*262.12*	*1,048.48*
PU-41	CAD-041 CADENA DE REPARTICION DE CONCRETO ARMADO 14x15 CMS. CON 4 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" DIAM. @ 15 CMS. C.A.C. (CONC. f'c=150 kg/cm2) CIMBRA EN DOS CARAS.	m	6.2000000	279.84	1,735.01
PU-7	APL-007 APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4 UTILIZANDO PLOMO Y REGLA ESPESOR = 3 CMS. PROMEDIO (TERMINADO PULIDO)	m2	5.4000000	106.41	574.59
PU-249	LOS-249 LOSA DE CONCRETO REFORZADO CON DIAMETROS # 3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS PERALTE = 15 CMS. CONCRETO f'c= 250 kg/cm2.	m2	2.2500000	743.48	1,672.83
PU-54	REL-054 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y	m3	1.0000000	124.45	124.45
PU-1	RET-001 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA.	m3	0.5200000	67.33	35.01
				SUBTOTAL:	**7,023.74**

PRECIO UNITARIO **7,401.09**

SIETE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 09/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS

00000114

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ		
		Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: TOM-432 TOMA DOMICILIARIA DE (3 MTS.) CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. DE 2 1/2" DE DIAM., TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, TENDIDO DE TUBO DE MANGUERA RD 8 DE 1/2" DE DIAM., TERRAPLEN Y COMPACTACION.

Unidad: pza **Código:** PU-432

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 1,539.84 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Unitarios					
PU-431	TOM-431 TOMA DOMICILIARIA (3 MTS) DE AGUA POTABLE CON TUBO DE COBRE DE 1/2" (INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. DE 3" PARA TOMA DE RED GENERAL).	pza	1.0000000	892.28	892.28
PU-25	TRA-025 TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIBAS, CON TRANSITO Y NIVEL . *INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE* NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	m	3.0000000	11.24	33.72
PU-48	EXC-048 EXCAVACION A MANO EN CEPAS TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 MTS. DE PROF. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO	m3	1.8000000	138.80	249.84
PU-54	REL-054 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL *PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO* MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	m3	1.8000000	124.45	224.01
				SUBTOTAL:	**1,399.85**
	% de Mandos Intermedios		10.0000%	(1,399.85)	139.99
				SUBTOTAL	**1,539.84**

PRECIO UNITARIO **1,539.84**

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000115

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: REL-054 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.

Unidad: m3 **Código:** PU- 54

Fecha de cot.: 15- Feb- 2016 **Código de proy.:**

Costo unitario: 124.45 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA-1	AGU-001 AGUA	m3	0.3000000	54.75	16.43
				SUBTOTAL:	**16.43**
Mano de obra					
MO-6	Peo-006 Peon	Jor	0.1428800	365.07	52.16
				SUBTOTAL:	**52.16**
	Herramienta		0.0000%	(0.00)	0.00
	Mandos intermedios		3.0000%	(52.16)	1.56
	Consumibles		0.0000%	(0.00)	0.00
	Desperdicios		0.0000%	(0.00)	0.00
	BAILARINA		0.142880	(380.00)	54.29
				SUBTOTAL	**55.86**
	Utilidad		10.0000%	(0.00)	0.00
	Infonavit		0.0000%	(0.00)	
				SUBTOTAL	**0.00**
	RENTA DE BAILARINA		0.0000%	(0.00)	0.00

PRECIO UNITARIO 124.45

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 45/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000116

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ		
		Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: RET-001 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA.
Unidad: m3 **Código:** PU- 1
Fecha de cot.: **Código de proy.:**
Costo unitario: 67.33 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Mano de obra					
MO-32	Cua-032 Cuad.12 (4 Peones)	Jor	0.0255100	1,199.21	30.59
				SUBTOTAL:	**30.59**
Maquinaria					
MQ-1	CAM-001 CAMION DE VOLTEO	Jor	0.0255100	1,440.00	36.73
				SUBTOTAL:	**36.73**
	Herramienta		0.0000%	(0.00)	0.00
	Mandos intermedios		0.0000%	(0.00)	0.00
	Consumibles		0.0000%	(0.00)	0.00
	Desperdicios		0.0000%	(0.00)	0.00
	Indirectos de seguros y fianzas		0.0000%	(0.00)	0.00
				SUBTOTAL	**0.00**
					67.33
	Utilidad		0.0000%	(0.00)	0.00
	Infonavit		0.0000%	(0.00)	0.00
				SUBTOTAL	**0.00**
	Capacitación ICIC		0.0000%	(0.00)	0.00

PRECIO UNITARIO 67.33

SESENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000117

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ		
Especialidad	OBRA PUBLICA	Lugar	SAYULA, JALISCO
Analista		Clave	2015- 2018
		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: LIM-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA
Unidad: m2
Fecha de cot.:
Costo unitario: 11.21 **Moneda:** Pesos

Código: PU-158
Código de proy.:

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Mano de obra					
MO-6	Peo-006 Peon	Jor	0.0368000	304.50	11.21
				SUBTOTAL:	11.21
				TOT. INSUMOS:	*11.21*

Cargos en porcentaje	Base	
	COSTO DIRECTO	11.21
	SUBTOTAL	11.21

PRECIO UNITARIO 11.21
ONCE PESOS 21/100 M.N

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000118

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO Y/O BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR, NO INCLUYE: EL FIRME. INCLUYE: LOCALIZACIÓN DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCIÓN

Unidad: m2 **Código:** PU-113

Fecha de cot.: 15- Feb- 2017 **Código de proy.:**

Costo unitario: 104.36 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Mano de Obra					
	CUADRILLA No. 1 (1 PEON)	JOR	0.2507000	347.47	87.11
				SUBTOTAL:	87.11
Maquinaria					
	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	0.0200000	732.00	14.64
				SUBTOTAL:	14.64
Cargos en porcentaje					
	HERRAMIENTA MENOR	%	0.0300000	87.11	2.61
				SUBTOTAL:	2.61

PRECIO UNITARIO **104.36**

UN CIENTO CUATRO PESOS 36/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000119

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: MACHUELO DE CONCRETO TIPO L, PECHO PALOMA HECHO EN OBRA DE F`C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 40X50 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Unidad: m3 **Código:**

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 672.80 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
	TRIPLAY DE PINO 1CARA W.P. NACIONAL 16 MM	PZA	0.0824700	501.00	41.32
	DIESEL	LTO	0.3000000	13.85	4.15
	CLAVOS DE 2 A 4"	KG	0.2000000	21.12	4.22
	ALAMBRE RECOCIDO	KG	0.2000000	14.40	2.88
				SUBTOTAL:	52.58
Mano de Obra					
	CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	0.4439200	846.63	375.84
				SUBTOTAL:	375.84
Basicos					
	CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA	M3	0.1236000	1,886.00	233.11
				SUBTOTAL:	233.11
Cargos en Porcentaje					
	HERRAMIENTA MENOR	%	0.0300000	375.84	11.28
				SUBTOTAL:	11.28

PRECIO UNITARIO **672.80**

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000120

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: MACHUELO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F`C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS35X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Unidad: m3 **Código:**

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 210.50 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
	TRIPLAY DE PINO 1CARA W.P. NACIONAL 16 MM	PZA	0.0400000	501.00	20.04
	DIESEL	LTO	0.2000000	13.85	2.77
	CLAVOS DE 2 A 4"	KG	0.1000000	21.12	2.11
	ALAMBRE RECOCIDO	KG	0.1000000	14.40	1.44
				SUBTOTAL:	26.36
Mano de Obra					
	CUADRILLA No. 5 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	0.1414600	846.63	119.76
				SUBTOTAL:	119.76
Basicos					
	CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA	M3	0.0360500	1,686.00	60.78
				SUBTOTAL:	60.78
Cargos en Porcentaje					
	HERRAMIENTA MENOR	%	0.0300000	119.76	3.59
				SUBTOTAL:	3.59

PRECIO UNITARIO 210.50

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000121

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: ELABORACION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA) COMPACTADA AL 100% (PROCTOR), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. ESPESOR 20 CMS.

Unidad: M3 **Código:**

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 369.27 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA	AGUA EN PIPA	M3	0.49900	$50.64	25.27
MA	MATERIAL DE BANCO	M3	1.30000	$140.00	182.00
				SUBTOTAL:	**207.27**
Maquinaria					
MQ	MOTOCONFORMADORA	HORA	0.10000	670	67.00
MQ	COMPACTADOR RODILLO METALICO	HORA	0.10000	520.00	52.00
MQ	CAMION VOLTEO	HORA	0.20000	215.00	43.00
				SUBTOTAL:	**162.00**
				TOT. INSUMOS:	***369.27***
Cargos en porcentaje				**Base**	
	% de Herramienta		3.0000%	(0.00)	0.00
				COSTO DIRECTO	**0.00**
					369.27

PRECIO UNITARIO
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000122

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
		Clave	2015- 2018
Especialidad	OBRA PUBLICA	Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Analista			

Análisis de precios unitarios

Nombre: BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE F´C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8, RR 28 DIAS, DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO, TERMINADO ESTAMPADO PATA DE ELEFANTE COLOR OCRE.

Unidad: M2 **Código:**

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 835.20 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"X3.5"X8.25"	PZA	0.20000	$42.96	8.59
MA	CEMENTO GRIS	M3	0.00200	$3,240.00	6.48
MA	DESMOLDANTE	KG	0.34260	$160.00	54.82
MA	MOLDE PARA CONCRETO	PZA	0.07500	$499.00	37.43
				SUBTOTAL:	**107.31**
MANO DE OBRA					
MO	CUADRILLA No. 15 (1 ALBAÑIL + 3 PEON)	JOR	0.30000	1,853.87	556.16
				SUBTOTAL:	**556.16**
BASICOS					
BA	CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA	M3	0.08160	1900	155.04
				SUBTOTAL:	**155.04**

Cargos en porcentaje			Base	
	% de Herramienta	3.0000%	(556.16)	16.68
			COSTO DIRECTO	**16.68**

PRECIO UNITARIO **835.20**

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2015-2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000123

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: RAMPA DE CONCRETO ESTAMPADO DE F´C= 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8, RR 28 DIAS, DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO, TERMINADO ESTAMPADO PATA DE ELEFANTE COLOR OCRE.

Unidad: M2 **Código:**

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 794.31 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"X3.5"X8.25"	PZA	0.20000	$42.96	8.59
MA	CEMENTO GRIS	M3	0.00200	$3,240.00	6.48
MA	DESMOLDANTE	KG	0.34260	$160.00	54.82
MA	MOLDE PARA CONCRETO	PZA	0.07500	$499.00	37.43
				SUBTOTAL:	**107.31**
MANO DE OBRA					
MO	CUADRILLA No. 15 (1 ALBAÑIL + 3 PEON)	JOR	0.30000	1,853.87	556.16
				SUBTOTAL:	**556.16**
BASICOS					
BA	CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA	M3	0.08160	1900	155.04
				SUBTOTAL:	**155.04**
Cargos en porcentaje				**Base**	
	% de Herramienta		3.0000%	(556.16)	16.68
				COSTO DIRECTO	**16.68**

PRECIO UNITARIO **835.20**

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000124

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR CON ROTOMARTILLO, NO INCLUYE EL FIRME, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION

Unidad: M3 **Código:**

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 194.35 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
MAQUINARIA					
MQ	EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO	HORA	0.0690	2817.15	194.35
				SUBTOTAL:	**194.35**
					194.35

PRECIO UNITARIO

UN CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000125

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
Especialidad	OBRA PUBLICA	Clave	2015- 2018
Analista		Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Análisis de precios unitarios

Nombre: PREPARACION DE CAJON PARAN COLOCACION DE BASE Y PAVIMENTO HIDRAULICO, INCLUYE: EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, MANO DE OBRA, AFINE Y COMPACTACION DE LA MISMA CON UNA SECCION PROMEDIO DE 25 CMS.

Unidad: M3 **Código:**

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 52.27 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
MAQUINARIA					
MQ	RETROEXCAVADORA	HORA	0.0734	406	29.78
MQ	MOTOCONFORMADORA	HORA	0.0240	937.00	22.49
				SUBTOTAL:	**52.27**
					52.27

PRECIO UNITARIO

CINCUENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000126

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
		Clave	2015- 2018
Especialidad	OBRA PUBLICA	Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Analista			

Análisis de precios unitarios

Nombre: CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL TIPO I Y II, PRODUCTO DE EXCAVACION, A UN KILOMETRO DE DISTANCIA.

Unidad: M3 **Código:**

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 81.60 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
MAQUINARIA					
MQ	RETROEXCAVADORA	HORA	0.1000	480	48.00
MQ	CAMION VOLTEO	HORA	0.1000	336.00	33.60
				SUBTOTAL:	**81.60**
					81.60

PRECIO UNITARIO

OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000127

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
		Clave	2015- 2018
Especialidad	OBRA PUBLICA	Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Analista			

Análisis de precios unitarios

Nombre: ELABORACION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA) COMPACTADA AL 100% (PROCTOR), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. ESPESOR 20 CMS.

Unidad: M3 **Código:**

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 369.27 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA	AGUA EN PIPA	M3	0.49900	$50.64	25.27
MA	MATERIAL DE BANCO	M3	1.30000	$140.00	182.00
				SUBTOTAL:	**207.27**
Maquinaria					
MQ	MOTOCONFORMADORA	HORA	0.10000	670	67.00
MQ	COMPACTADOR RODILLO METALICO	HORA	0.10000	520.00	52.00
MQ	CAMION VOLTEO	HORA	0.20000	215.00	43.00
				SUBTOTAL:	**162.00**
				TOT. INSUMOS:	***369.27***
Cargos en porcentaje				**Base**	
	% de Herramienta		3.0000%	(0.00)	0.00
				COSTO DIRECTO	**0.00**
					369.27

PRECIO UNITARIO
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS

00000128

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
		Clave	2015- 2018
Especialidad	OBRA PUBLICA	Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Analista			

Análisis de precios unitarios

Nombre: PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8" DE 20 CMS DE ESPESOR; INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRADO DE FRONTERAS.

Unidad: M2 **Código:**

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 1017.28 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA	AGUA EN PIPA	M3	0.20000	$50.64	10.13
MA	CONCRETO PREMEZCLADO	M3	0.20600	$1,943.00	400.26
MA	CURACRETO	LT	0.50000	$74.62	37.31
MA	DESMOLDANTE	KG	0.50000	$160.00	80.00
MA	MOLDE PARA CONCRETO	PZA	0.15000	$499.00	74.85
				SUBTOTAL:	**602.55**
MANO DE OBRA					
MO	PEON	JOR	0.25000	$317.00	79.25
MO	PEON	JOR	0.30000	$317.00	95.10
MO	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.30000	$475.56	142.67
				SUBTOTAL:	**317.02**
Maquinaria					
MQ	VIBRADOR DE CHICOTE	HORA	0.25000	$177.83	44.46
				SUBTOTAL:	**44.46**
BASICOS					
BA	CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN	M2	0.35000	$125.00	43.75
				SUBTOTAL:	**43.75**
Cargos en porcentaje				Base	
	% de Herramienta		3.0000%	(317.02)	9.51
				COSTO DIRECTO	**9.51**
					1017.28

PRECIO UNITARIO
UN MIL DIEZ Y SIETE PESOS 28/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2015-2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

00000129

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
		Clave	2015- 2018
Especialidad	OBRA PUBLICA	Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Analista			

Análisis de precios unitarios

Nombre: CORTE EN LOSAS DE CONCRETO EN PAVIMENTOS DE 8 A 15 CMS DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO
Unidad: M2 **Código:**
Fecha de cot.: **Código de proy.:**
Costo unitario: 38.60 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
MAQUINARIA					
MQ	CORTADORA DE PAVIMENTO	HORA	0.2082000	185.40	38.60
				SUBTOTAL:	**38.60**
	Herramienta		3.0000%	(0.00)	0.00
	Mandos intermedios		10.0000%	(0.00)	0.00
	Consumibles		0.0000%	(0.00)	0.00
	Desperdicios		0.0000%	(0.00)	0.00
	Indirectos de seguros y fianzas		0.0000%	(0.00)	0.00
				SUBTOTAL	**0.00**
					38.60

PRECIO UNITARIO 38.60
TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000130

H.AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

SAYULA

Proyecto	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	Lugar	SAYULA, JALISCO
		Clave	2015- 2018
Especialidad	OBRA PUBLICA	Responsable	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Analista			

Análisis de precios unitarios

Nombre: CALAFATEO DE JUNTA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON SELLADOR DE POLIURETANO. INCLUYE: RAPADO DE POLIURETANO O POLIESTIRENO DE JUNTA DE 0.50 ML PO 2 CMS.

Unidad: ml **Código:**

Fecha de cot.: **Código de proy.:**

Costo unitario: 33.57 **Moneda:** Pesos

Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Materiales					
MA	PASA ROD GRIS 1/4" CARRETE 609.5 M LINEALES	CARRETE	0.00300	$854.70	2.56
MA	SICONETAN CUBETA DE 19 KG	CUBETA	0.00250	$2,832.00	7.08
				SUBTOTAL:	**9.64**
MANO DE OBRA					
MO	PEON	JOR	0.03779	239.2	9.04
MO	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.03779	375.56	14.19
				SUBTOTAL:	**23.23**
Cargos en porcentaje				***Base***	
	% de Herramienta		3.0000%	(23.23)	0.70
				COSTO DIRECTO	**0.70**

PRECIO UNITARIO 33.57

TREINTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000131

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES		MEMORIA No. 1	HOJA 1
OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.		FECHA:	
UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.		PERIODO:	

RED DE DRENAJE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA.	7.95	108.13		860.00	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**860.00**	**M2**	

CROQUIS:

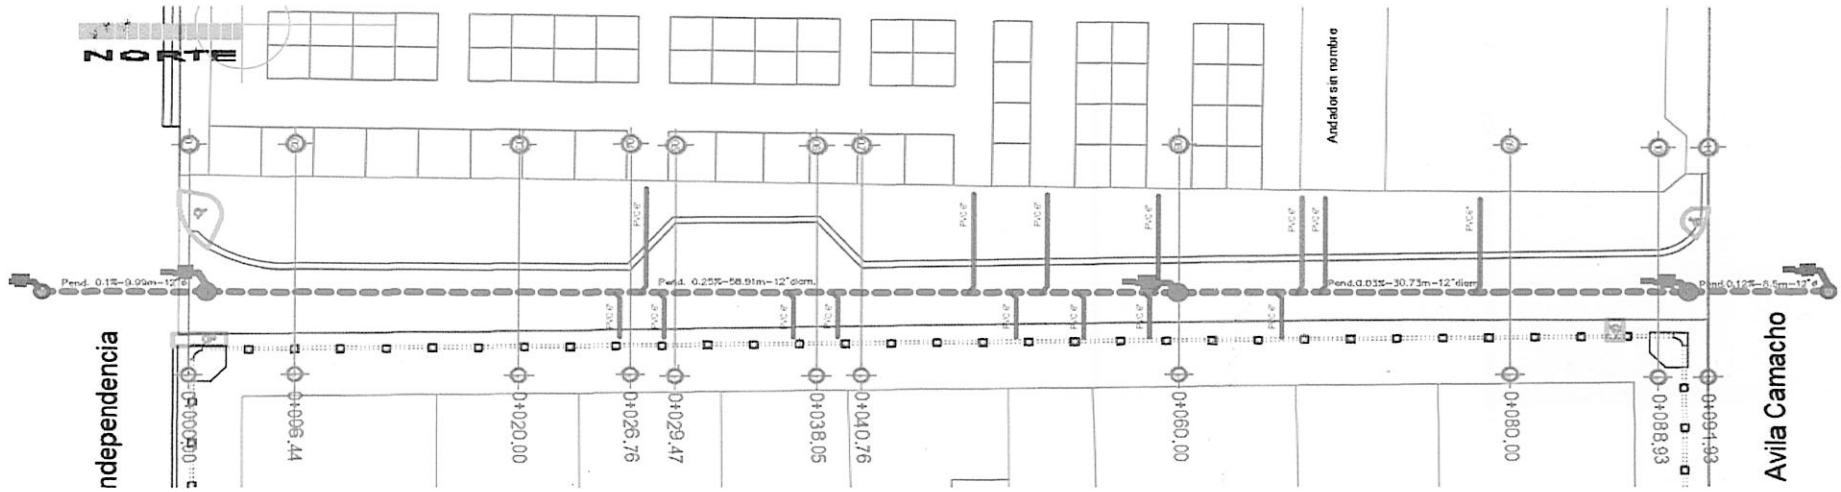

ELABORO	
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES

23100132

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES | MEMORIA No. 1 | HOJA 2

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ. | FECHA:

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO. | PERIODO:

RED DE DRENAJE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
2	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	0.75	108.13	1.50	121.81	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**121.81**	**M3**	

CROQUIS:

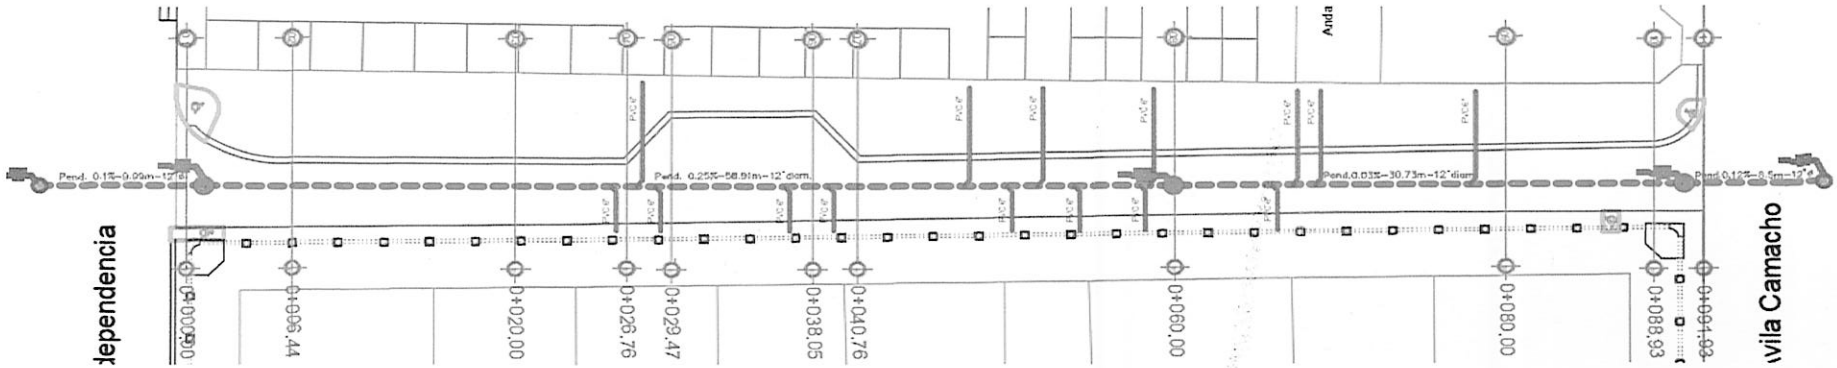

ANCHO EN ZANJAS SEGUN LA PROFUNDIDAD DEL FONDO Y EL DIAMETRO DE LA TUBERIA.

DIAMETRO		PROFUNDIDAD										
CMS	PLGS	HASTA 1.25 M.	DE 1.26 A 1.75 M.	DE 1.76 A 2.25 M.	DE 2.76 A 2.75 M.	DE 2.76 A 3.25 M.	DE 3.25 A 3.75 M.	DE 3.76 A 4.25 M.	DE 4.26 A 4.75 M.	DE 4.76 A 5.25 M.	DE 5.26 A 5.75 M.	DE 5.76 A 6.25 M.
15	6	60	60	65	65	70	70	75	75	75	80	80
20	8	60	60	65	65	70	70	75	75	75	80	80
25	10		70	70	70	70	70	75	75	75	80	80
30	12		75	75	75	75	75	75	75	75	80	80
40	16		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
45	18		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
61	24		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
76	30			155	155	155	155	155	155	155	155	155
91	36			175	175	175	175	175	175	175	175	175
107	42				190	190	190	190	190	190	190	190
122	48				210	210	210	210	210	210	210	210
152	60				245	245	245	245	245	245	245	245
183	72					280	280	280	280	280	280	280
213	84					320	320	320	320	320	320	320
244	96					360	360	360	360	360	360	360

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000133

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1

FECHA:

PERIODO:

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
	RED DE DRENAJE						
3	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA, EN MATERIAL "B" EN SECO.	0.75	108.13		81.10	M2	
			108.13	3.00	324.82	M2	2 LADOS DE 1.50 MTS
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**405.92**	**M2**	

CROQUIS:

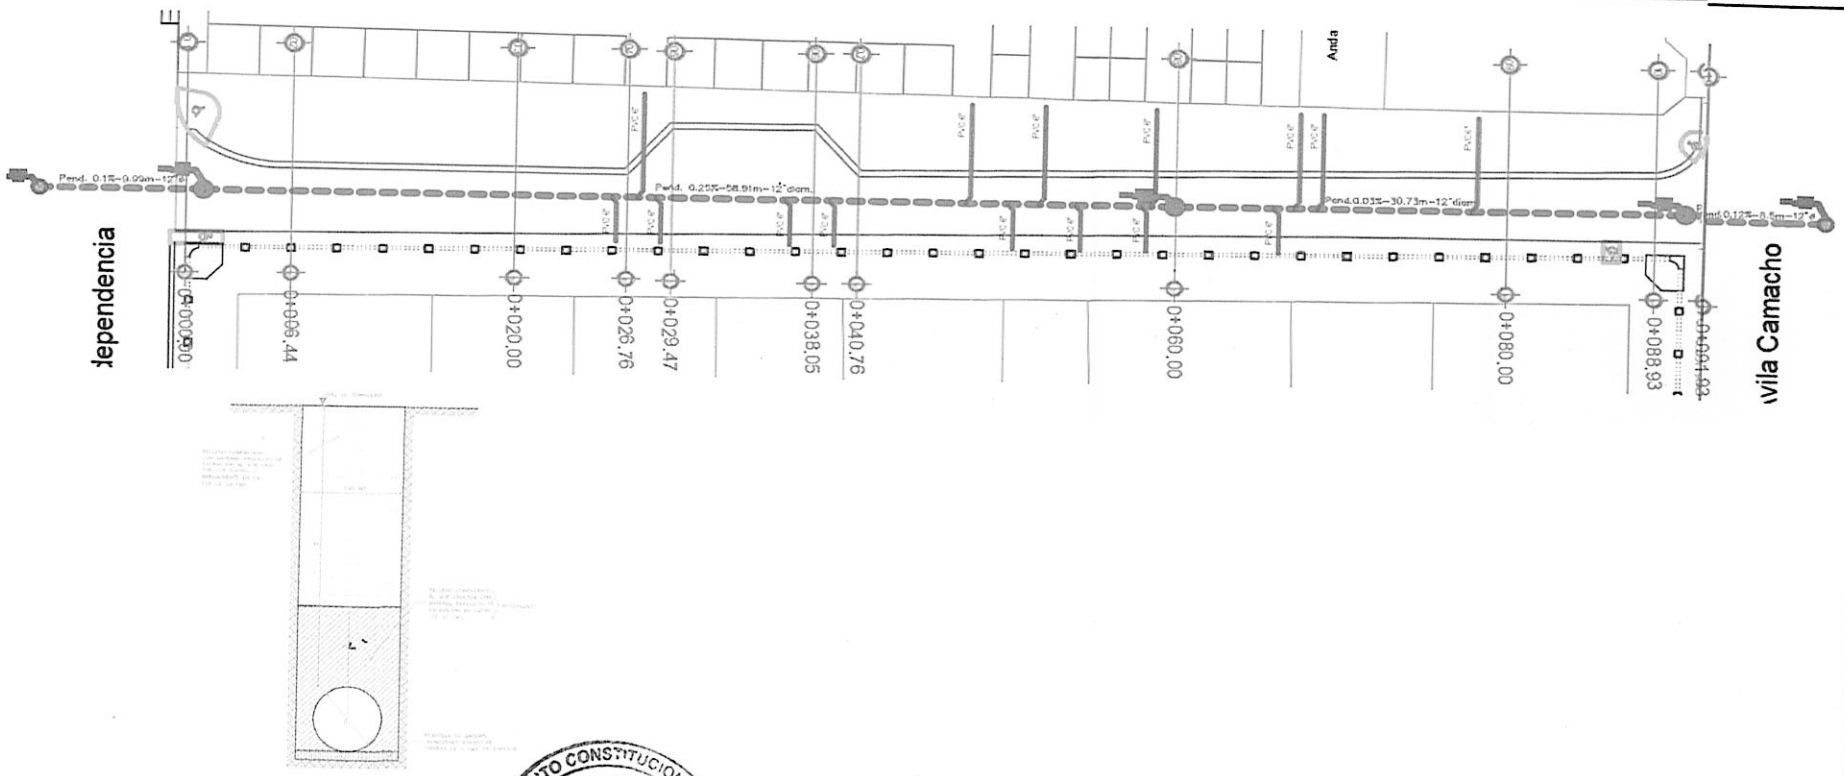

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS MPALES

0000134

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 4

FECHA:

PERIODO:

	RED DE DRENAJE						
N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
4	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA DE P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25 (INCLUYE MATERIAL) ESP=10 CMS.	0.75	108.13	0.10	8.11	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	8.11	M3	

CROQUIS:

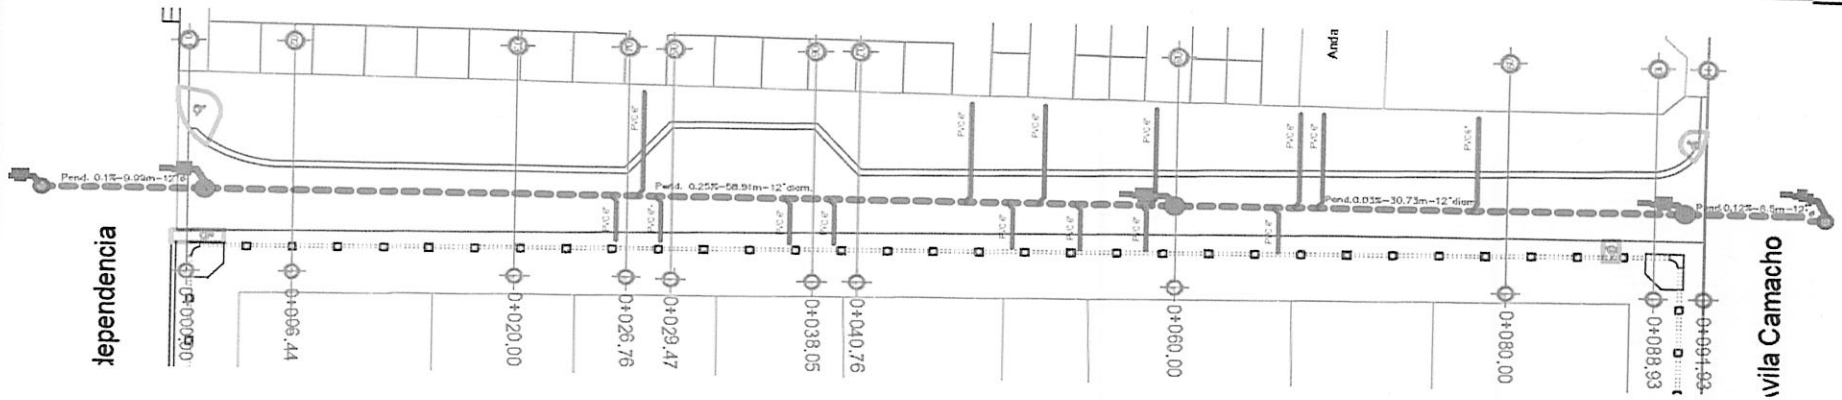

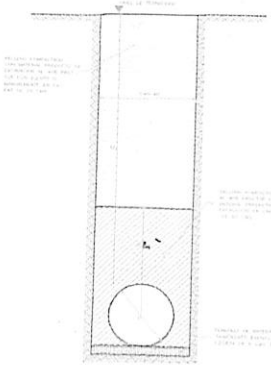

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000135

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 5

FECHA:

PERIODO:

RED DE DRENAJE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. DE 12" DE DIAMETRO SERIE 25, (MARCA REXOLIT) (ALCANTARILLADO)		108.13		108.13	ML	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**108.13**	**ML**	

CROQUIS:

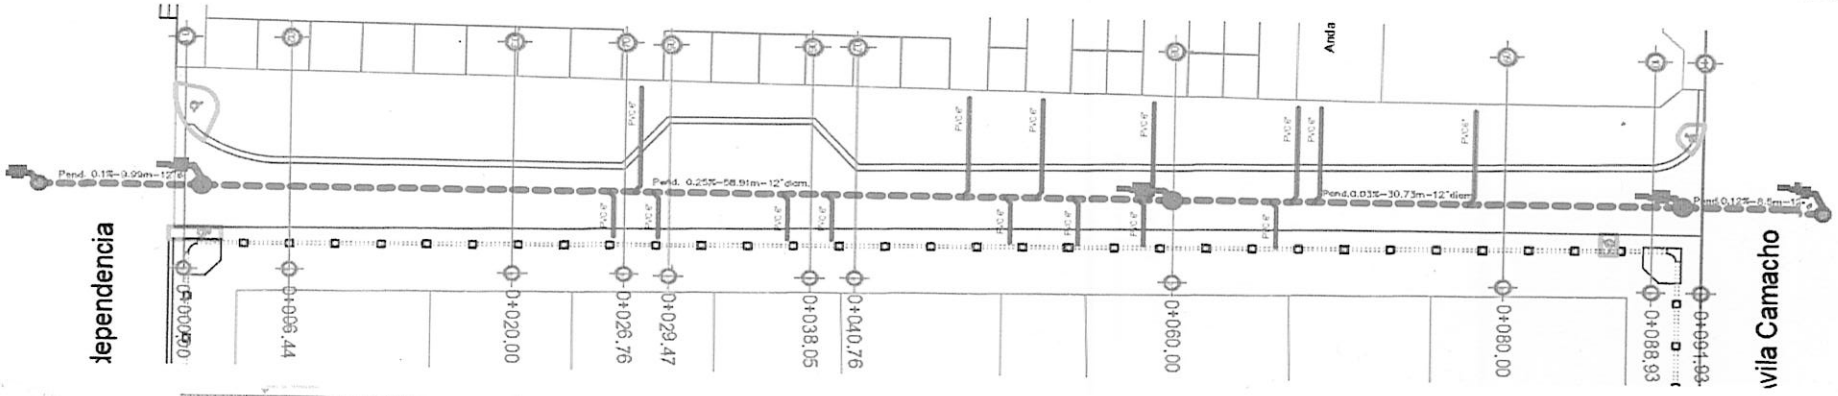

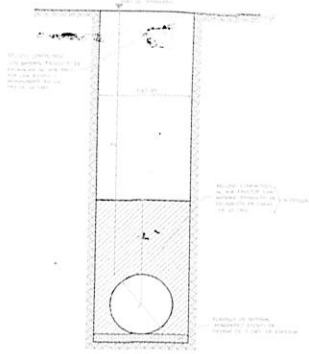

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

00000136

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 6

FECHA:

PERIODO:

RED DE DRENAJE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
6	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE PVC 12" CON MATERIAL DE BANCO (TIERRA AMARILLA)	0.75	108.13	0.45	36.49	M3	
		0.30	108.13		7.64	M3	RESTA M3 DE TUBERIA
				SUBTOTAL	28.85	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**28.85**	**M3**	

$Area = \pi * r^2$



CROQUIS:

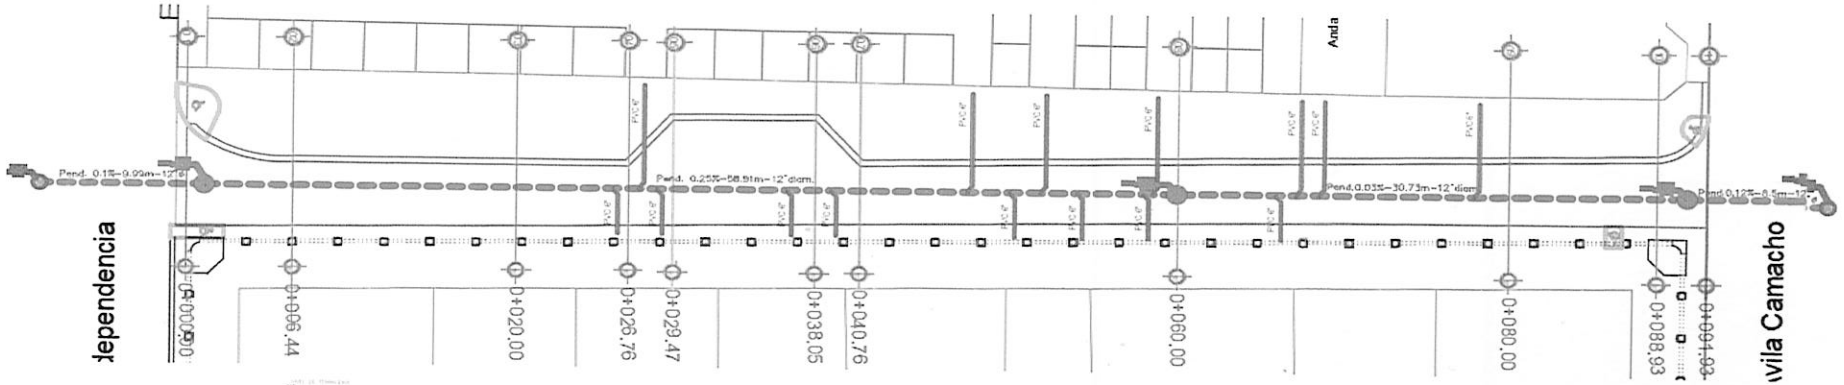



ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAPALPA, JAL.

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 | FECHA: | PERIODO:

	RED DE DRENAJE						
N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	PIEZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
7	DESCARGA ALCANTARILLADO A BASE DE TUBERIA P.V.C. 6" DE DIAM. CON CAMPANA (TUBERIA ALCANTARILLADO DE MORMA MARCA REXOLIT), SILLETA 12"X6"; EMPAQUE DE 6", CODO DE 6"X90º; PEGAMENTO P.V.C. Y LIJA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION.			15.00	15.00	PZA	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	15.00	PZA	

CROQUIS:

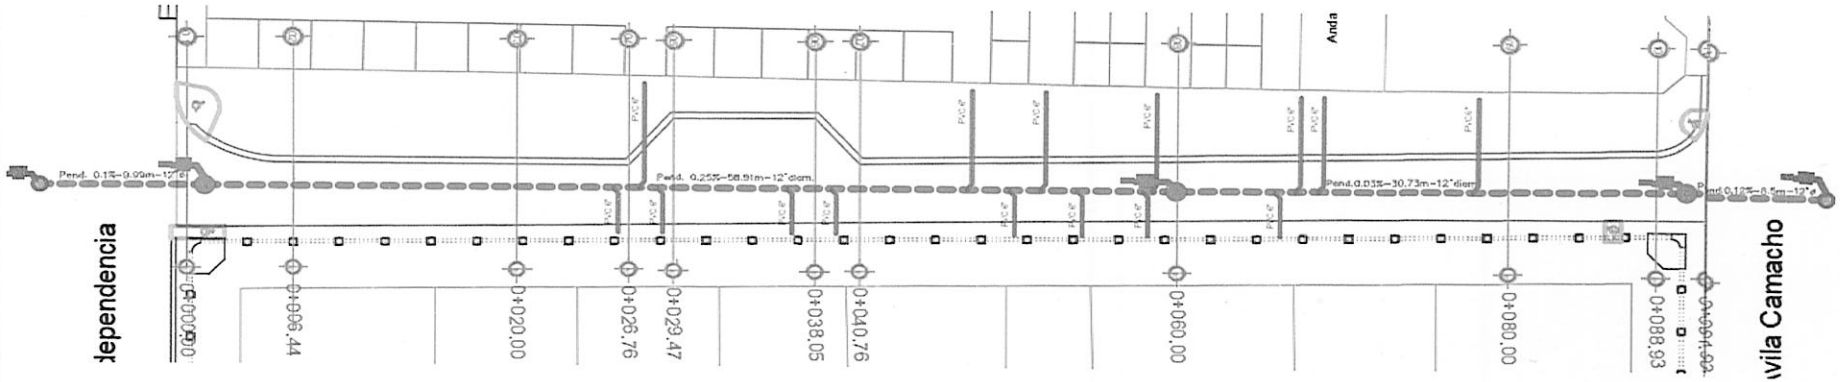



DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO. (CORTE)

DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO (VISTA EN PLANTA)

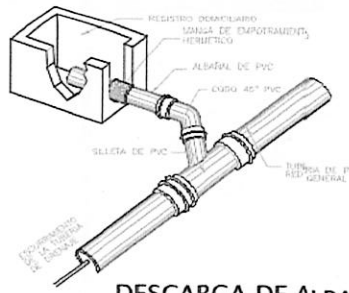

DESCARGA DE ALBAÑAL

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAYULA, JAL. 2018-2021 OBRAS PUBLICAS

00000138

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 8

FECHA:

PERIODO:

	RED DE DRENAJE						
N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	PZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
8	REGISTRO SANITARIO DE 60X60X100 CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO PULIDO. INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO.	0.60	0.60	15.00	15.00	PZA	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	15.00	PZA	

CROQUIS:

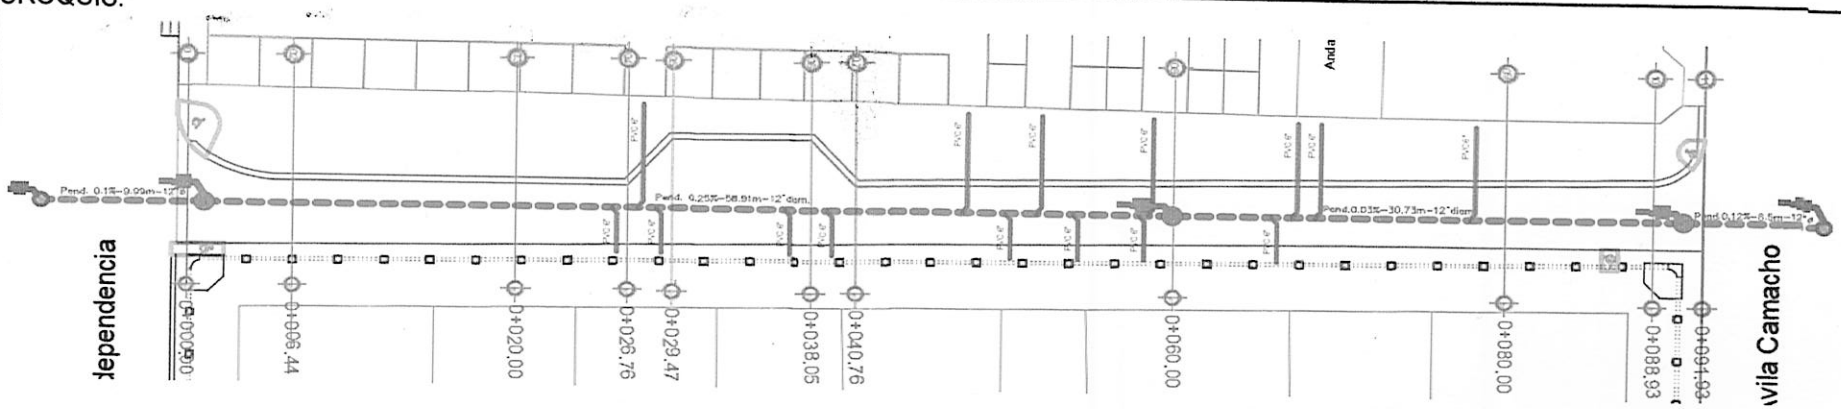



DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO. (CORTE)

DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO (VISTA EN PLANTA)

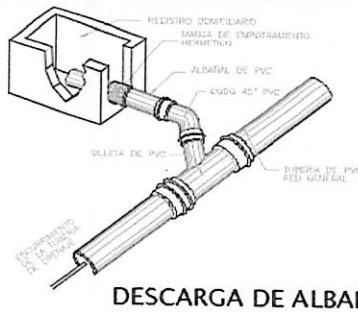

DESCARGA DE ALBAÑAL

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES

0000139

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

MEMORIA No. 1

HOJA 9

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

FECHA:

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

PERIODO:

RED DE DRENAJE

N°	CONCEPTO:	BASE	ALTO	PZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
9	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 MTS. DEPROF. PARA TUBERIA DE 12" DE DIAM. INCLUYE: EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL.	0.75	1.50	3.00	3.00	PZA	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**3.00**	**PZA**	

CROQUIS:

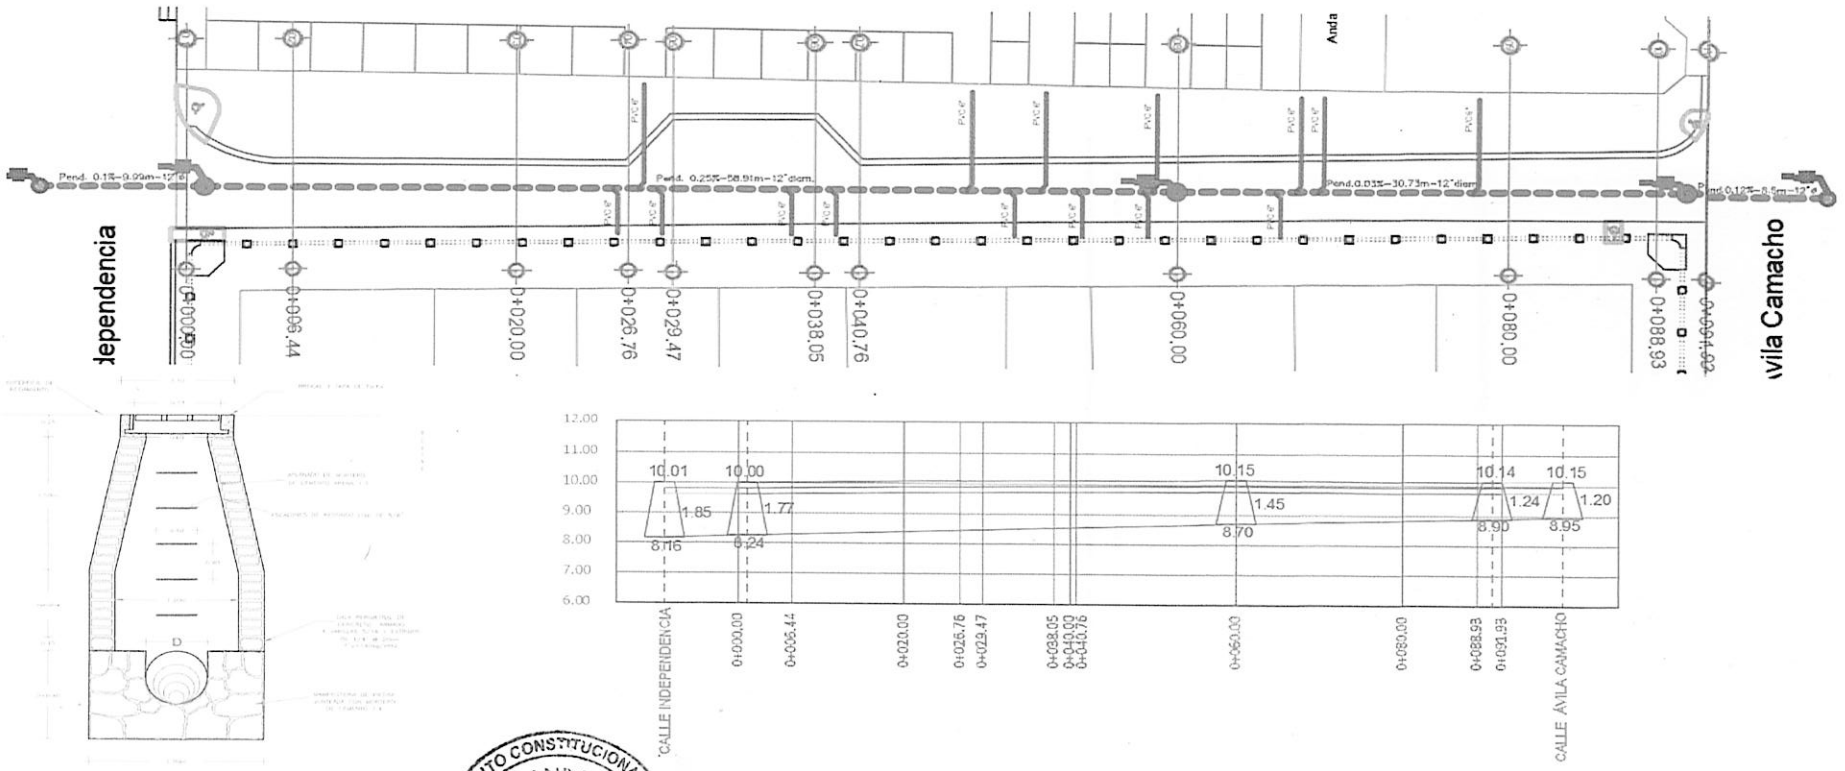

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMPICO, TAM. 2016-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS MPALES

0000170

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

MEMORIA No. 1 HOJA 10

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

FECHA:

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

PERIODO:

RED DE DRENAJE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
10	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	0.75	108.13	0.95	77.20	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**77.20**	**M3**	

CROQUIS:

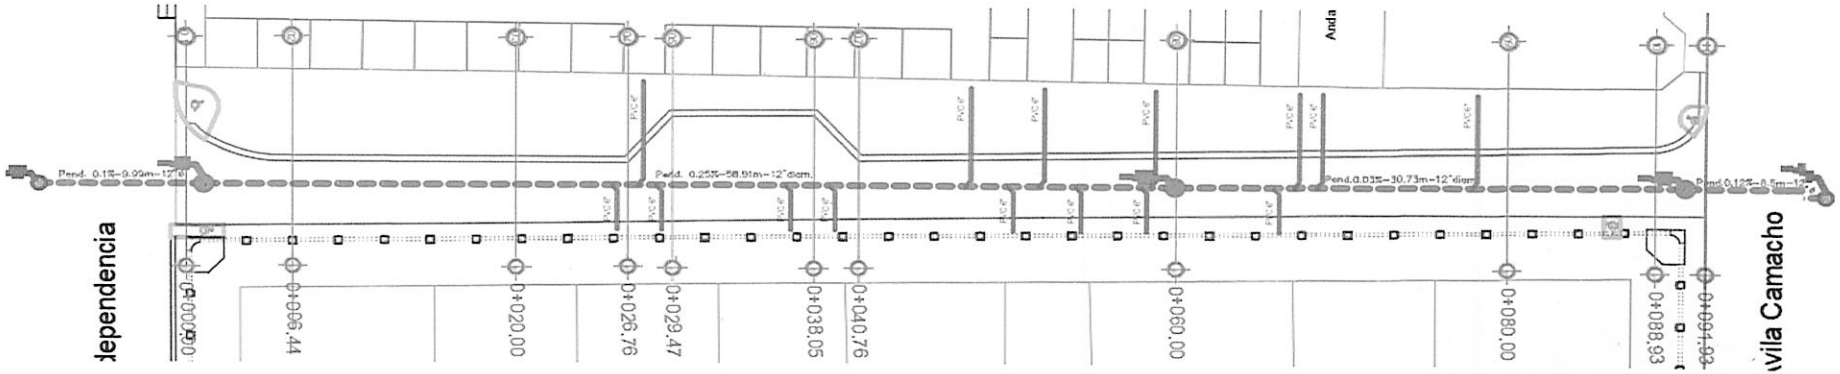

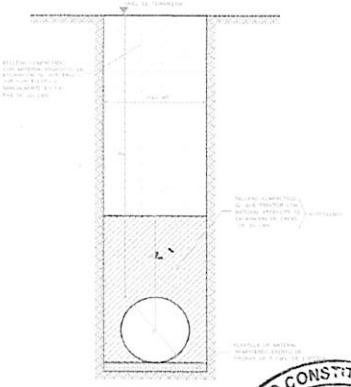

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHUIA, N.L. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS

1710000

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1

FECHA:

PERIODO:

	RED DE DRENAJE						
N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
11	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA. AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.	0.75	108.13	0.55	44.60	M3	
				SUBTOTAL	44.60	M3	
				30% ABUNDAMIENTO	13.38	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**57.98**	**M3**	

CROQUIS:

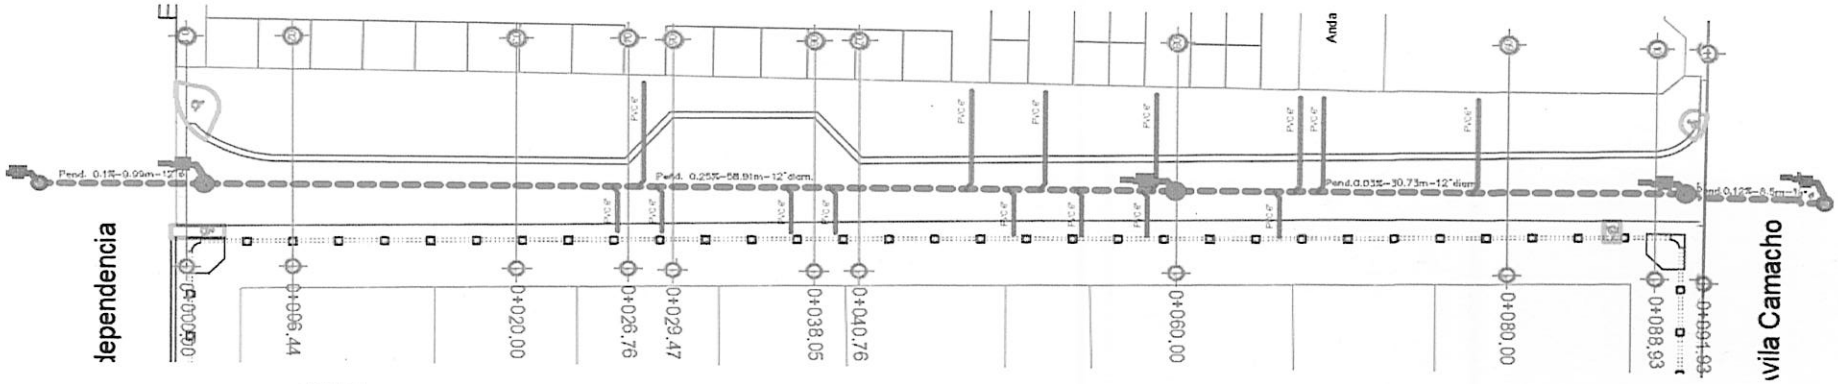

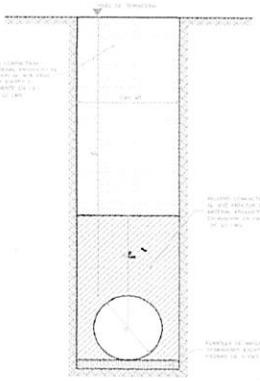

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000142

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 12

FECHA:

PERIODO:

RED DE DRENAJE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
12	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM. APROX.)	0.75	108.13	0.55	44.60	M3	
				SUBTOTAL	44.60	M3	
				30% ABUNDAMIENTO	13.38	M3	
				KMS	7.00		
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**405.89**	**M3**	

CROQUIS:

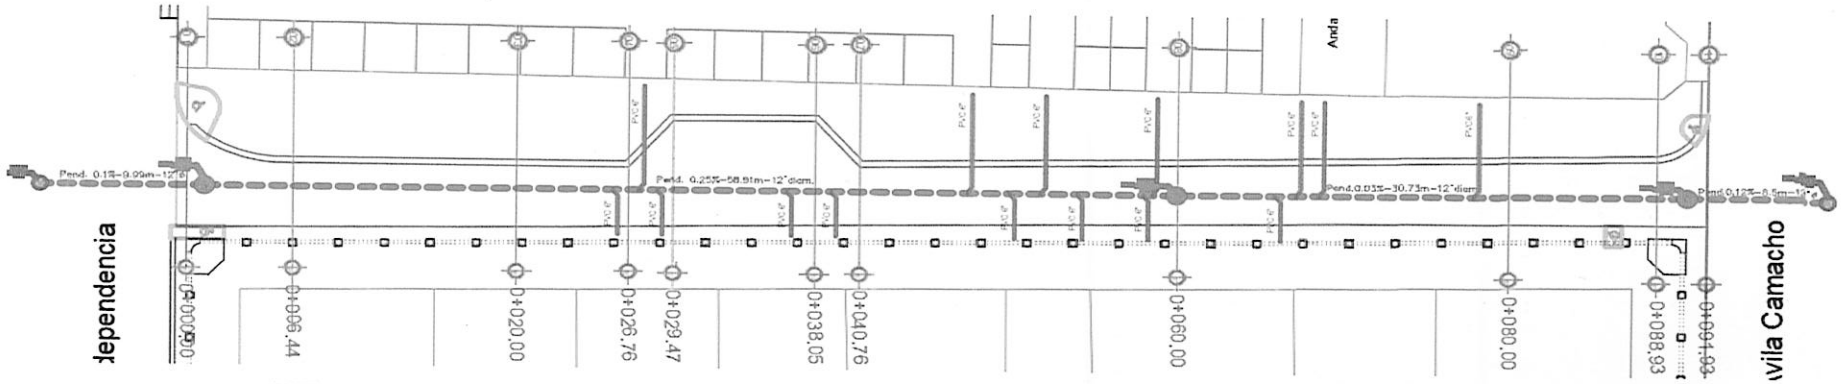

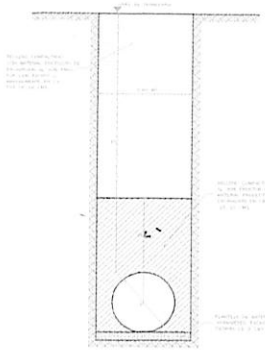

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000173

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES | MEMORIA No. 1 | HOJA 13

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ. | FECHA:

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO. | PERIODO:

RED DE DRENAJE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
13	LIM-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	7.95	108.13		860.00	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**860.00**	**M2**	

CROQUIS:

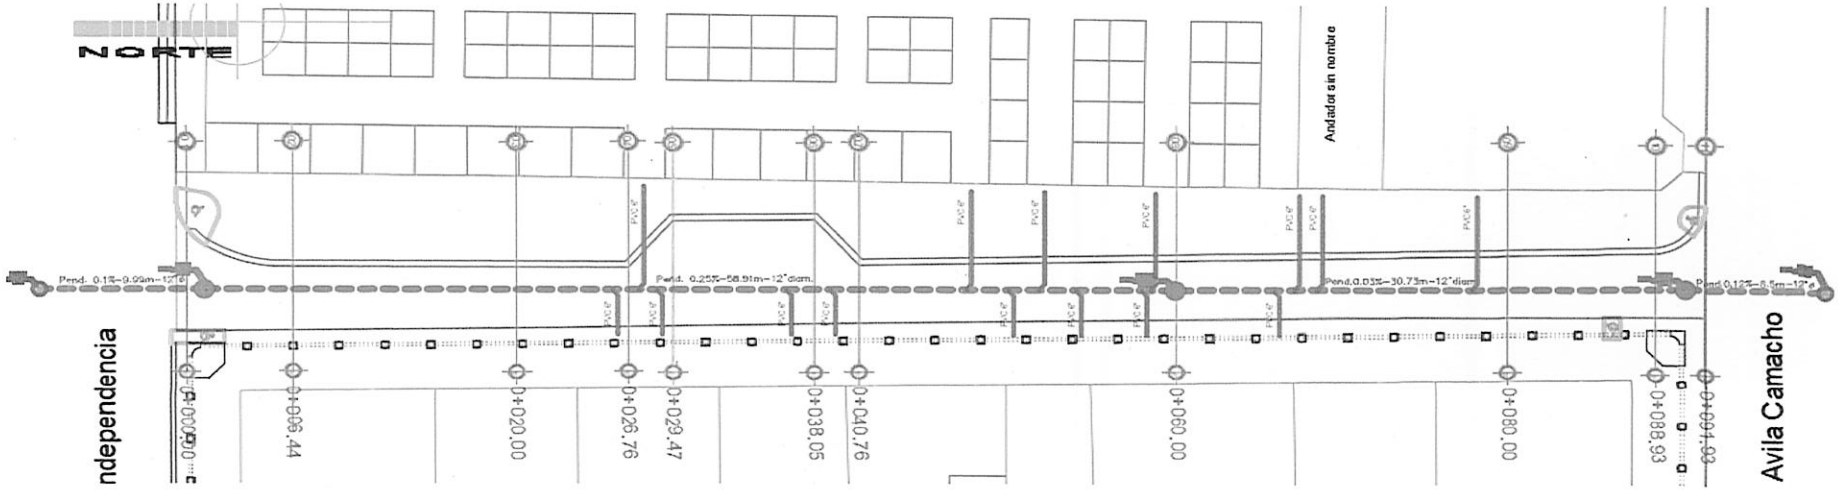

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00007747

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 14

FECHA:

PERIODO:

RED DE AGUA POTABLE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
14	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES DE CALLES Y REDES DE TUBERIA.	7.95	95.63		760.58	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**760.58**	**M2**	

CROQUIS:

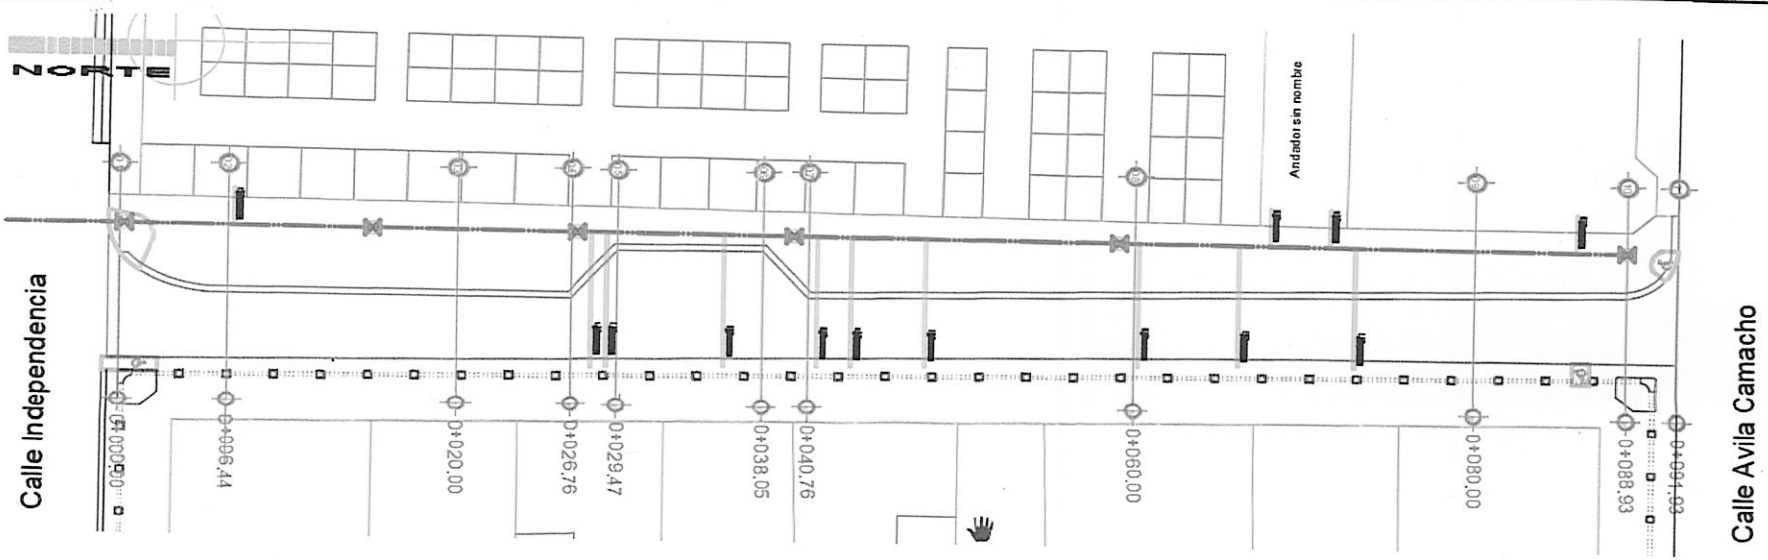

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00001475

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJ. A 15

FECHA:

PERIODO:

RED DE AGUA POTABLE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
15	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	0.60	95.63	1.00	57.38	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**57.38**	**M3**	

CROQUIS:

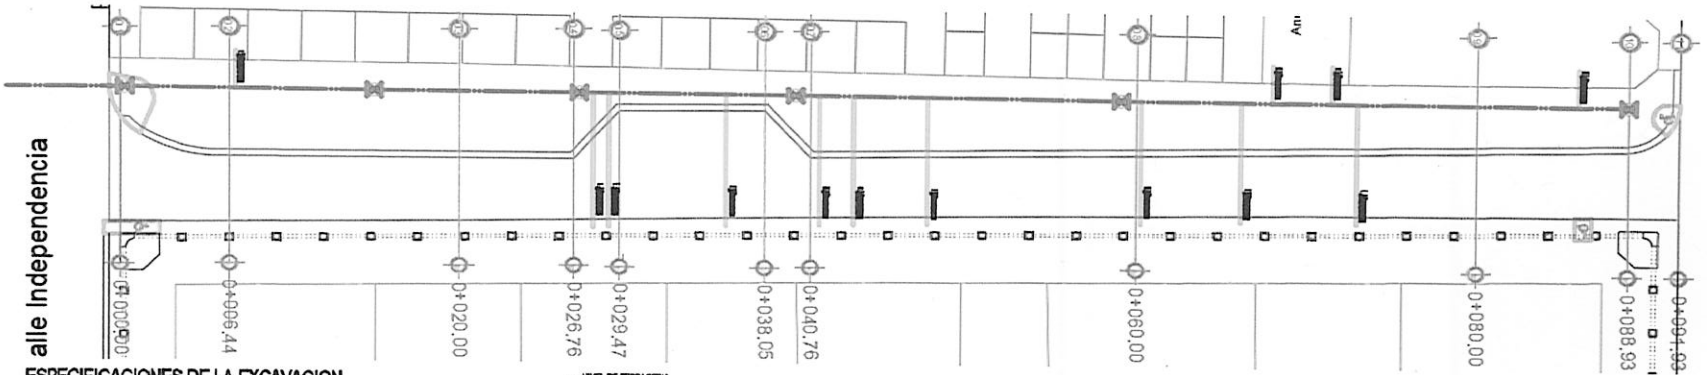

ESPECIFICACIONES DE LA EXCAVACION

DIAMETRO NOMINAL		ANCHO
milimetros	pulgdas	en cms.
25.4	1	50
50.8	2	55
63.5	25	60
76.2	3	60
101.6	4	60
152.4	6	70
203.2	8	75
254.0	10	80
304.8	12	85
355.6	14	90
406.4	16	100
457.2	18	115
508.0	20	120
609.6	24	130

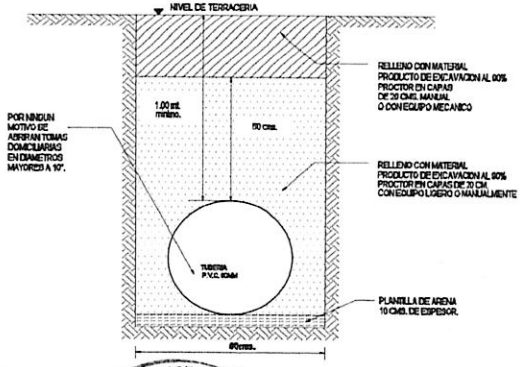

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTILLO, COAHUILA, 2009-2011
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES

97100000

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 16

FECHA:

PERIODO:

RED DE AGUA POTABLE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
16	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO CUANDO LA EXCAVACION SE REALIZA A MAQUINA, EN MATERIAL "B" EN SECO.	0.60	95.63		57.38	M2	FONDO
			95.63	2.00	191.26	M2	2 LADOS DE 1.00 MTS
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**248.64**	**M2**	

CROQUIS:

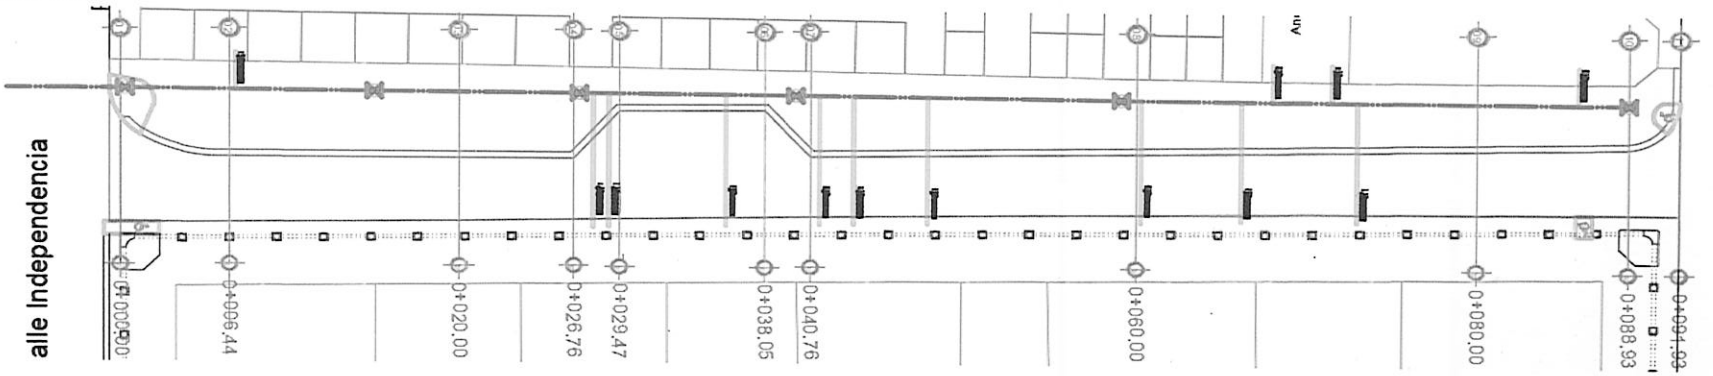

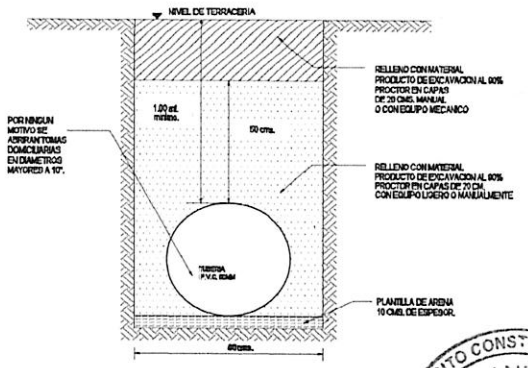

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES

2170000030

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 17

FECHA:

PERIODO:

RED DE AGUA POTABLE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
17	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR TUBERIA DE CONCRETO (INCLUYE MATERIAL) ESP=10 CMS.	0.60	95.63	0.10	5.74	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**5.74**	**M3**	

CROQUIS:

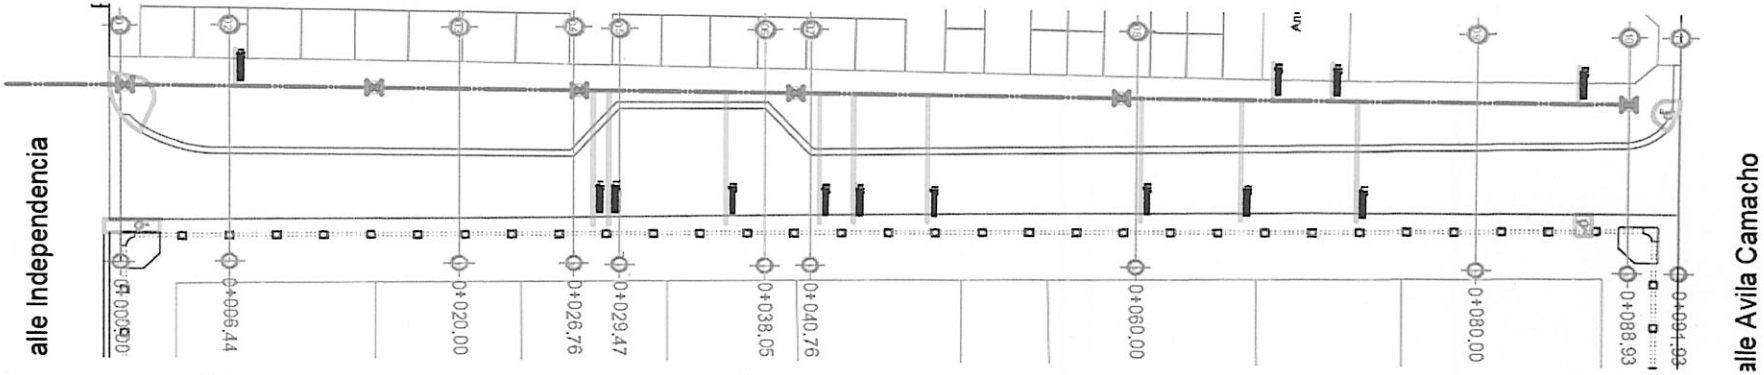

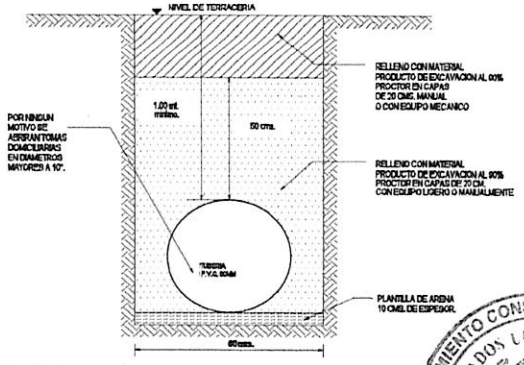

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYUTLA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS 2018-2021

87166000

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

MEMORIA No. 1 HOJ. A 18

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

FECHA:

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

PERIODO:

RED DE AGUA POTABLE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO RD=26 (LINEA DE AGUA POTABLE)		95.63		95.63	ML	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**95.63**	**ML**	

CROQUIS:

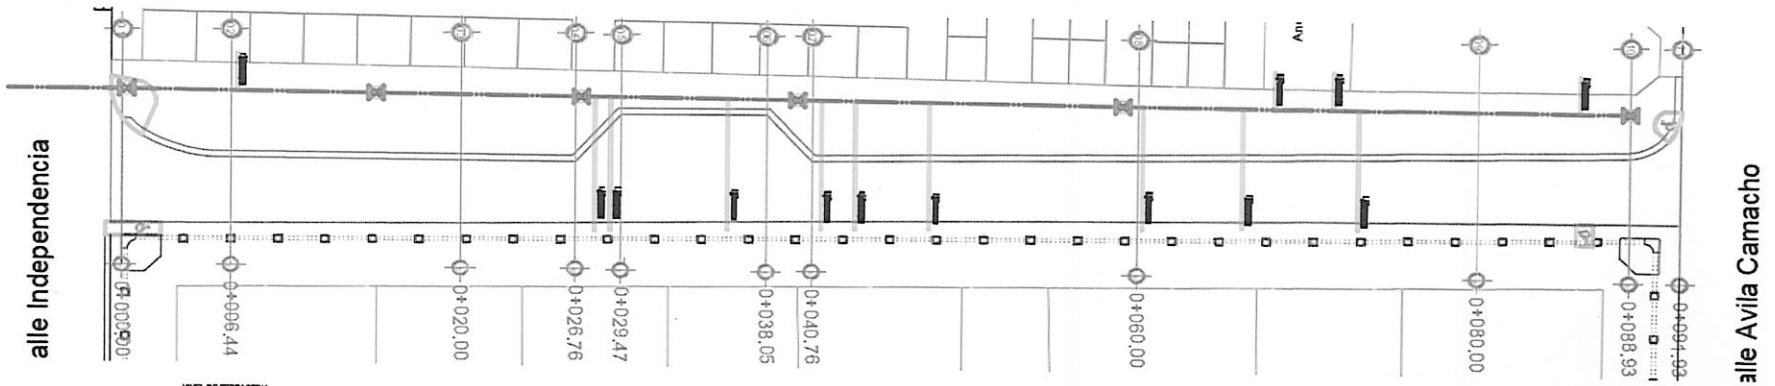

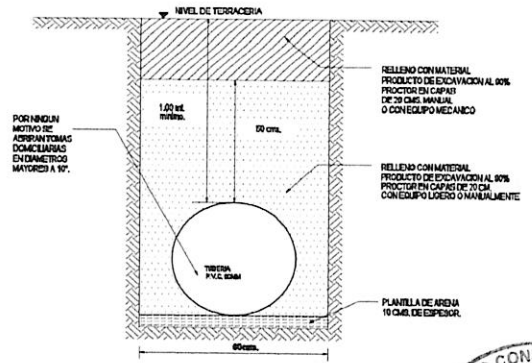

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

67166000

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 1

FECHA:

PERIODO:

RED DE AGUA POTABLE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	PIEZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
19	CAJA PARA VALVULAS TIPO1-1-A INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, PLANTILLA PIEDRA BRAZA, PISO DE CONCRETO SIMPLE, MURO DE TEZON A BASE DE BLOCK DE CEMENTO CADENA DE REPARTICION, APLANADO EN MUROS, LOSA DE CONCRETO REFORZADO, CONTRA MARCO SENCILLO DE 4" X 1.40 ML. (CENTRADO), TAPA DE FOFO C/MARCO METALICO DE 50 X 50 CMS. TIPO STANDART, RELLENO Y COMPACTACION C/MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA.			6.00	6.00	PZA	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**6.00**	**PZA**	

CROQUIS:

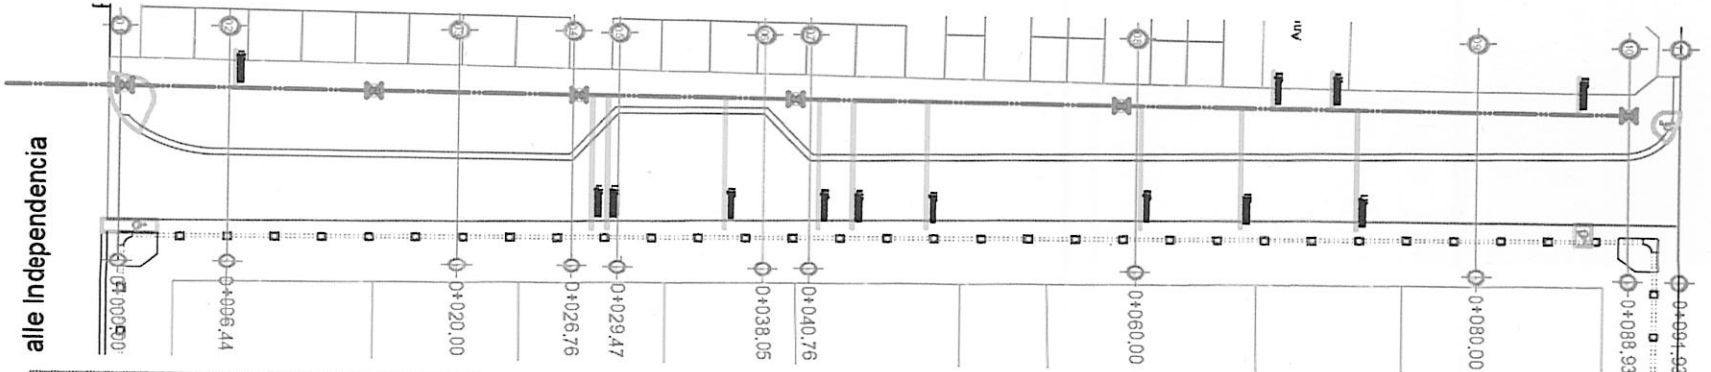

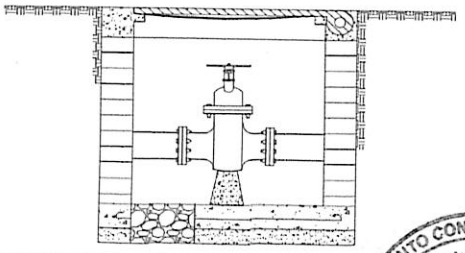

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHUA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 20

FECHA:

PERIODO:

RED DE AGUA POTABLE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	PIEZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
20	TOMA DOMICILIARIA DE (3 MTS.) CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE DE 1/2" DE DIAM. INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. DE 2 1/2" DE DIAM., TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, TENDIDO DE MANGUERA RD 8 1/2" DE DIAM., TERRAPLEN Y COMPACTACION.	0.13	3.00	13.00	13.00	PZA	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	13.00	PZA	

CROQUIS:

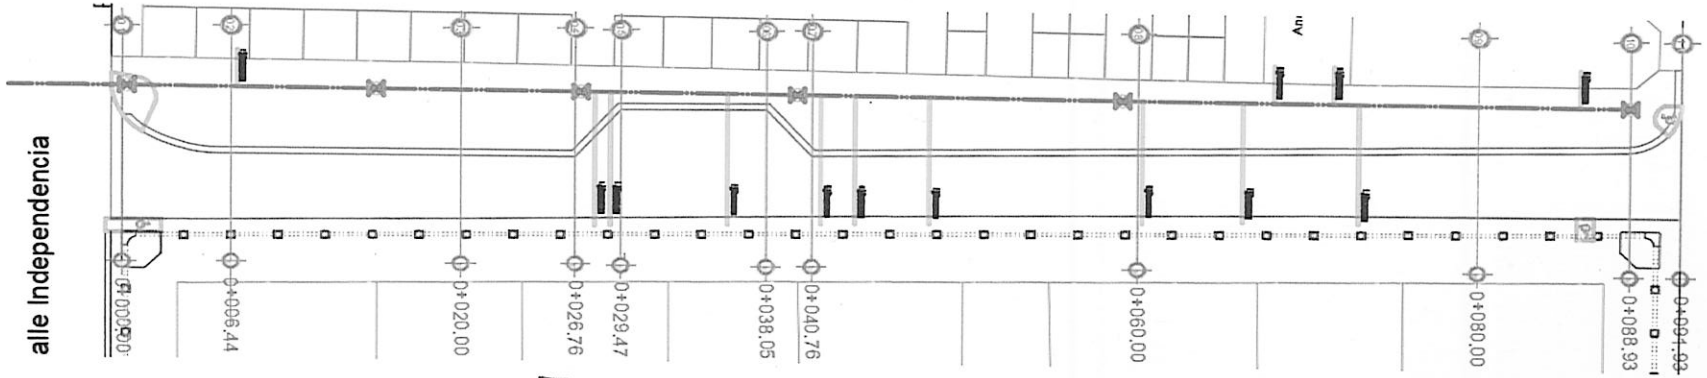

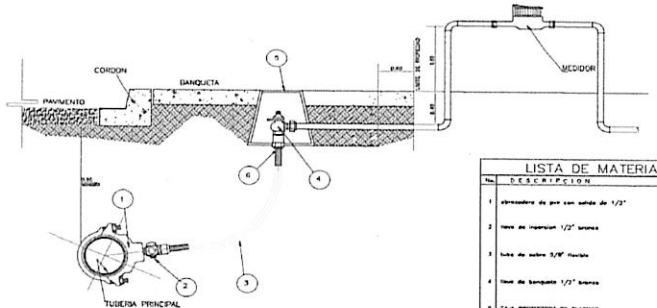

LISTA DE MATERIALES

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
1	abrazadera de pvc con sello de 1/2"	1	PZA.
2	llave de inserción 1/2" bronce	1	PZA.
3	tubo de cobre 1/8" flexible	VAR.	M.L.
4	llave de banqueta 1/2" bronce	1	PZA.
5	CAJA PROTECTORA DE PLASTICO	1	PZA.
6	CONECTORES	1	PZA.

UBICACION PROPUESTA: LA TOMA DEBERA QUEDAR A 1.00 mts. DEL LIMITE DE PROPIEDAD DEL LOTE CONTIGUO DONDE NO EXISTA ENTRADA DE VEHICULOS.

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

00000151

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 21

FECHA:

PERIODO:

RED DE AGUA POTABLE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
21	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON HUMEDAD OPTIMA Y PIZON DE MANO.	0.60	95.63	0.90	51.64	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	51.64	M3	

CROQUIS:

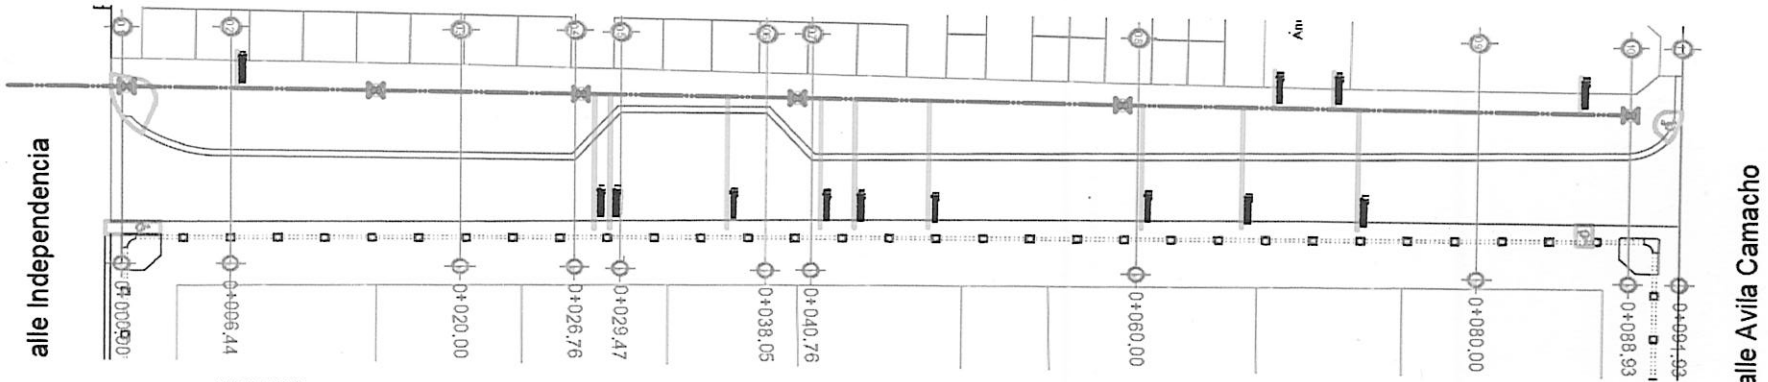

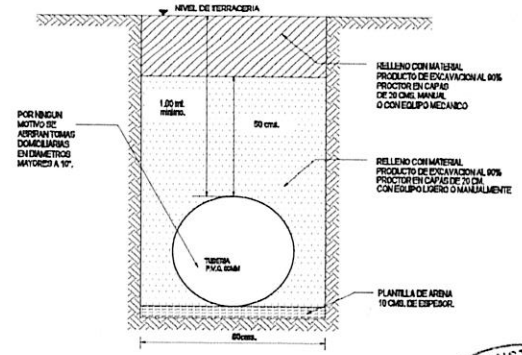

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA DE ALEMAN, VER. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 OBRAS PUBLICAS

0000152

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1

FECHA:

PERIODO:

RED DE AGUA POTABLE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
22	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO O DE PLATAFORMA. AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA. INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.	0.60	95.63	0.10	5.74	M3	
				SUBTOTAL	5.74	M3	
				30% ABUNDAMIENTO	1.72	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**7.46**	**M3**	

CROQUIS:

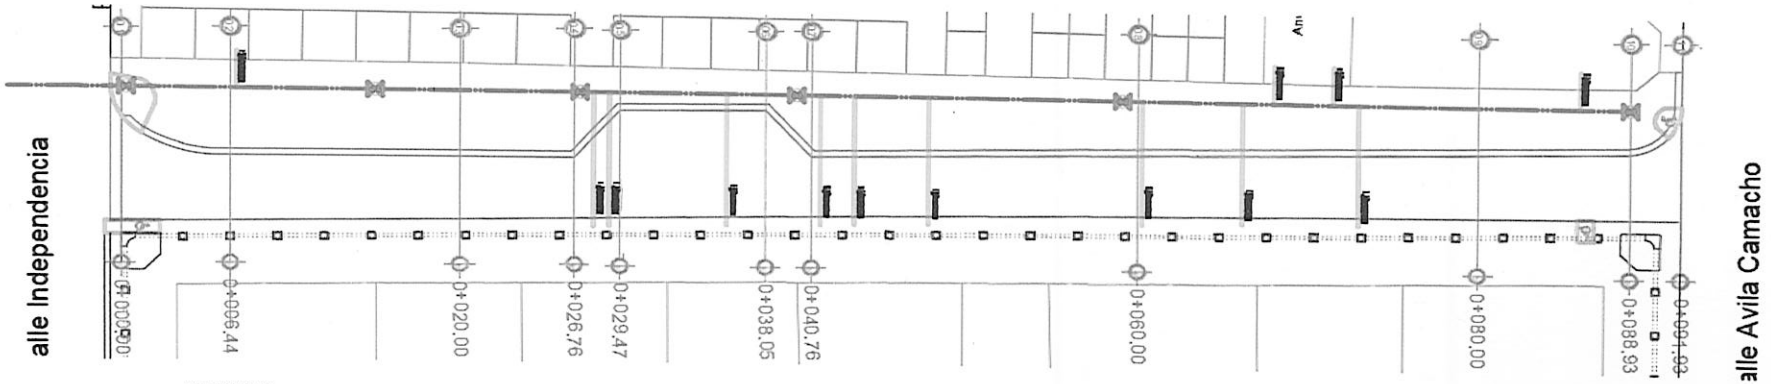

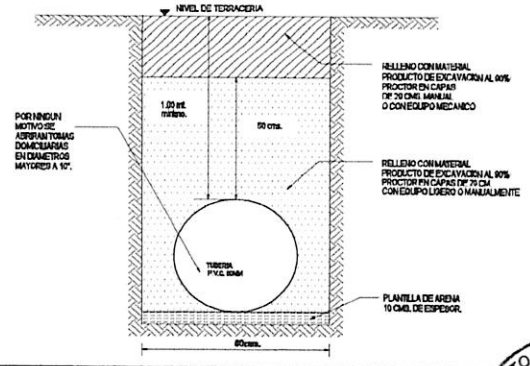

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

00000153

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 23

FECHA:

PERIODO:

RED DE AGUA POTABLE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
23	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM. APROX.)	0.60	95.63	0.10	5.74	M3	
				SUBTOTAL	5.74	M3	
				30% ABUNDAMIENTO	1.72	M3	
				KMS	7.00		
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**52.21**	**M3**	

CROQUIS:

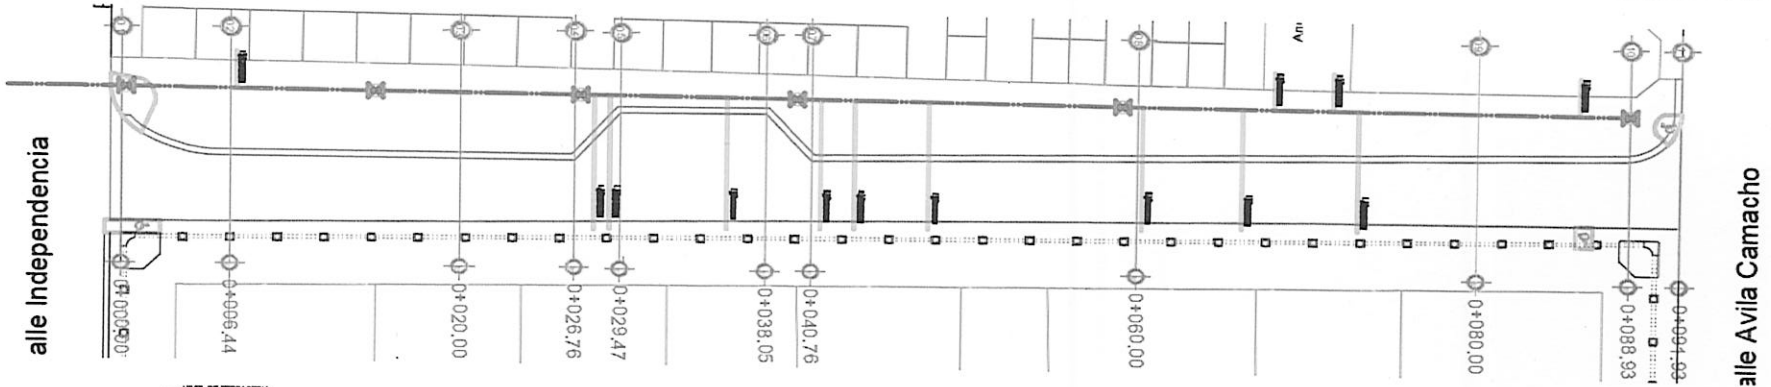

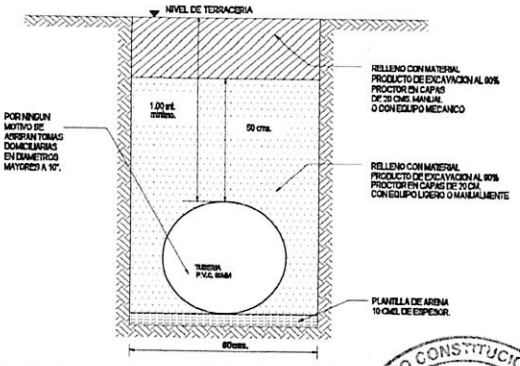

ELABORO:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. OBRAS PUBLICAS 2018-2021

00000154

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1

FECHA:

PERIODO:

RED DE AGUA POTABLE

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
24	LIM-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA	7.95	95.63		760.58	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**760.58**	**M2**	

CROQUIS:

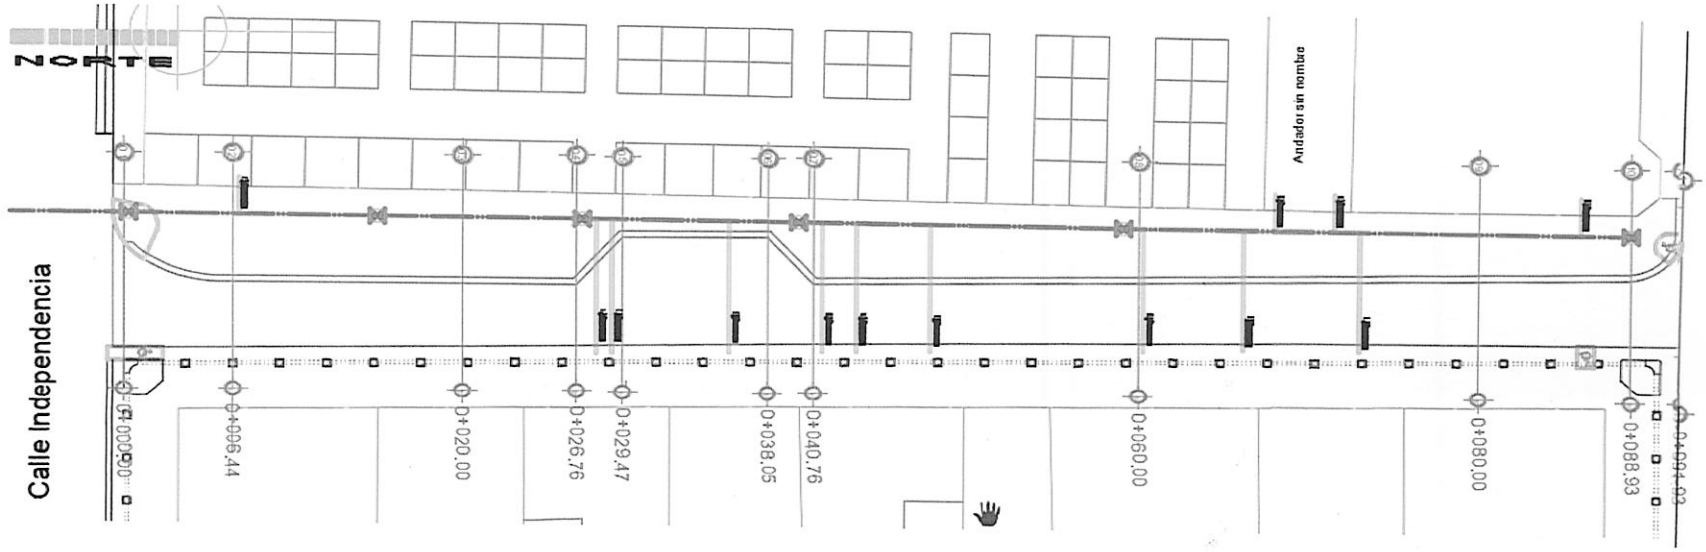

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000155

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1

FECHA:

PERIODO:

MACHUELOS Y BANQUETAS

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
26	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO Y/O BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR,NO INCLUYE EL FIRME, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	1.54	91.93		141.79	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**141.79**	**M2**	

CROQUIS:

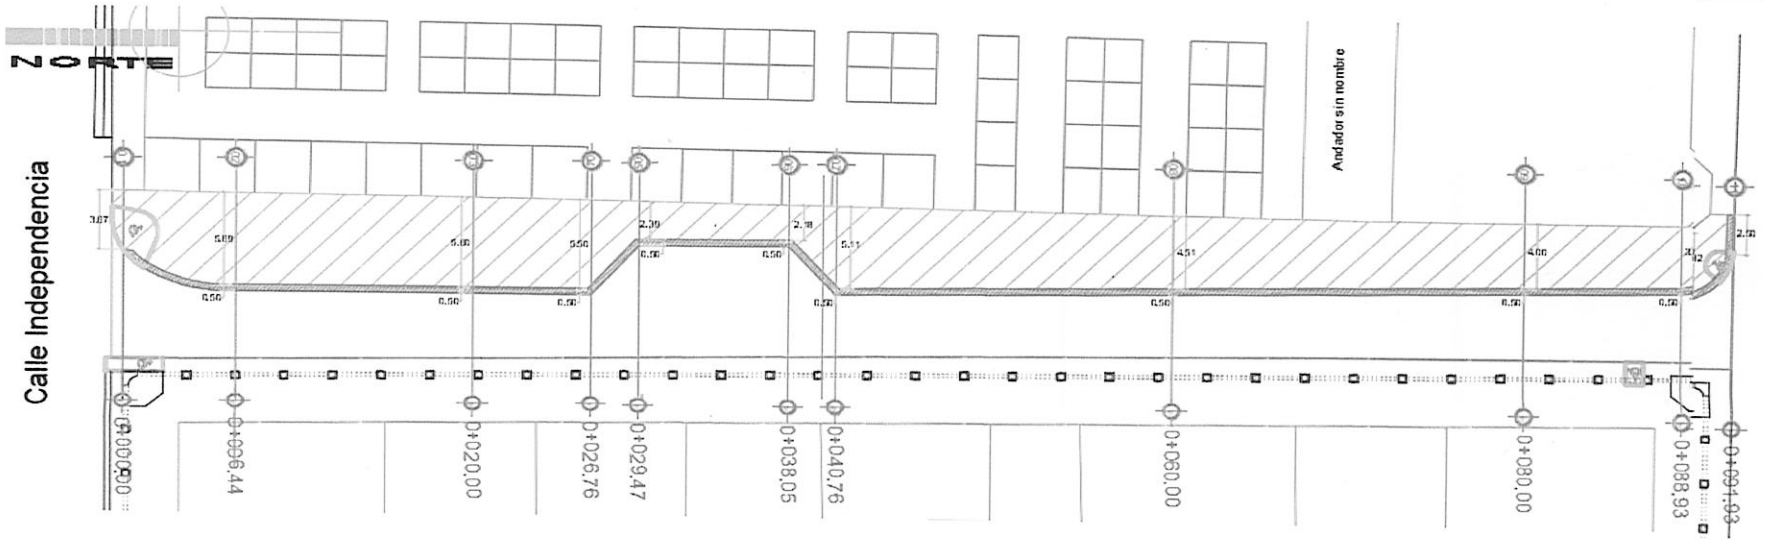

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

00000156

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1

FECHA:

PERIODO:

MACHUELOS Y BANQUETAS

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
25	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRÁNSITO Y NIVEL.	4.12	99.39		409.52	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	409.52	M2	

CROQUIS:

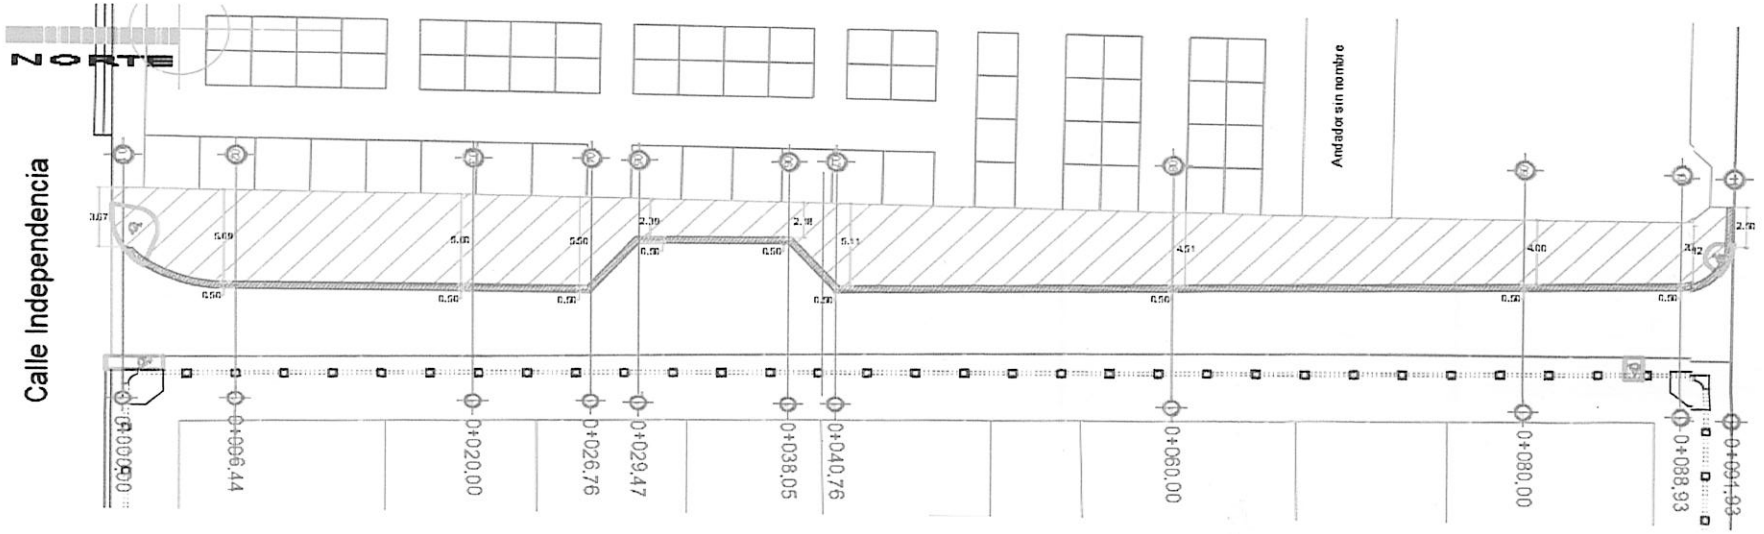

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00001357

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1

FECHA:

PERIODO:

MACHUELOS Y BANQUETAS

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
27	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO "C" (TEPETATE) EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROF.	0.60	99.39	0.50	29.82	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	29.82	M3	

CROQUIS:

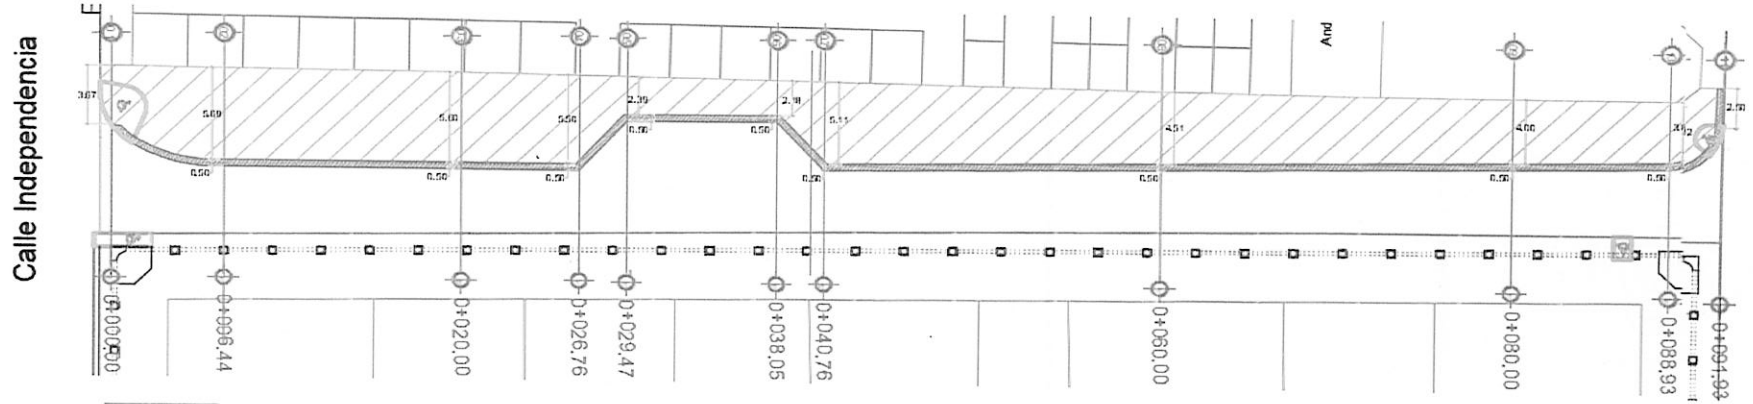

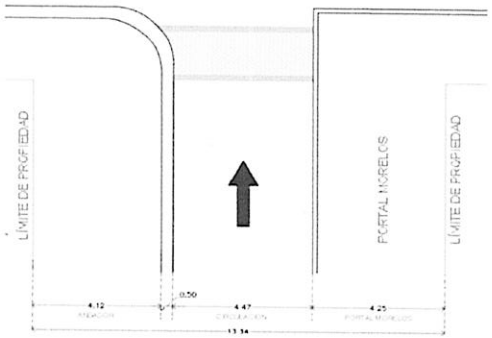

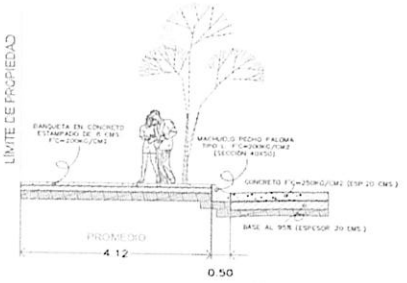

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES

00000156

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 28

FECHA:

PERIODO:

MACHUELOS Y BANQUETAS

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
28	MACHUELO DE CONCRETO TIPO L, PECHO PALOMA HECHO EN OBRA DE F´C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 40 X 50 CMS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN.	0.15	99.39	0.30	99.39	ML	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	99.39	ML	

CROQUIS:

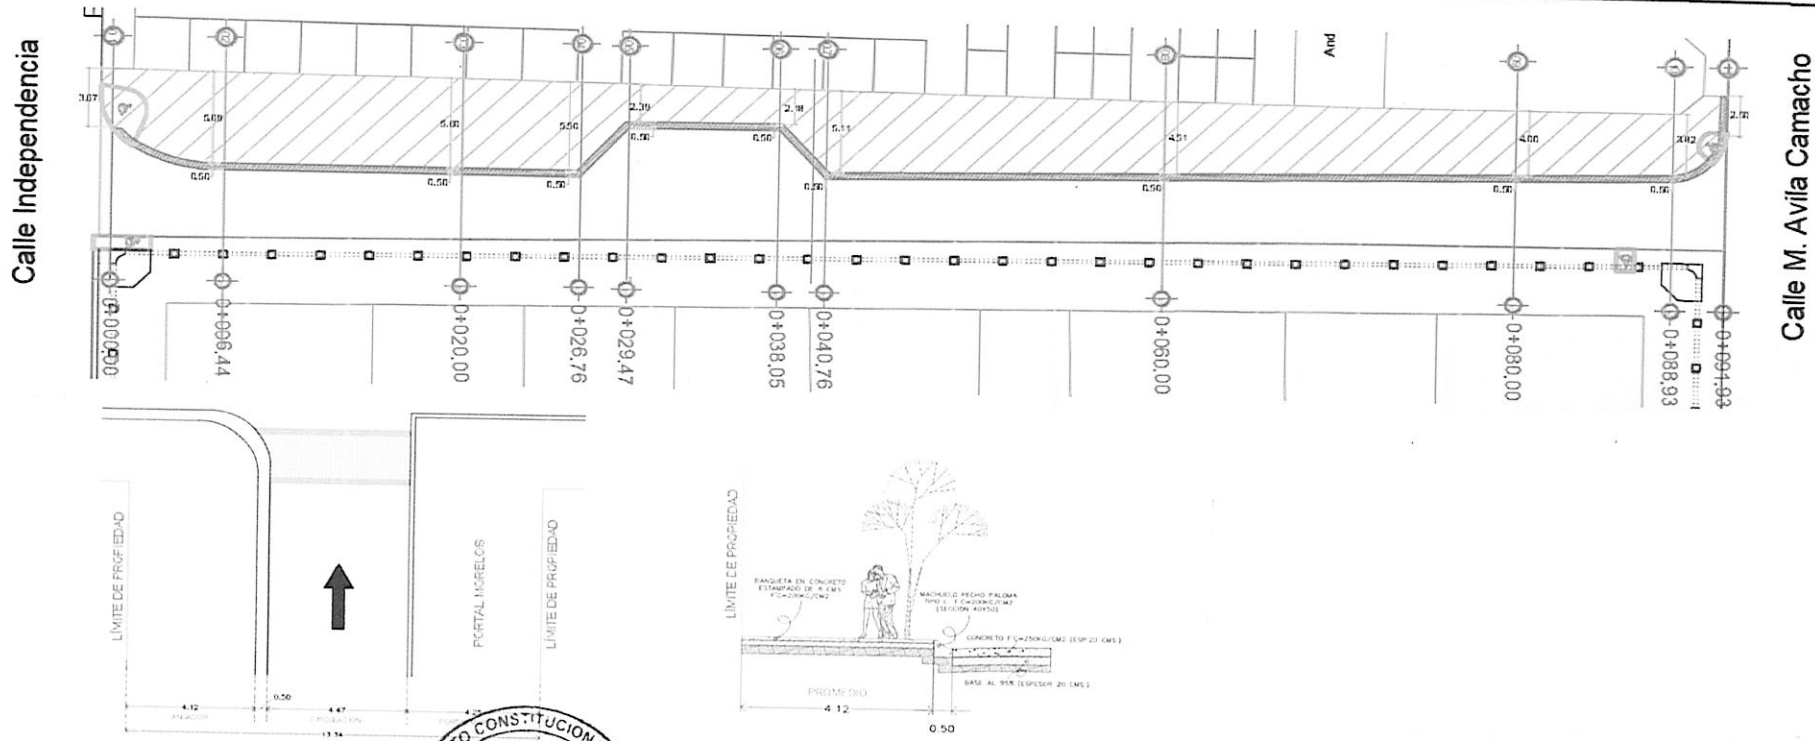

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAULIPAS

00000159

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 2

FECHA:

PERIODO:

MACHUELOS Y BANQUETAS

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
29	MACHUELO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C= 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 35 X 10 CMS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN.	0.10	91.93	0.35	91.93	ML	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	91.93	ML	

CROQUIS:

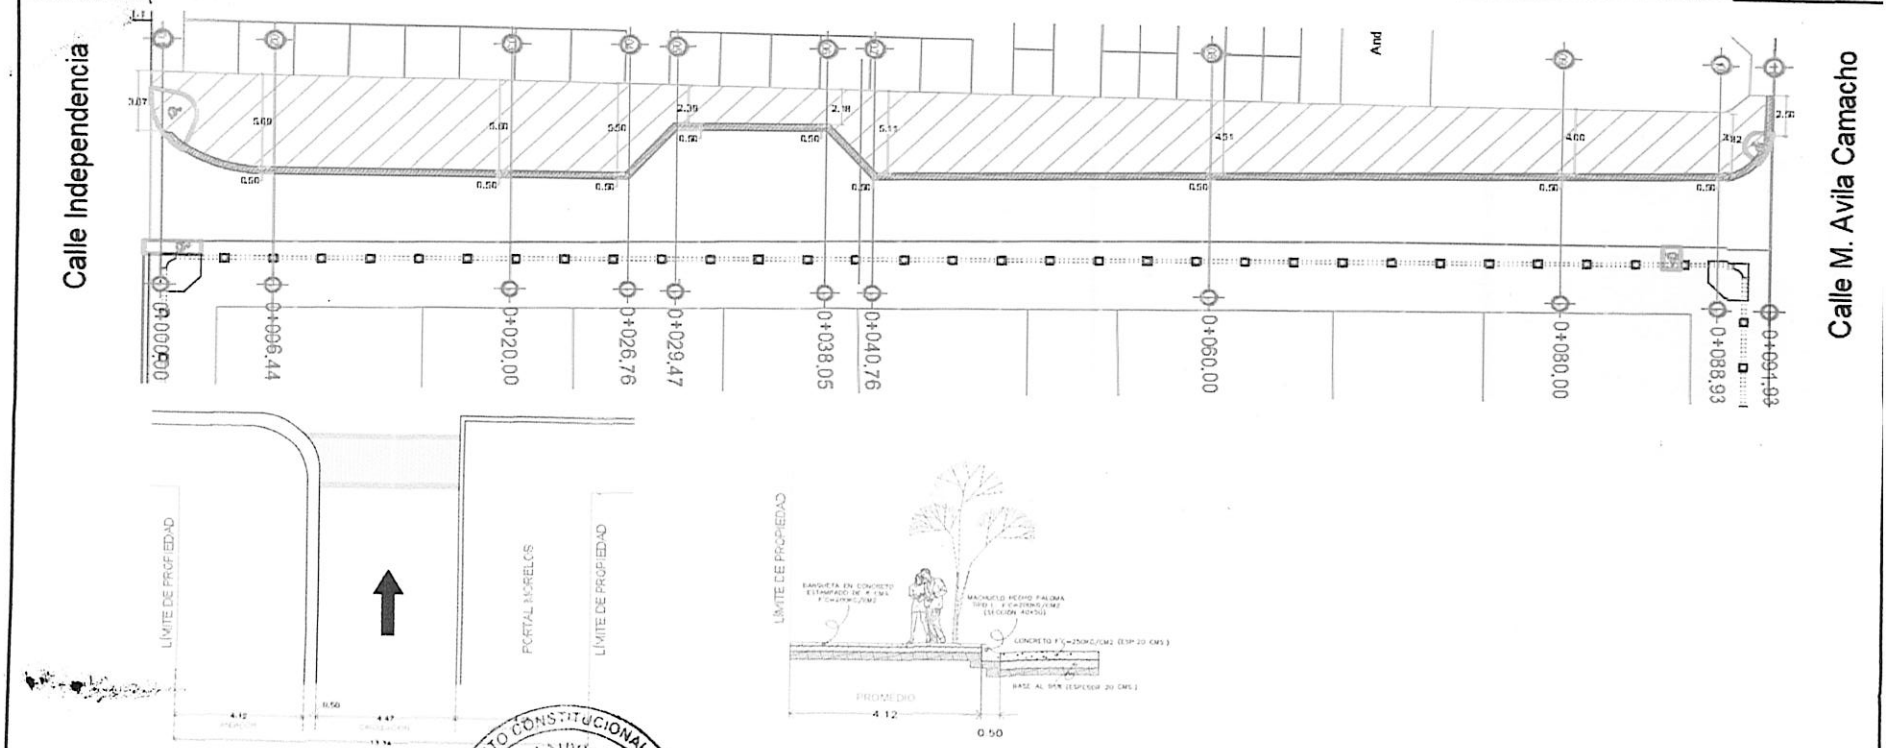

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

0000180

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJ. A 3

FECHA:

PERIODO:

MACHUELOS Y BANQUETAS

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
30	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DE LA DEMOLICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA.	0.30	99.39	0.30	8.95	M3	EXCAVACIÓN
		1.54	91.93	0.08	11.34	M3	DEMOLICIÓN
				SUBTOTAL	20.29	M3	
				30% DE ABUNDAMIENTO	6.09	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**26.38**	**M3**	

CROQUIS:

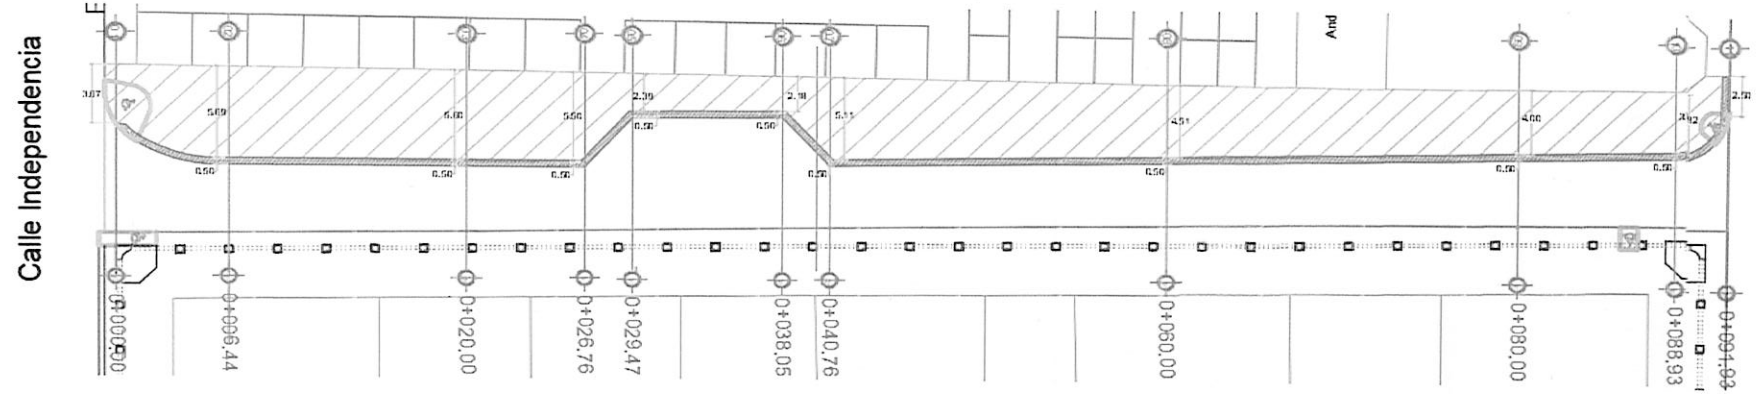

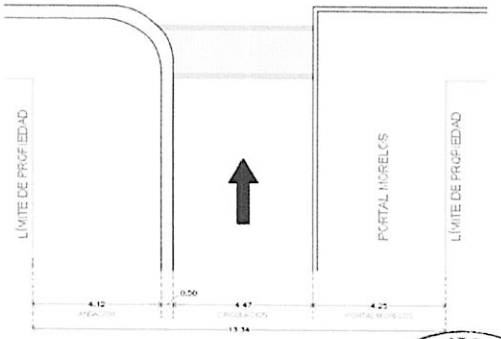

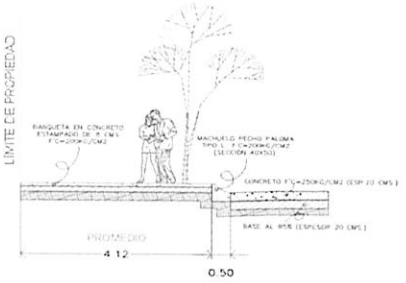

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES

00000161

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 3

FECHA:

PERIODO:

MACHUELOS Y BANQUETAS

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
31	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA.	0.30	99.39	0.30	8.95	M3	EXCAVACIÓN
		1.54	91.93	0.08	11.34	M3	DEMOLICIÓN
				SUBTOTAL	20.29	M3	
				30% DE ABUNDAMIENTO	6.09	M3	
				KMS SUBSECUENTES	7		
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**184.63**	**M3**	

CROQUIS:

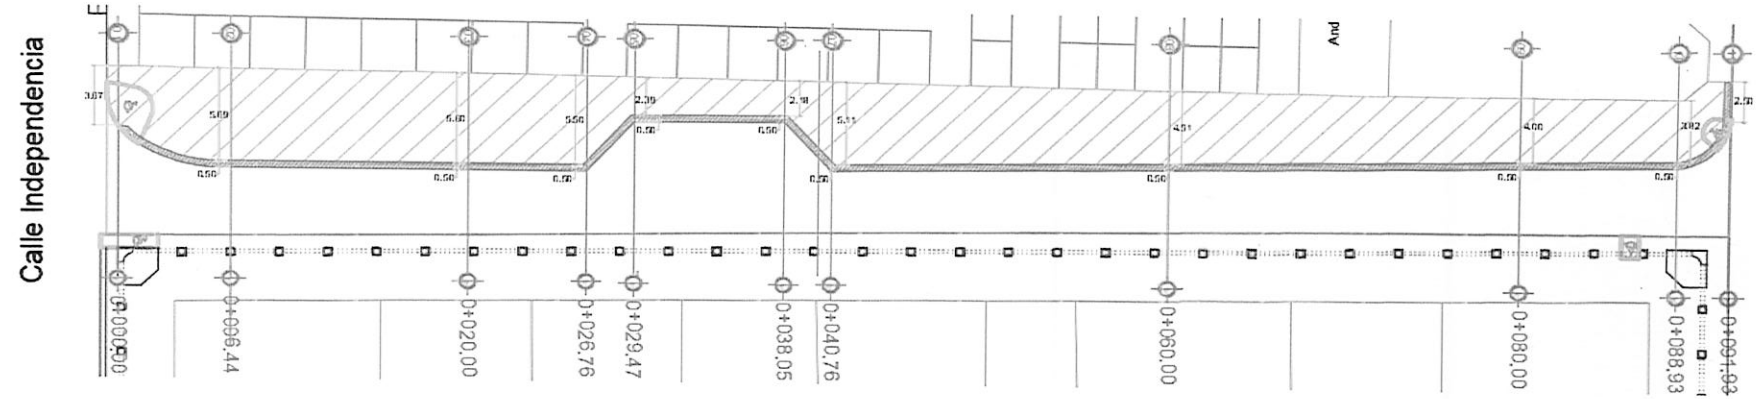

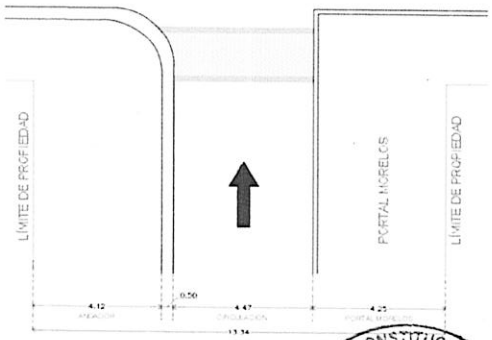

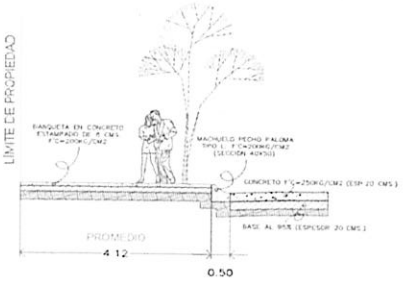

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUAYMAS, SONORA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PUBLICAS MPALES

00033163

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 32

FECHA:

PERIODO:

MACHUELOS Y BANQUETAS

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
32	BASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPA DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.	4.12	99.39	0.12	49.14	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	49.14	M3	

CROQUIS:

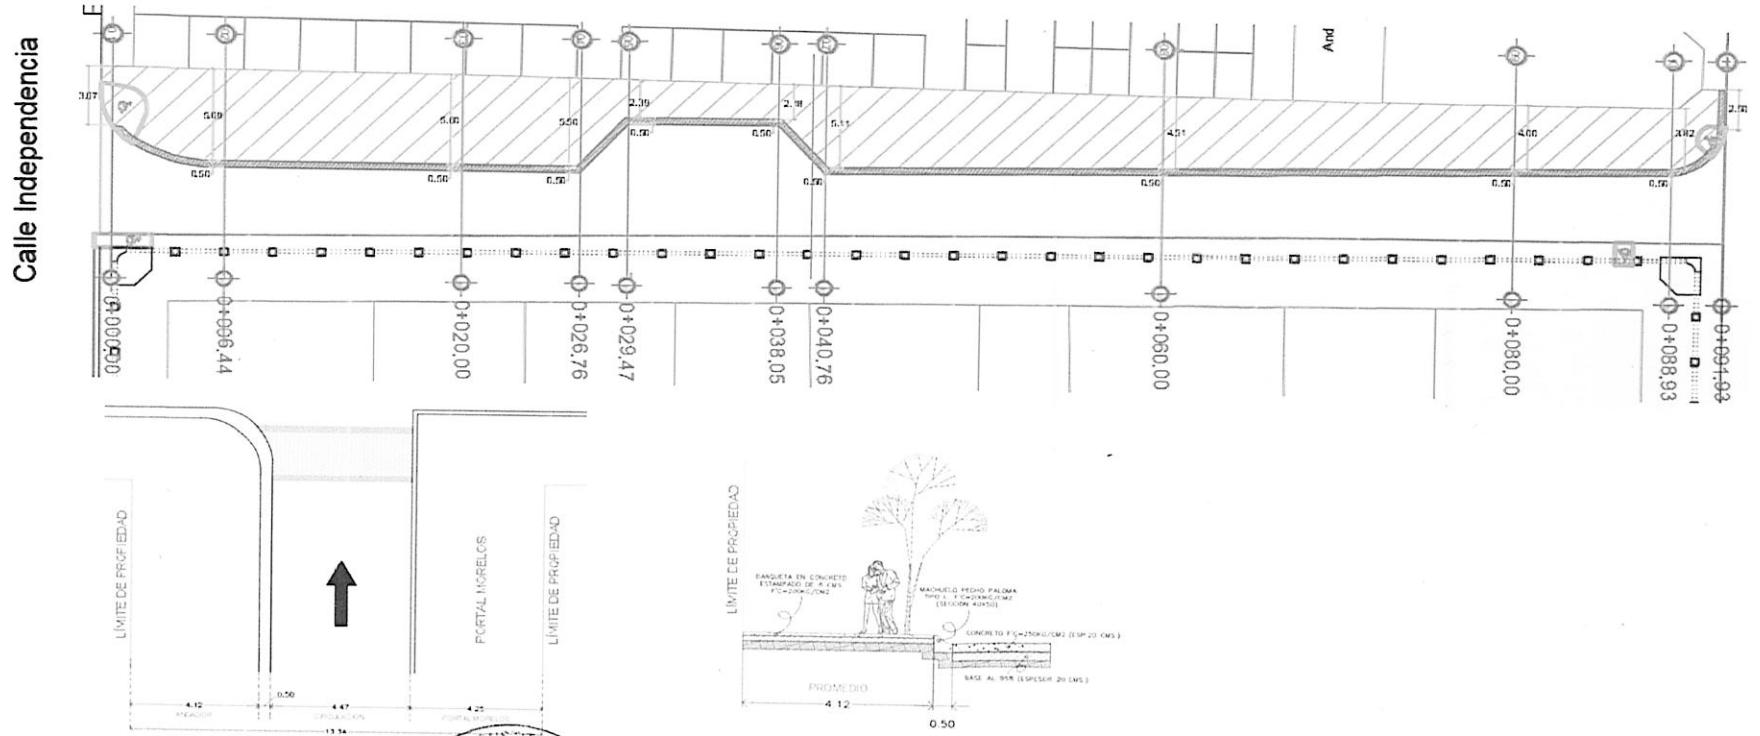

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2015-2018 UNIDOS HACEMOS MÁS OBRAS PÚBLICAS IMPACTO

00002153

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES | MEMORIA No. 1 | HOJA 33

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ. | FECHA:

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO. | PERIODO:

MACHUELOS Y BANQUETAS

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
33	BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8, RR 28 DIAS, DE 8 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, PICADO, ESTAMPADO TIPO PATA DE ELEFANTE EN BANQUETA, CON COLOR OCRE.	4.12	99.39	0.08	409.52	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	409.52	M2	

CROQUIS:

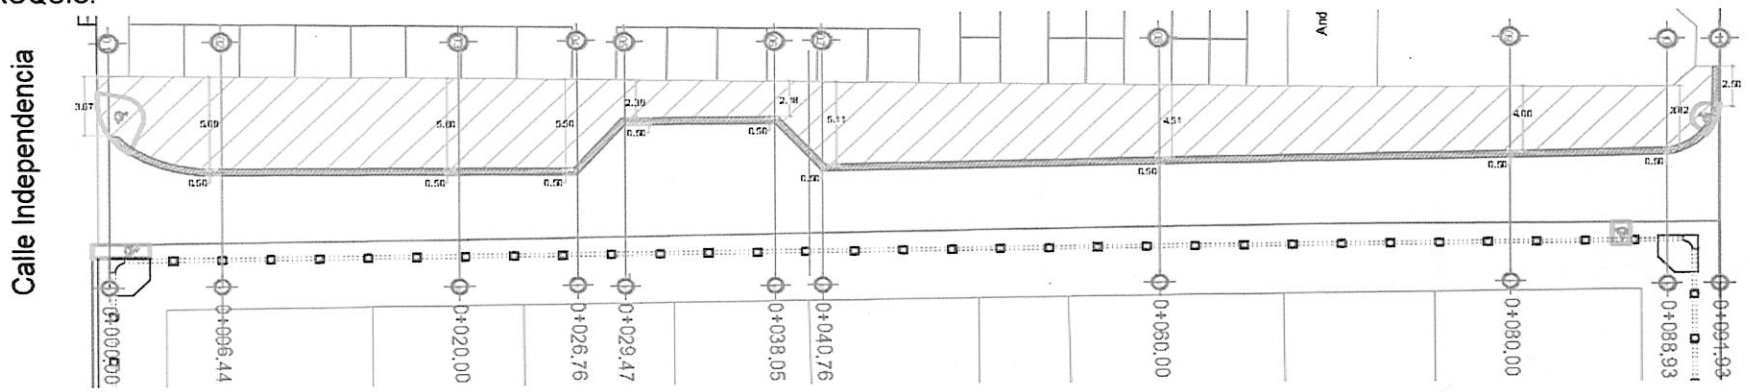

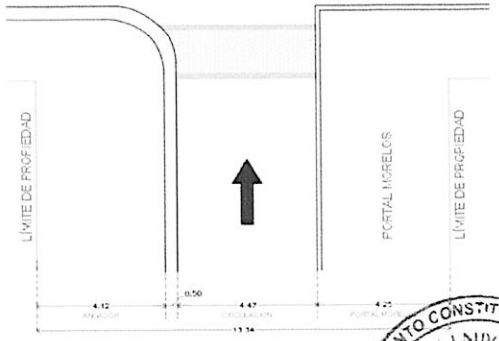

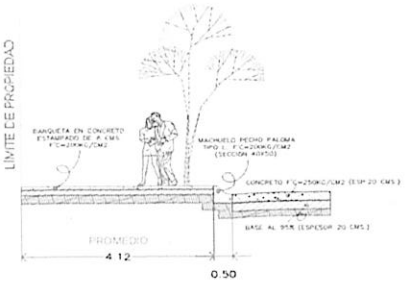

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAULIPAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PUBLICAS MPALES

00000184

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1

FECHA:

PERIODO:

MACHUELOS Y BANQUETAS

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	PIEZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
34	RAMPAS DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS (F´c=150 kg/cm2) ESP. = 8 CMS. INCLUYE: FORJADO, CIMBRADO Y COLADO, ACABADO ESCOBILLADO, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DE 4% Y MÁXIMA 10%; CON SEÑALIZACIÓN VISUAL Y TÁCTIL SEGÚN NMX-R-050-2009. ANCHO MÍNIMO LIBRE DE RAMPA PARA CIRCULAR DE 0.90 MTS, CON ACABADO FINAL ANTI-DERRAPANTE.	3.00	3.36	3.00	10.08	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	10.08	M2	

CROQUIS:

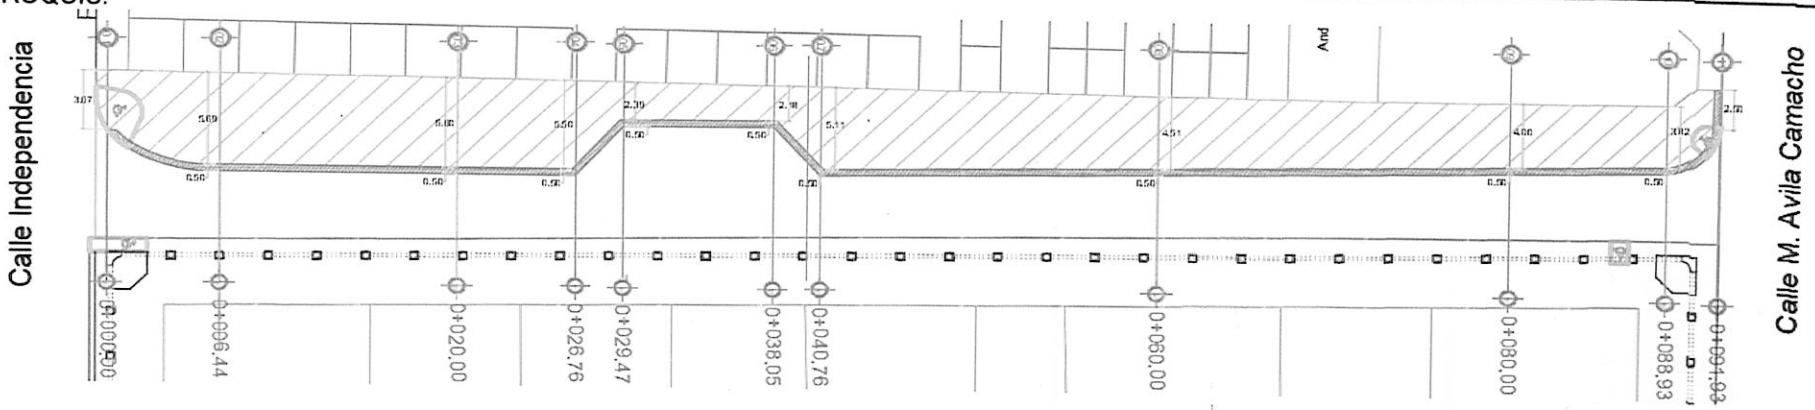

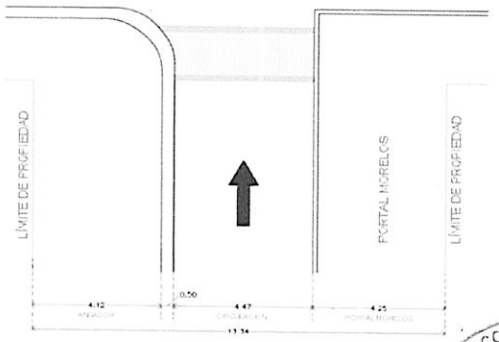

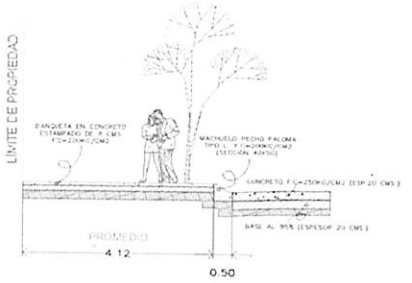

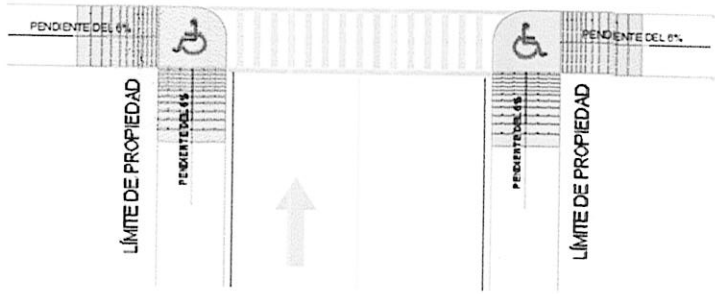

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTILLO, COAH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

99166080

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 35

FECHA:

PERIODO:

MACHUELOS Y BANQUETAS

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
35	LIM-158 LIMPIEZA FINAL (GENERAL) DE OBRA.	4.12	99.39		409.52	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**409.52**	**M2**	

CROQUIS:

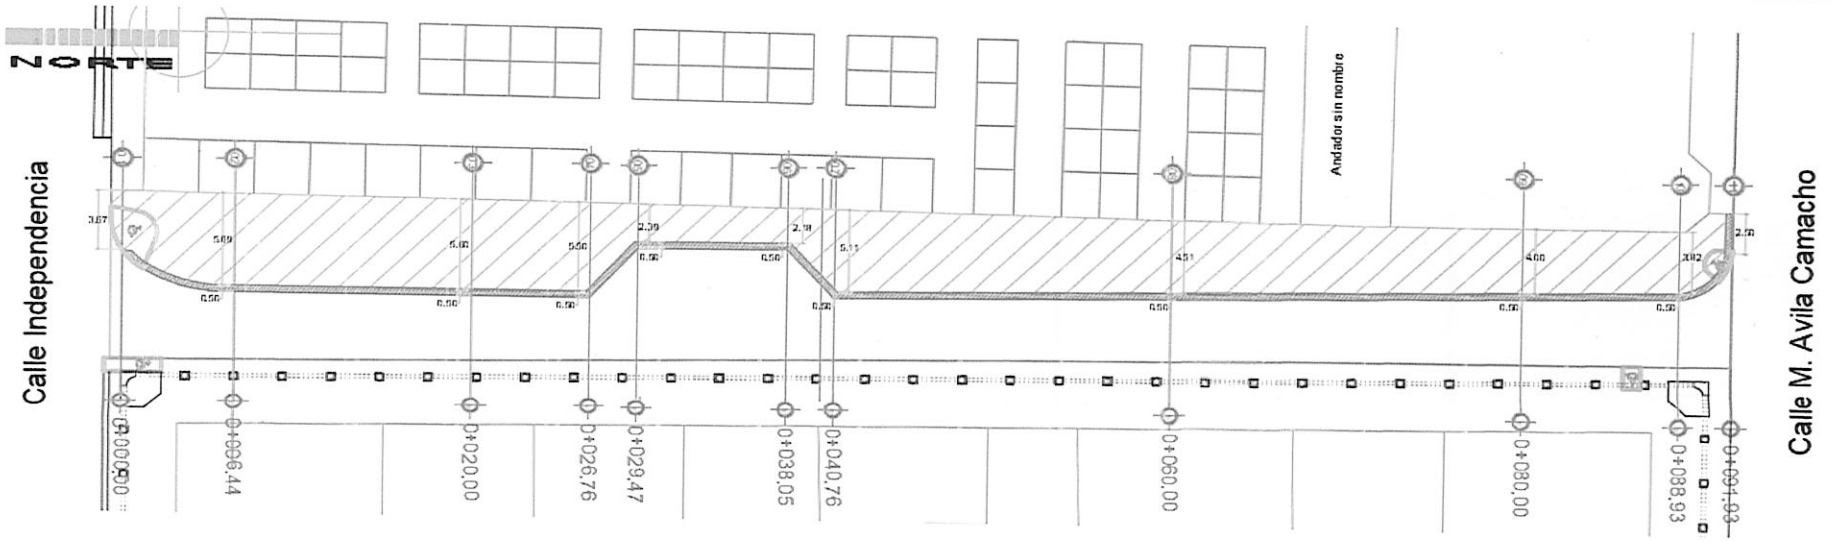

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES

00001169

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1

FECHA:

PERIODO:

	PAVIMENTACIÓN						
N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
36	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR CON ROTOMARTILLO, NO INCLUYE EL FIRME, INCLUYE: LOCALIZACION DE EJES, BANCOS DE NIVEL Y MATERIALES PARA SU EJECUCION.	7.95	91.93		731.16	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	731.16	M2	

CROQUIS:

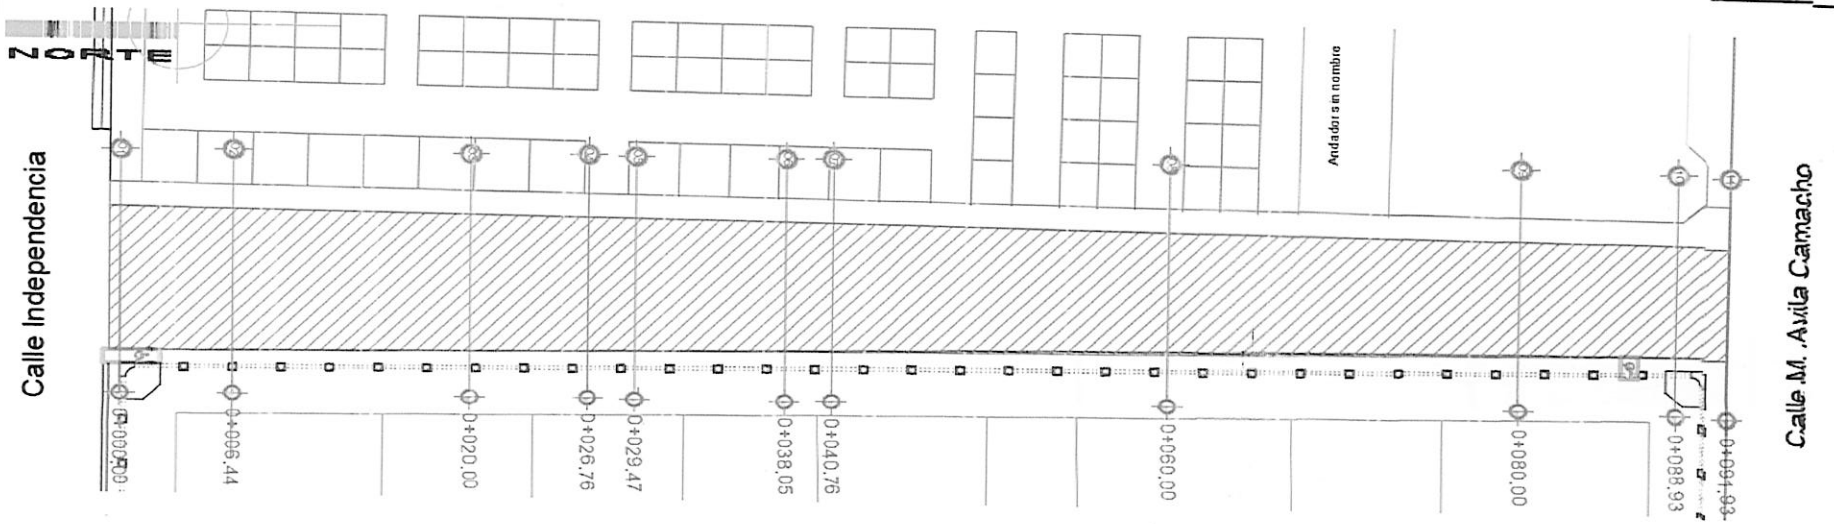

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAYULA
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

00000187

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1

FECHA:

PERIODO:

	PAVIMENTACIÓN							
N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES	
37	TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMPO. INCLUYE TRAZO, POR MEDIO DE TEODOLITO O ESTACIÓN TOTAL, NIVEL, CINTA Y EQUIPO COMPLEMENTARIO COMO, BALIZA, ESTADAL, PRISMA ESTACAS, MOJONERAS, PINTURA, CLAVOS, HILOS, MANO DE OBRA, ETC.	4.47	91.93		411.10	M2		
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	411.10	M2		

CROQUIS:

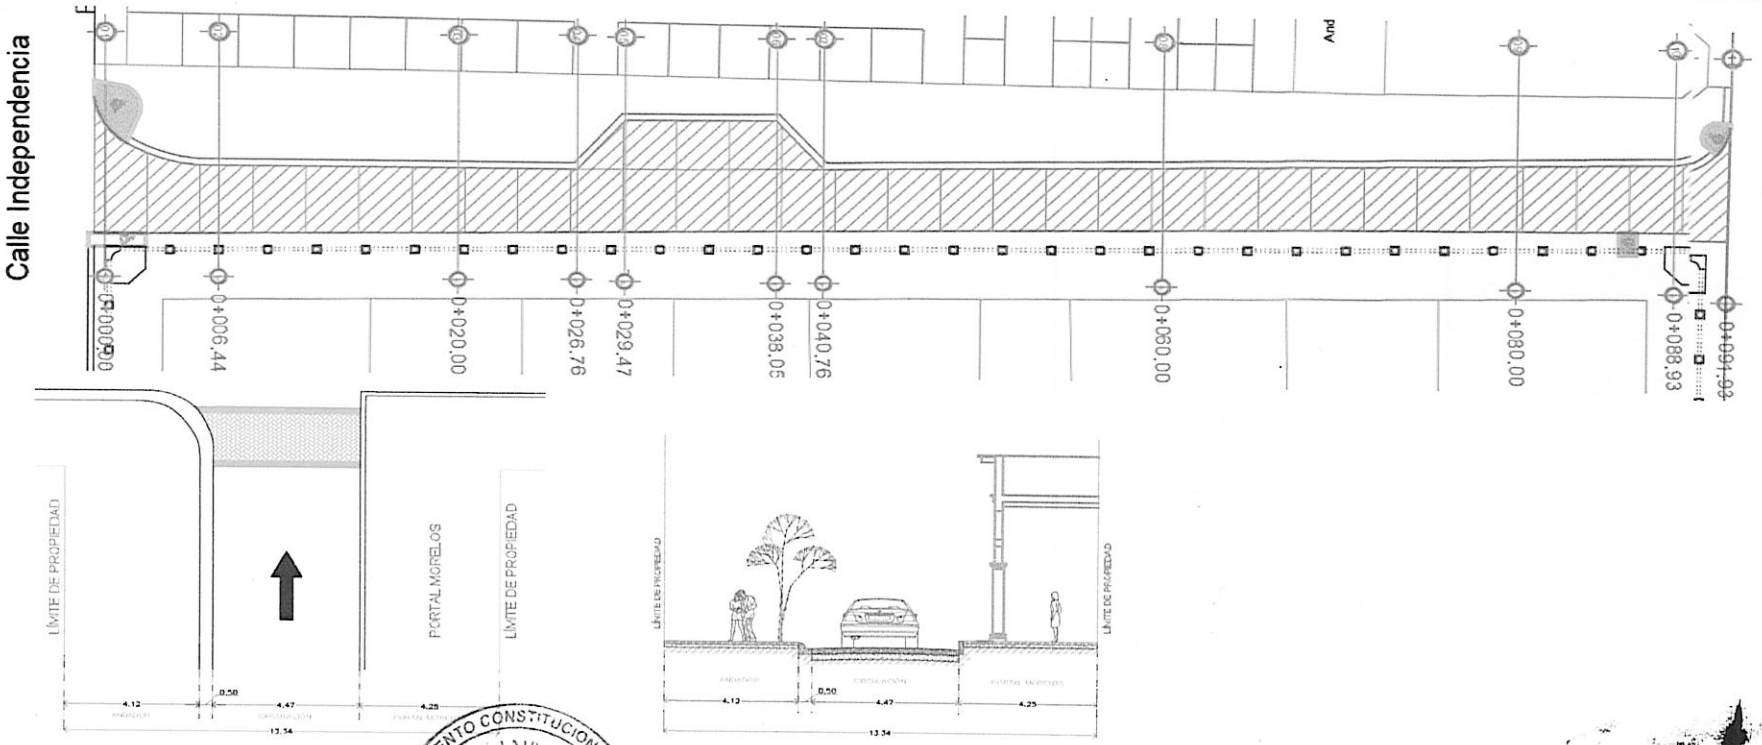

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA

8STCCC80

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 38

FECHA:

PERIODO:

PAVIMENTACIÓN							
N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
38	PREPARACIÓN DE CAJÓN PARA COLOCACIÓN DE BASE Y PAVIMENTO HIDRÁULICO, INCLUYE: EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO, MANO DE OBRA, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA MISMA CON UNA SECCIÓN. PROMEDIO DE 20 CMS.	4.47	91.93	0.20	82.22	M3	
			SUMA Y/O TOTAL DE HOJA		82.22	M3	

CROQUIS:

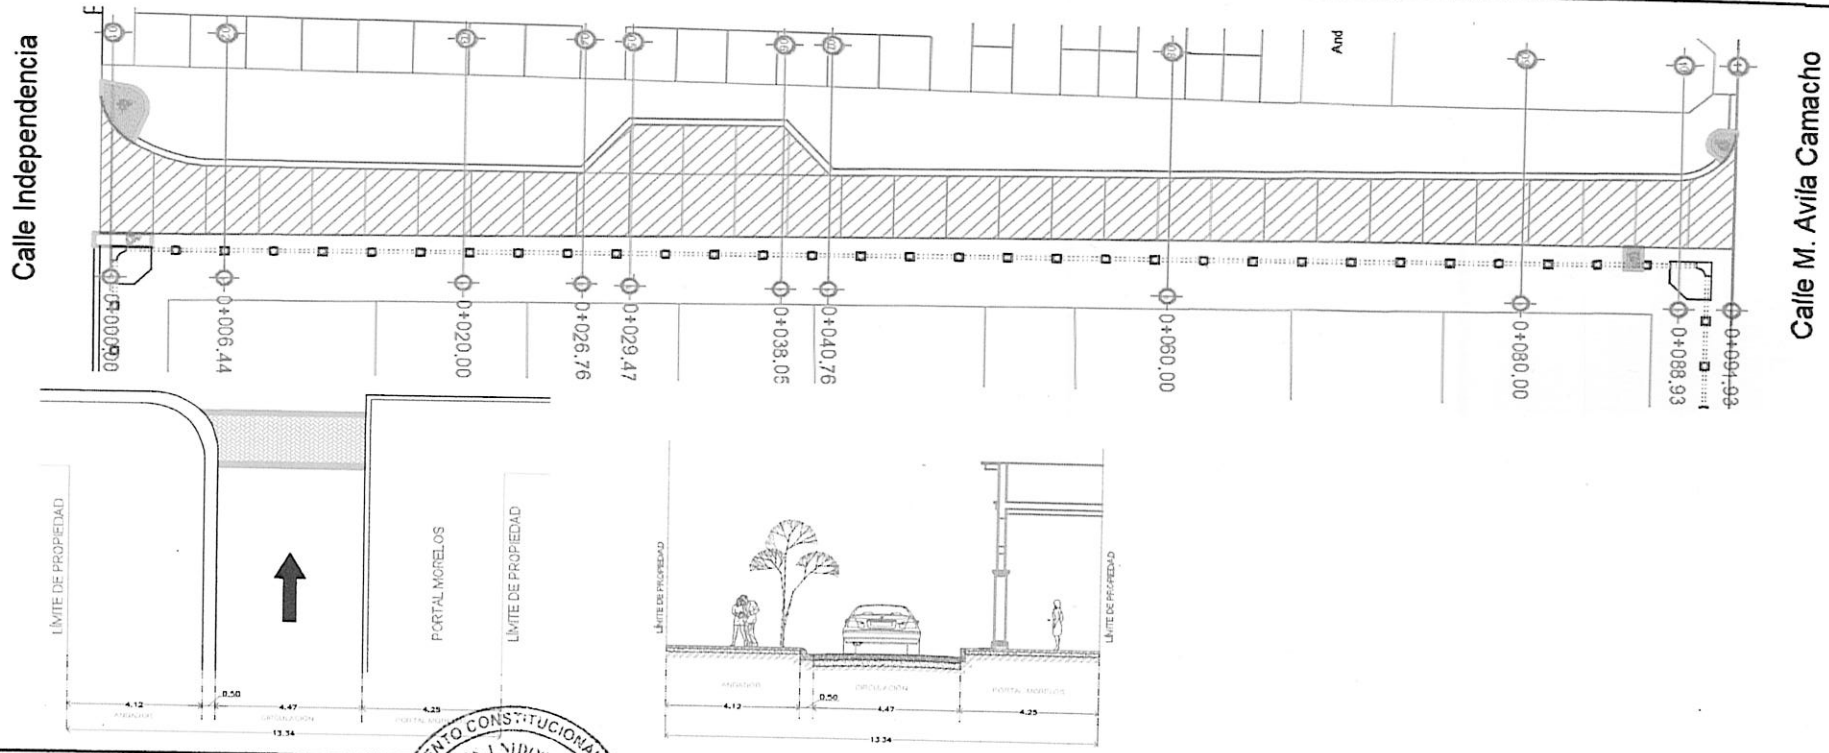

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHUA

68666159

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJ. A 3

FECHA:

PERIODO:

PAVIMENTACIÓN

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
39	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL TIPO I Y II, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, A UN KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN SECCIONES.	4.47	91.93	0.20	82.22	M3	MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE C/ AJÓN
		7.95	91.93	0.20	146.23	M3	MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLI CIÓN
				SUBTOTAL	228.45	M3	
				30% ABUNDAMIENTO	68.54	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**296.99**	**M3**	

CROQUIS:

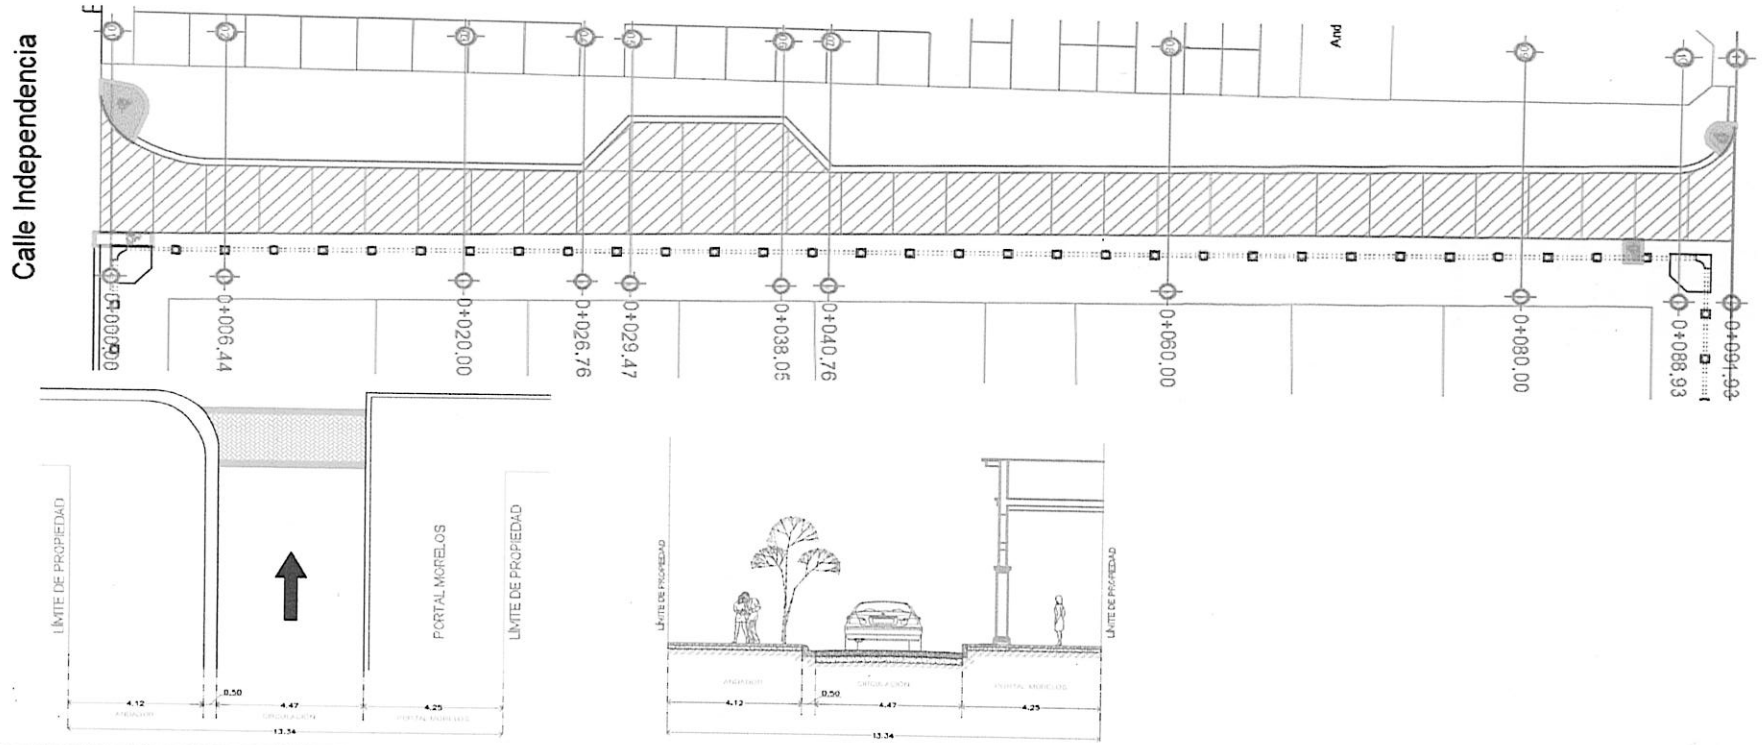

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

0270000

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 4

FECHA:

PERIODO:

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
	PAVIMENTACIÓN						
40	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO O DE PLATAFORMA. (7 KM. APROX.)	4.47	91.93	0.20	82.22	M3	MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE CAJÓN
		7.95	91.93	0.20	146.23	M3	MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN
				SUBTOTAL	228.45	M3	
				30% ABUNDAMIENTO	68.54	M3	
				KMS	7.00		
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**2,078.91**	**M3**	

CROQUIS:

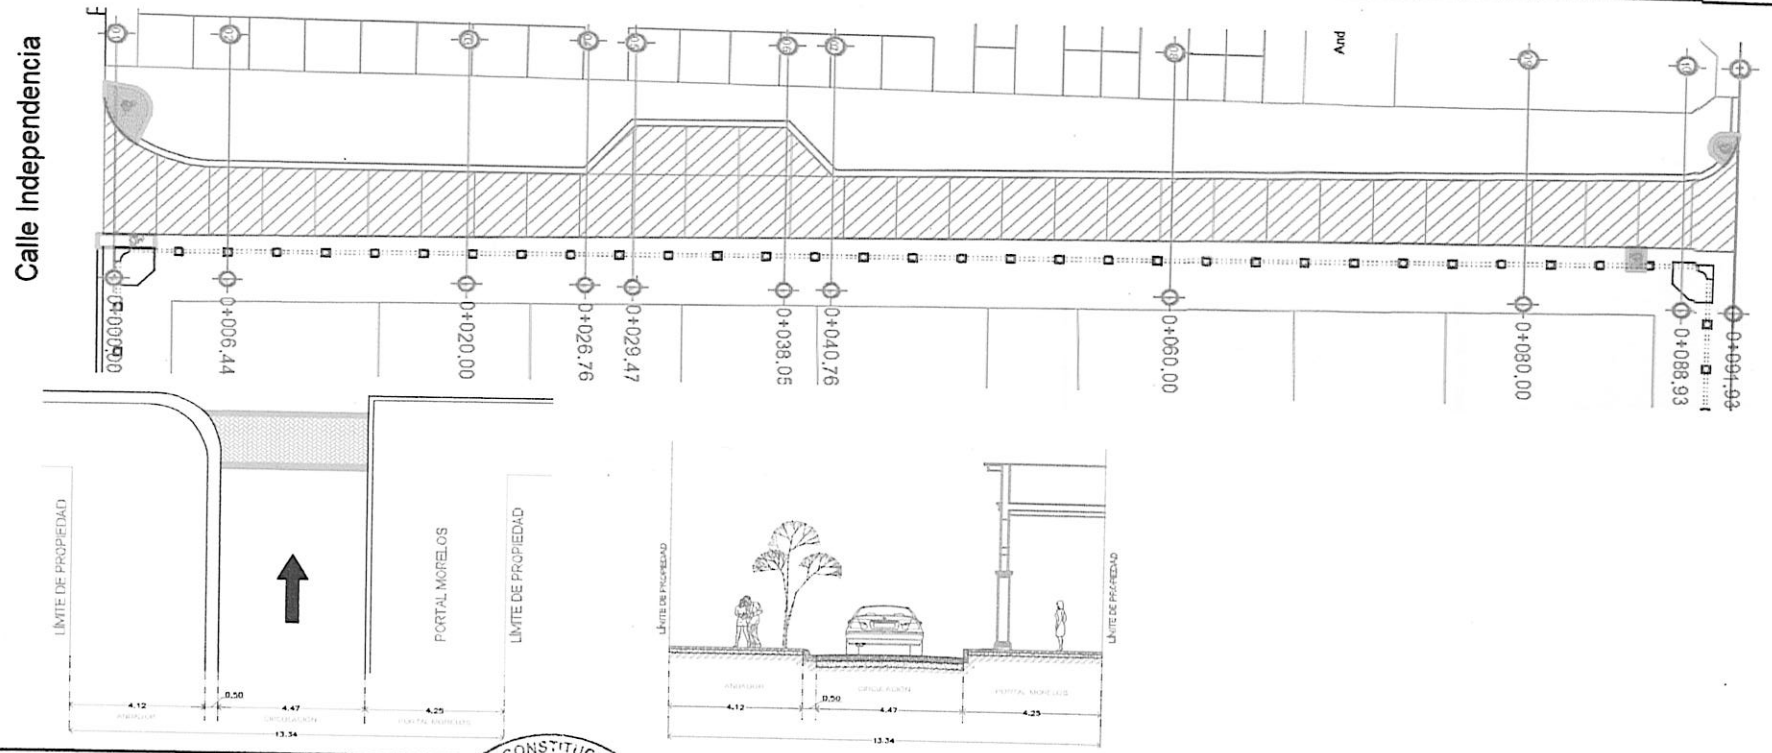

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

1210000

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 41

FECHA:

PERIODO:

PAVIMENTACIÓN

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
41	ELABORACION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA) COMPACTADA AL 95% (PROCTOR), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. ESPESOR DE 20 CMS.	4.47	91.93	0.20	82.22	M3	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**82.22**	**M3**	

CROQUIS:

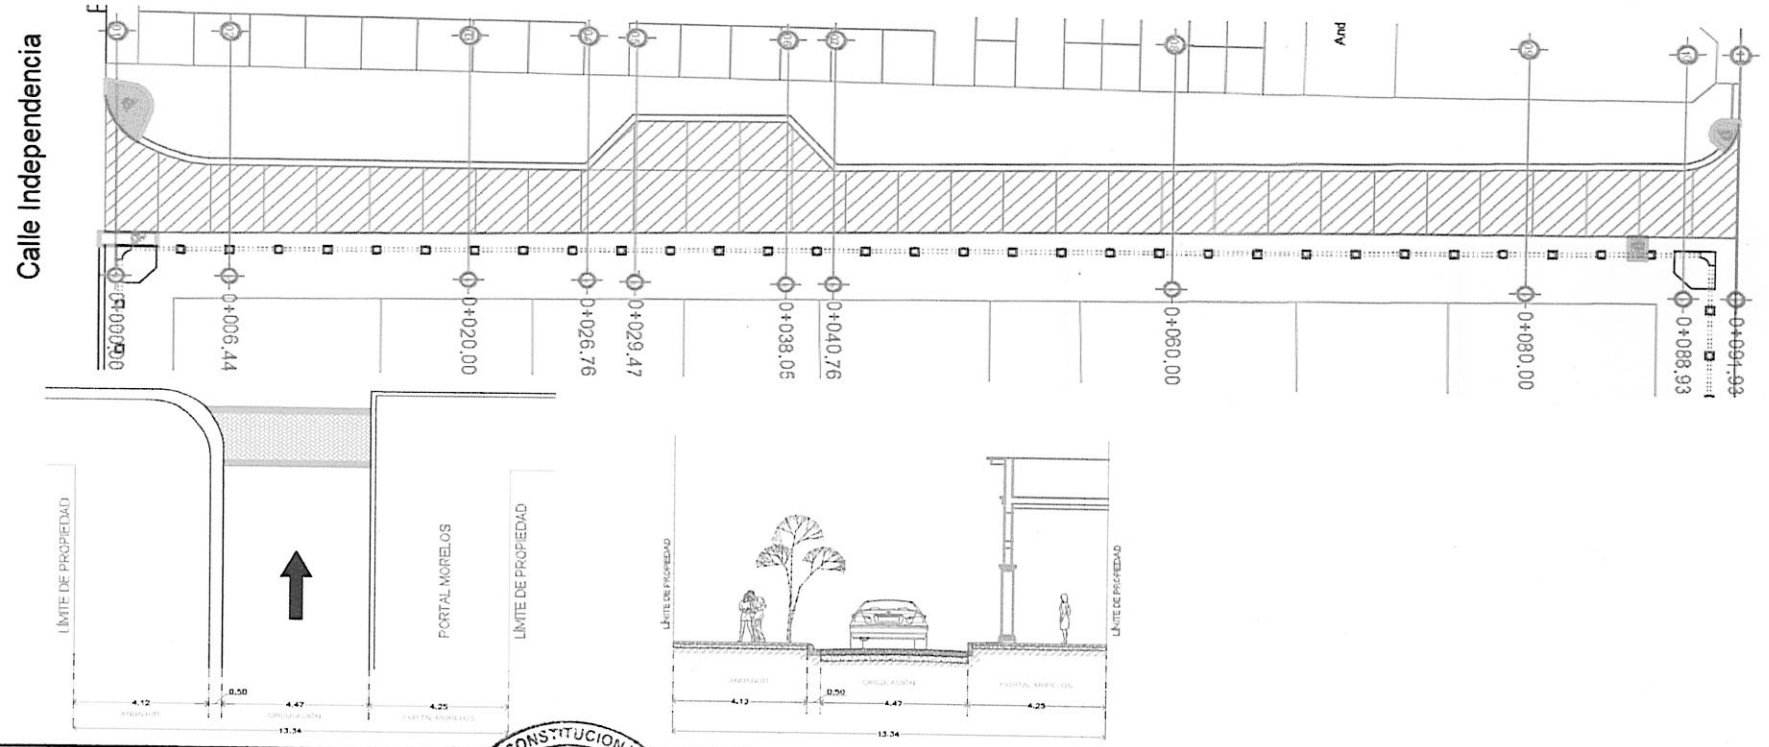

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

00000172

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 42

FECHA:

PERIODO:

PAVIMENTACIÓN

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
42	PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8, RR 28 DIAS, DE 20 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRADO DE FRONTERAS.	4.47	91.93		411.10	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	**411.10**	**M2**	

CROQUIS:

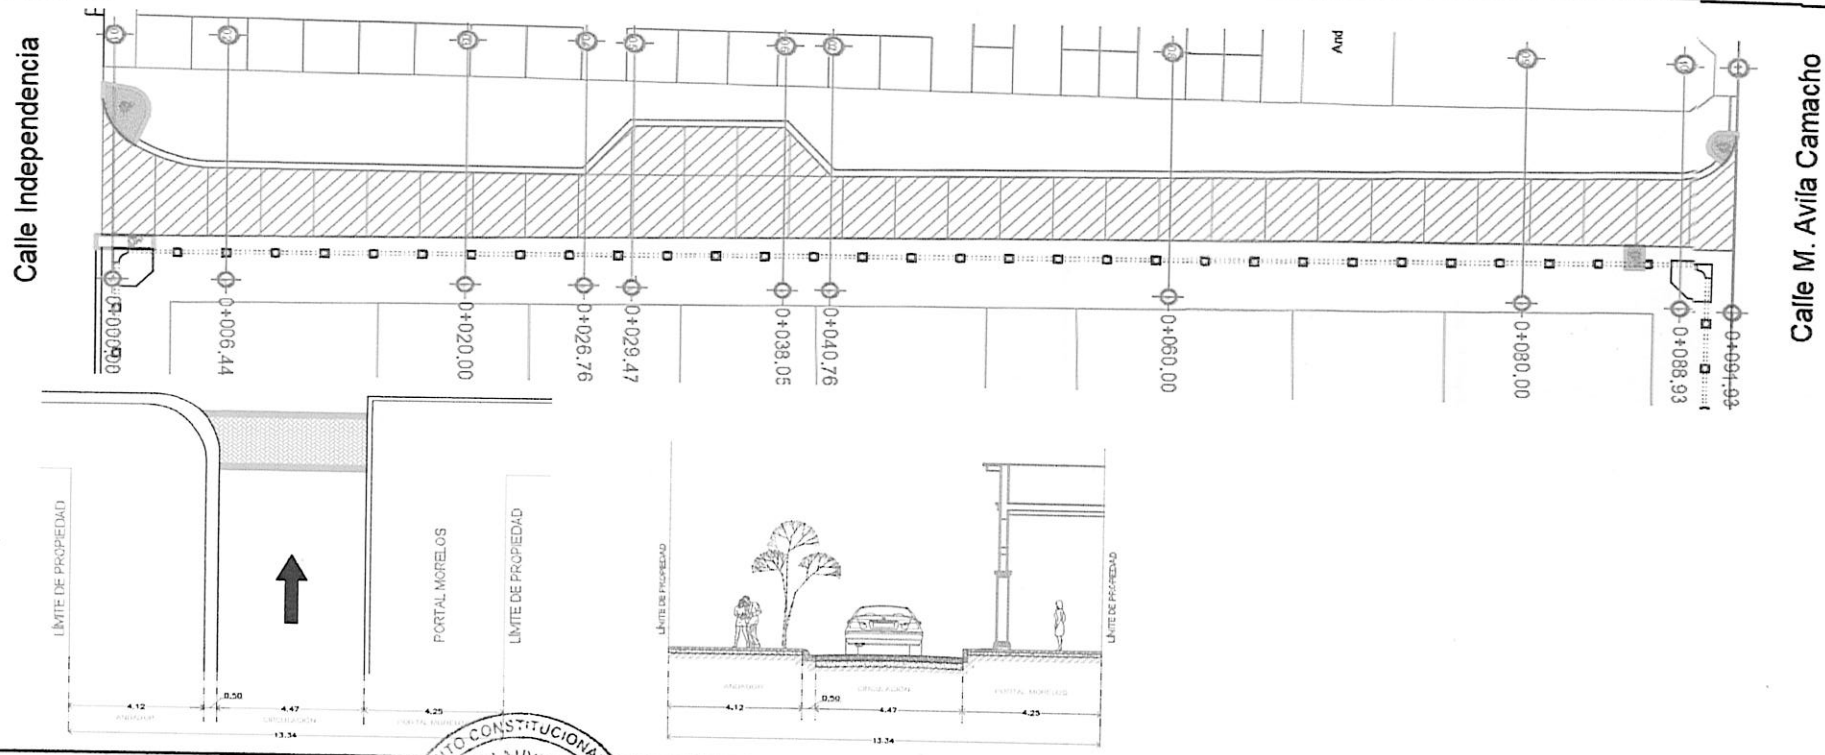

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021 OBRAS PUBLICAS MPALES

08660173

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJA 43

FECHA:

PERIODO:

	PAVIMENTACIÓN						
N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	PZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
43	CORTE DE LOSAS DE CONCRETO EN PAVIMENTOS DE 8 A 15 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO.	4.47		31.00	138.63	ML	HORIZONTAL A CADA 3M
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	138.63	ML	

CROQUIS:

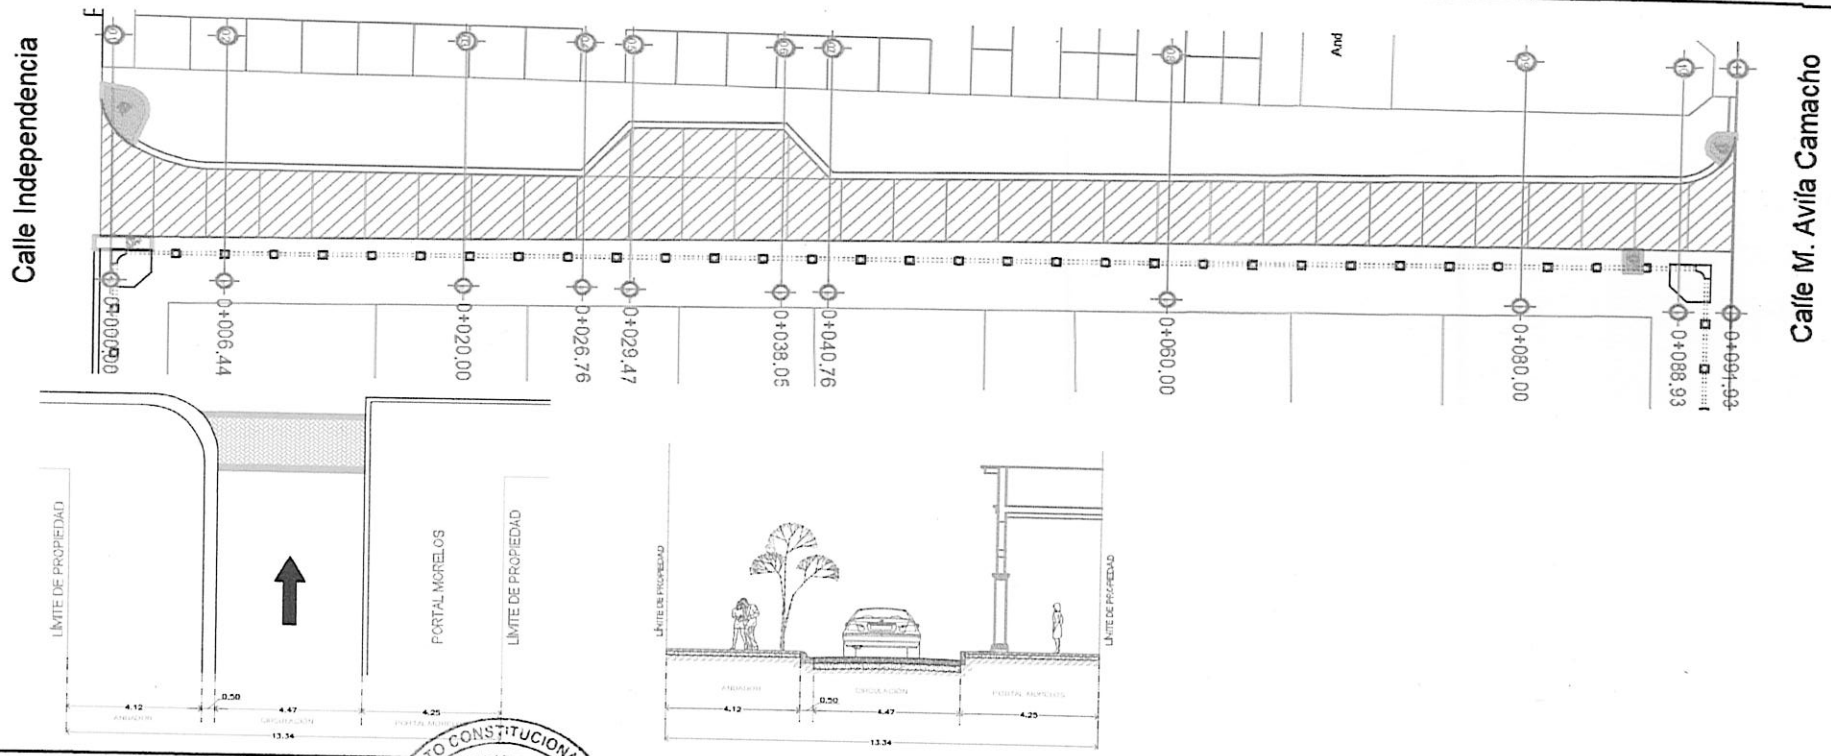

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021 OBRAS PUBLICAS

00001274

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No.	1	HOJA 44
FECHA:		
PERIODO:		

PAVIMENTACIÓN

N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	PZAS	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
44	CALAFATEO DE JUNTA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON SELLADOR DE POLIURETANO. INCLUYE: RASPADO DE POLIURETANO O POLIESTIRENO EN JUNTA DE 0.50 ML POR 2 CM.	4.47		31.00	138.63	ML	HORIZONTAL A CADA 3M
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	138.63	ML	

CROQUIS:

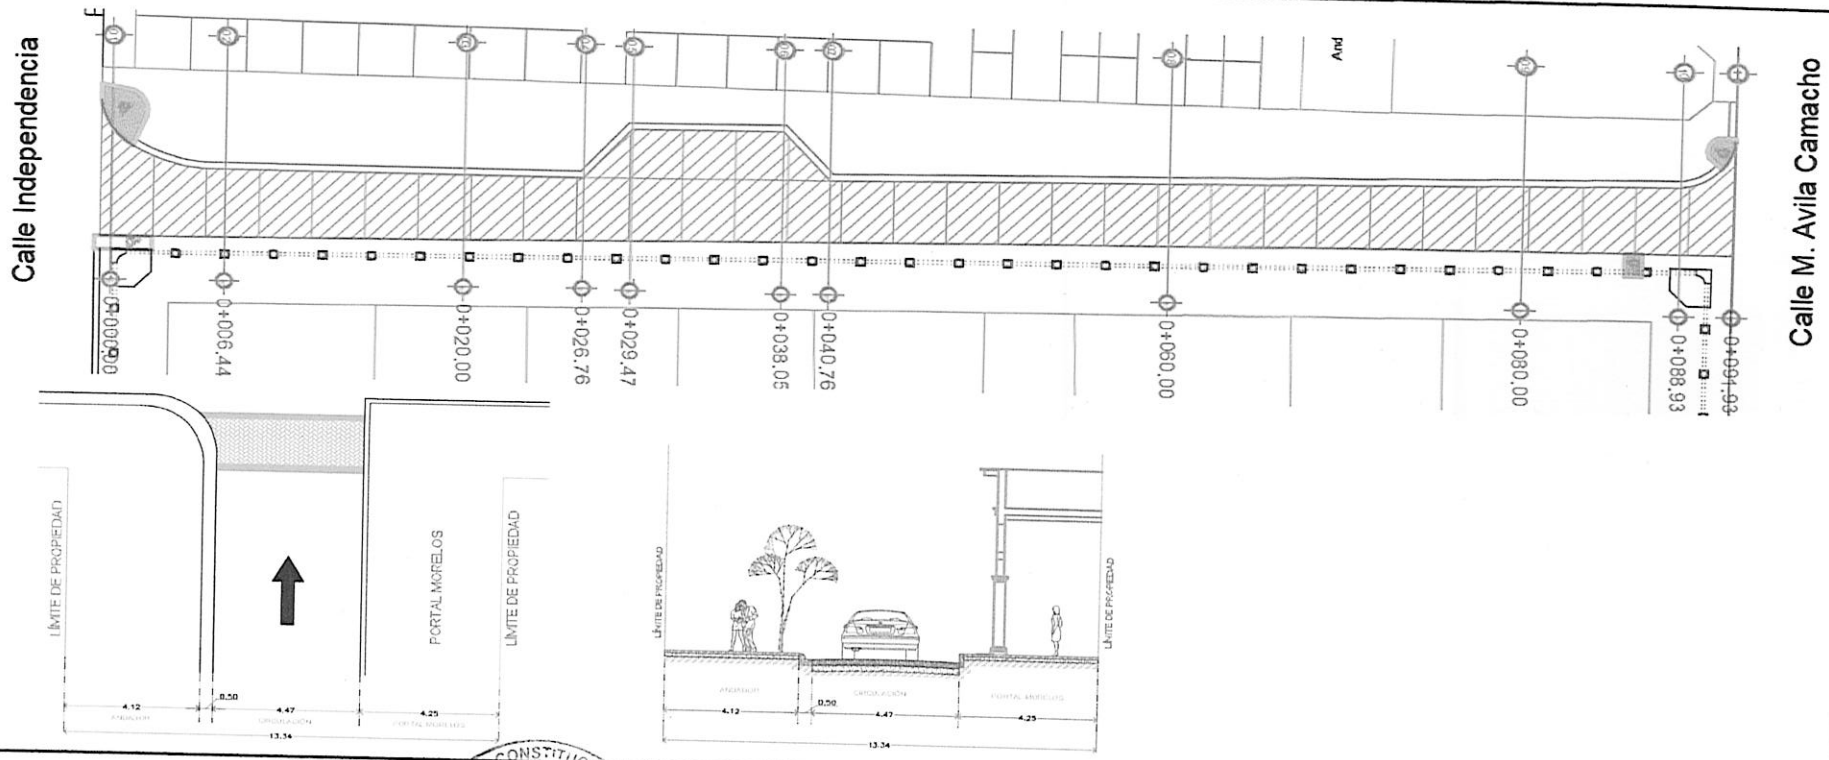

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. OBRAS PUBLICAS MPALES.

2210000

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL AVILA AMACHO.

MEMORIA No. 1 HOJ. A 4

FECHA:

PERIODO:

PAVIMENTACIÓN							
N°	CONCEPTO:	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
45	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE BARRIDO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	4.47	91.93		411.10	M2	
				SUMA Y/O TOTAL DE HOJA	411.10	M2	

CROQUIS:

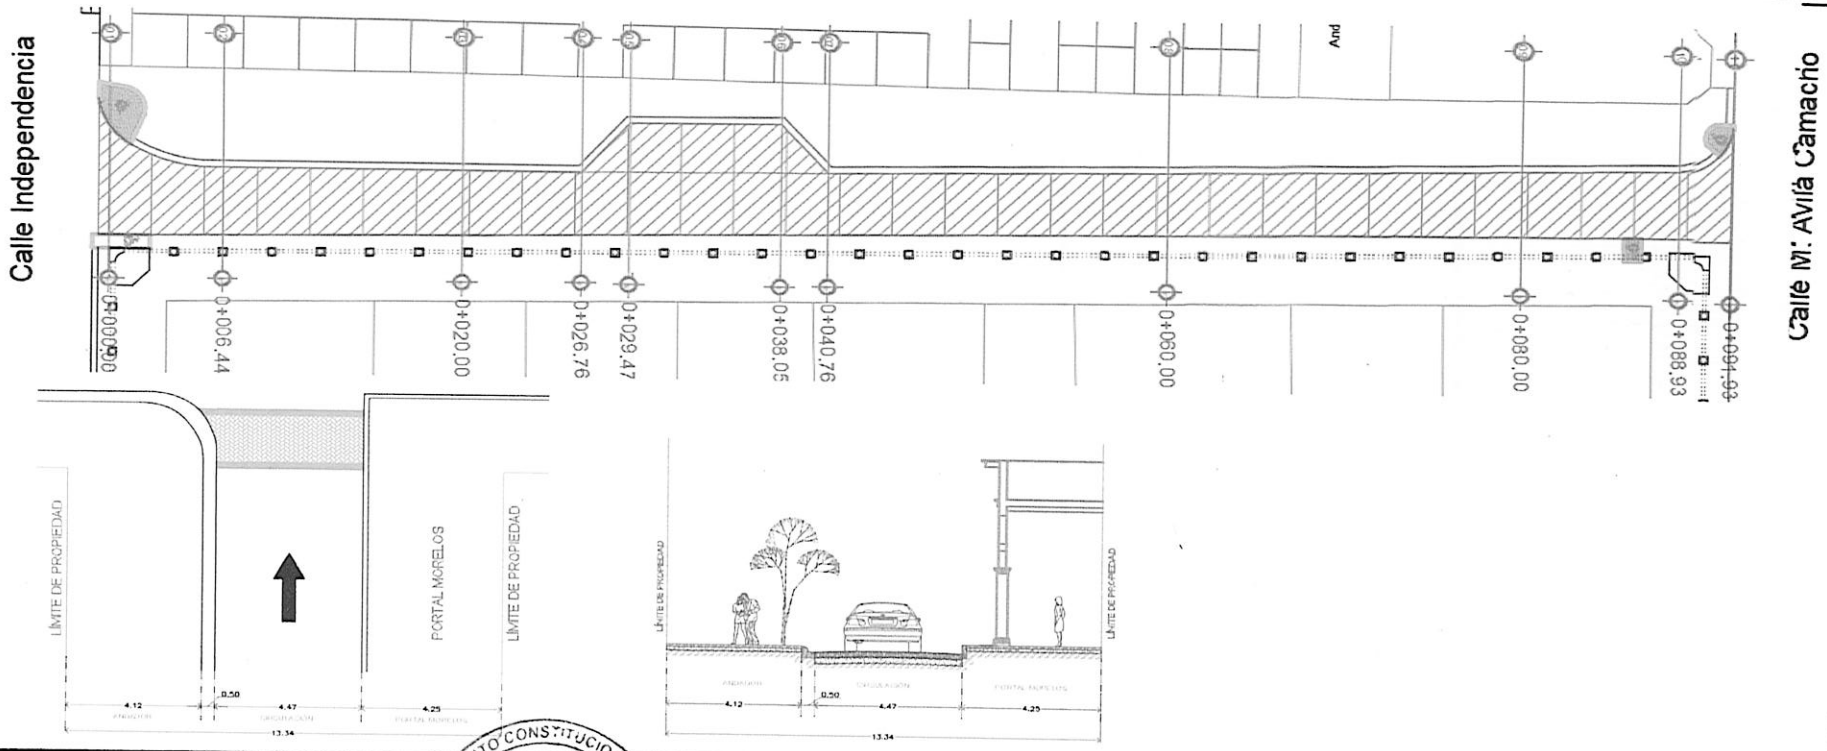

ELABORO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2018-2021 OBRAS PUBLICAS MPALES

00001176

SAYULA

AYUNTAMIENTO 2015-2018

GOBIERNO CON PRINCIPIOS

CONTENIDO:

BITACORA

PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ UBICADA EN SAYULA, JALISCO.

RECURSO:

FONDEREG 2018

00000177

Nota 01.

Jueves 12 de Abril del 2018

- Se comienza la Construcción de la Obra Pavimentación y servicios en la Calle Porfirio Díaz, entre las Calles. Independencia y Manuel Avila Camacho, en la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco.

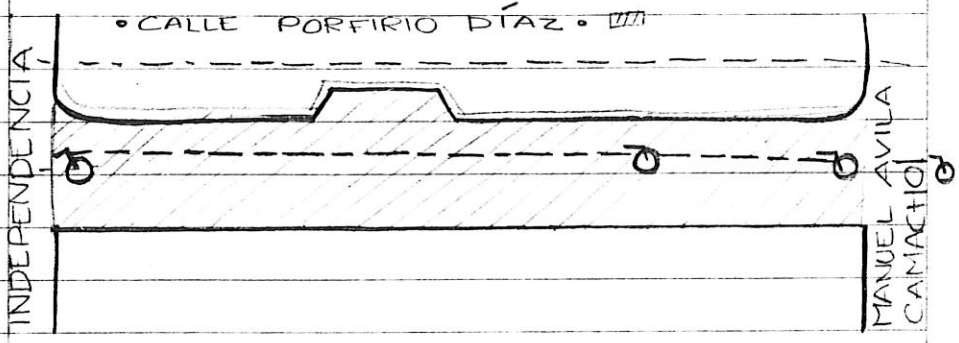

- Se comienza con la demolición de piso de cemento de 20cms. con Roto-martillo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2015-2018 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES

Arq. Alonso Serrato
Dir. de Obras Públicas

Arq. Federico S.M.
Residente de Obra.

00000178

Nota 02.

Miercoles 18 de Abril del 2018.

- Se comienza con el trazo y nivelación de ejes de calles y redes de tubería en la Calle Porfirio Díaz entre la Calle Independencia y Manuel Avila Camacho.

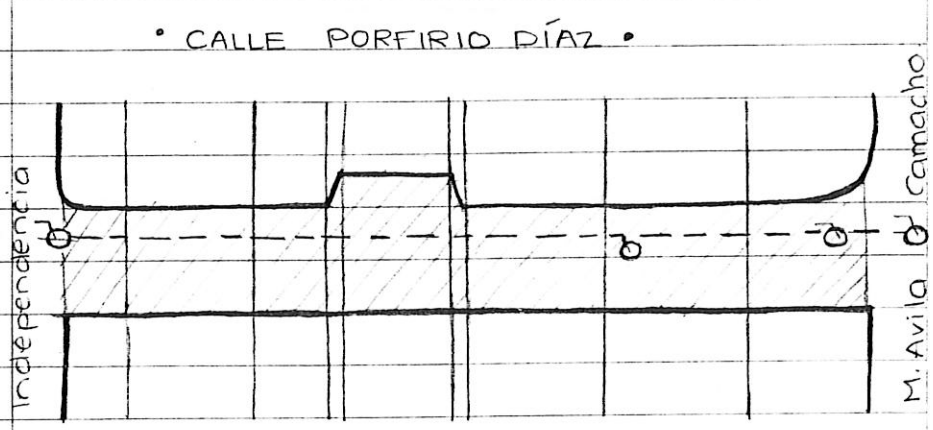

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

0000175

Nota 03.

Martes 24 de Abril del 2018.

- Se continua con la excavación en la Calle Porfirio Díaz, la línea de Drenaje con máquinaria en terreno tipo "B" de 0.00 a 2.00 de profundidad.

• DETALLE DE CEPA. •

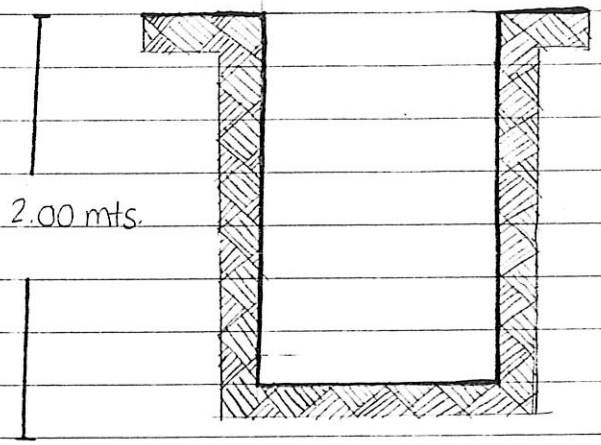

- Se acarrea el material excedente producto de la excavación.

Arq. Alonso Serrato
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Presidente de Obra.

00000180

Nota 04

Lunes 30 de Abril del 2018.

- Se comienza con el afine y fondo de cepa a mano, en material tipo "B" en seco, en la Calle Porfirio Díaz entre la Calle Independencia y Manuel Avila Camacho.

• DETALLE DE CEPA •

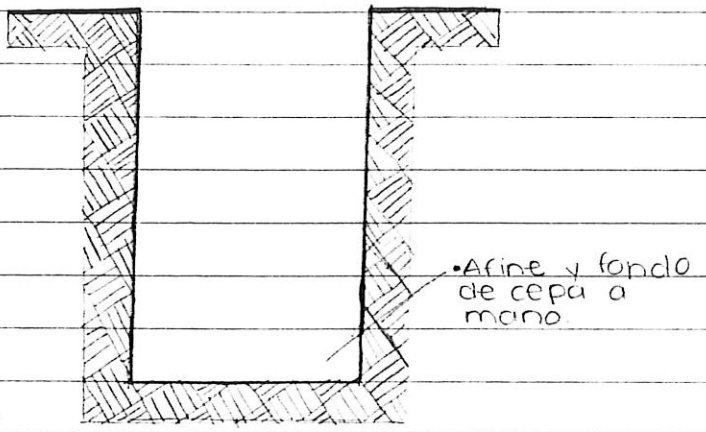

- Se comienza el acarreo de arena para el tendido de cama de arena.

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra

00000131

Nota 05.

Lunes 07 de mayo del 2018.

- Se comienza con el tendido de cama de arena para recibir tubería de PVC. de 12" de diametro, serie 25 (Incluye Material) Espesor 10.cm.

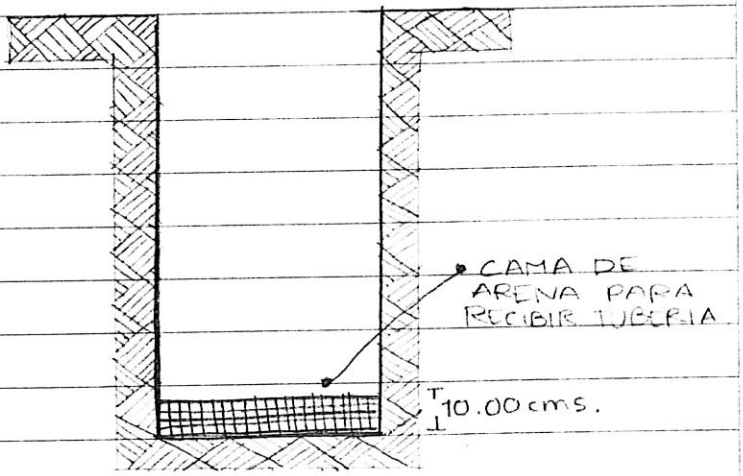

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Alonso Serratos Ayala
Dir. de Obras Públicas.

Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000182

Nota 06.

Jueves 10 de mayo del 2018.

- Se comienza con la colocación de tubo P.V.C. de 12" de diametro, serie 25 (Marca Rexolit) (Alcantarillado).

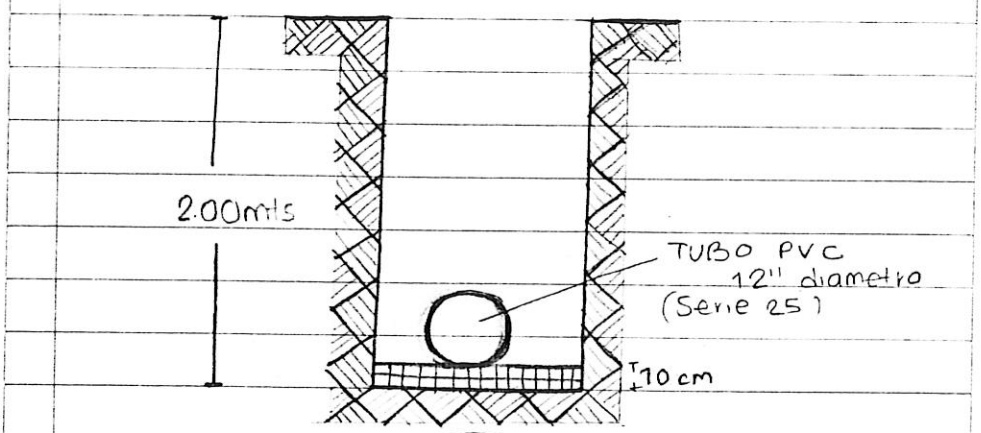

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000153

Nota 07.

Sabado 12 de mayo del 2018.

- Se concluye con la colocación de tubo PVC de 12" de diametro, serie 25 (Incluye material) Marca Rexolit.
- Se acarrea tierra amarilla a Porfirio Diaz para el acostillado de tuberra..

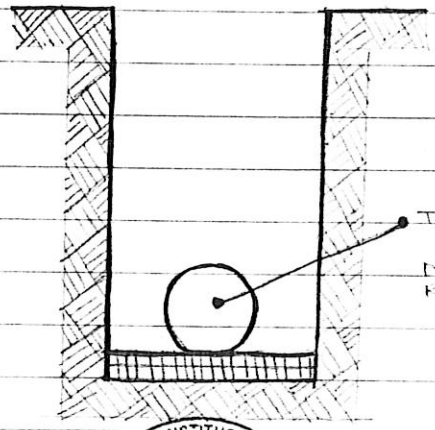

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000184

Nota 08.

Martes 15 de Mayo del 2018.

- Se comienza con el acostillado de tubería de PVC 12" con material de Banco (Tierra Amarilla).
En la Calle Porfirio Díaz.

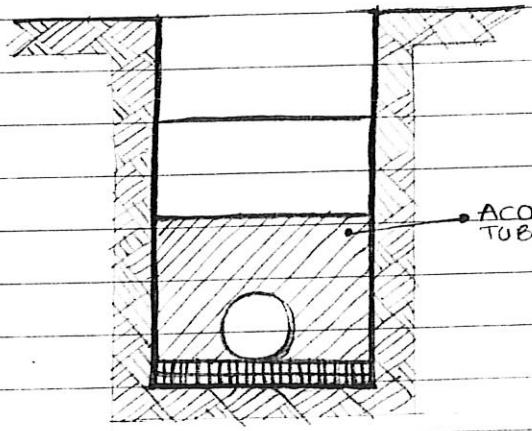

• DETALLE DE CEPA •

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000135

Nota 09.

Lunes 22 de Mayo del 2018.

- Se concluye con el acostillado de tubería con (Tierra Amarilla).
- Se continua con el alcantarillado a base de tubería PVC 6" de diametro. Con campana (Tubería Alcantarillado de morma marca Rexolit).

Silleta 12" x 6", Empaque de 6", codo de 6" x 90°, pegamento PVC y lija.

Incluye: trazo y nivelación, excavación, Relleno y Compactación.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTILLO, COAH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES.

Arq. Alonso Serratos
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000186

Nota 10.

Miercoles 30 de Mayo del 2018.

- Se continua con la Descarga de Alcantarillado a base de tubería de P.V.C. 6" de diametro.
- Se comienza la Construcción de Registros Sanitarios de 60 x 60 x 100cm a base de tabique rojo recocido, acabado púlido. Incluyendo Marco y Contra marco.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SALTILLO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000137

Nota 11.

Martes 05 de Junio del 2018.

- Se continua la elaboración de registros sanitarios
- Se comienza la construcción de Pozo de visita común de 2.00 metros de profundidad para recibir tuberia de 12" de diametro. Incluye la excavación y el retiro de material.

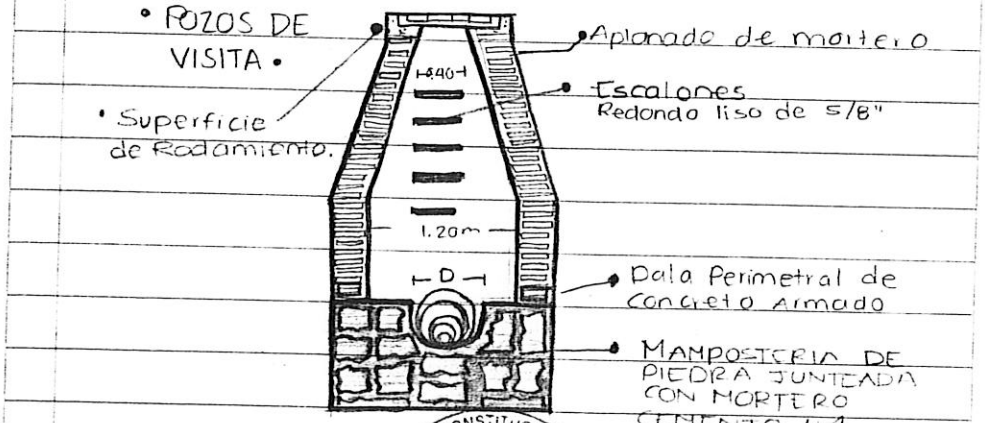

Arq. Alonso Serrato S. V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000183

Nota 12.

Jueves 07 de Junio del 2018.

- Se continua con la elaboración de pozos de visita tipo común de 2.00 metros de profundidad.
- Se continua con el acarreo de material producto de la excavación. en capas no mayores de 20 cm con humedad optima y pizon de mano.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL

Arq. Alonso Serrato
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico S. M.
Residente de Obra.

00000189

Nota 13.

Viernes 8 de Junio del 2018.

- Se comienza con el relleno y compactación con material producto de la excavación en capas no mayores de 20 cms. con húmedad optima y pizan de mano.

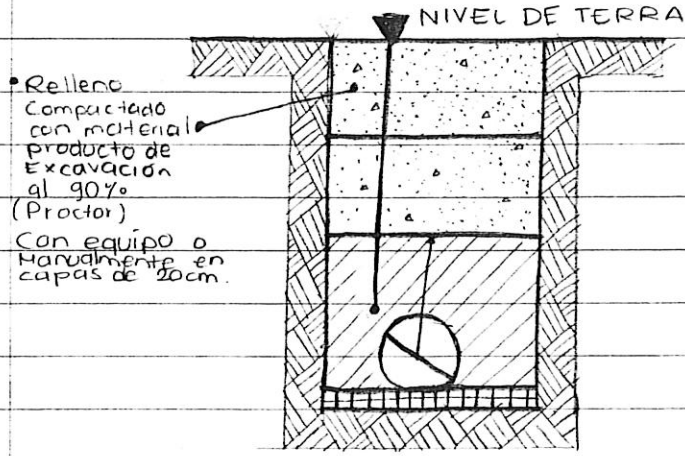

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES

Arq. Alonso Serrato V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000190

Nota 14

Jueves 14 de Junio del 2018.

- Se realiza el retiro de material excedente de la Obra.
- Se continua con la construcción de la Red de Agua Potable en la calle Porfirio Díaz.

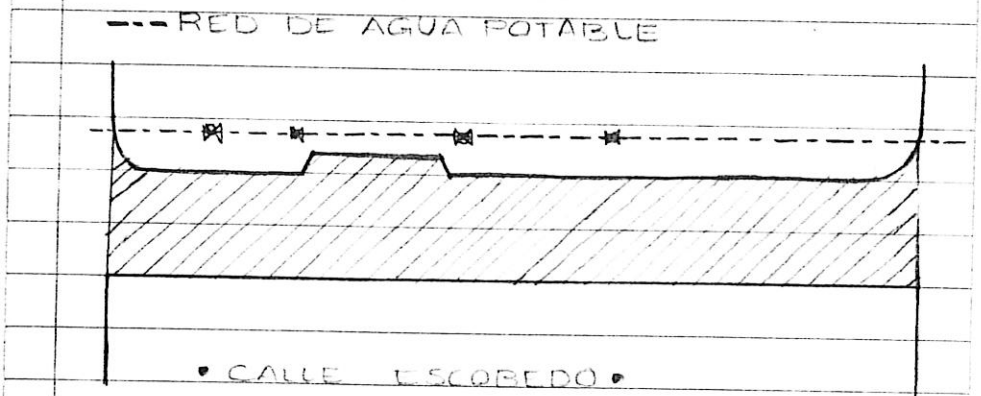

- Se comienza la demolición de piso de cemento y/o banqueta de 8cm (espesor), No Incluye el firme. Incluye: localización de ejes de bancos de nivel.

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000191

Nota 15.

Lunes 18 de Junio del 2018.

- Se comenzó la excavación de la linea de Agua Potable con máquinaria en terreno tipo "B" de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad.

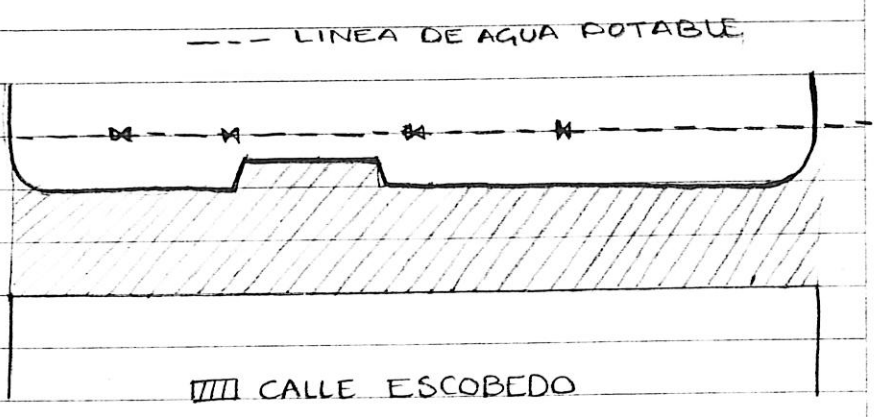

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000192

Nota 16

Jueves 21 de Junio del 2018

- Se retira el material producto de de la excavación en camión volteo o de plataforma fuera de la Obra.
- Se comienza con el afine de taludes y fondo de cepa a mano en material "B" en seco.

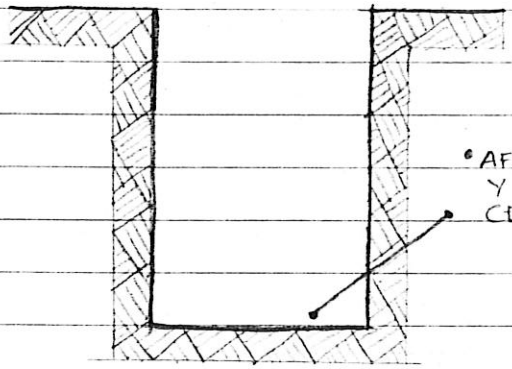

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES.

Arq. Alonso Serratos
Dir. de Obras Públicas

Arq. Federico S. M.
Residente de Obra.

00000193

Nota 17.

Lunes 25 de Junio del 2018.

- Se concluye con el afine de talud y fondo de cepas.
- Se comienza el tendido de cama de arena de río para recibir tubería de concreto. (Incluye material.) Espesor 10 cm.
- Se acarrea más arena de río para el tendido de cama para recibir tubería.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS M.P.A.L.

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico S.M
Residente de Obra.

0000194

Nota 18.

Lunes 02 de Julio del 2018.

- Se concluye con el tendido de cama de arena de río para reabrir tubería.
- Se comienza con la colocación de tubo PVC hidraulico de 3" de diametro RD=26 (Línea de Agua Potable).

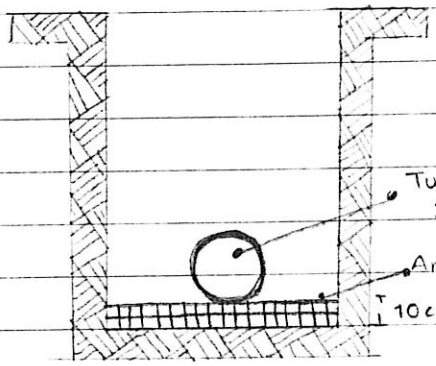

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000135

Nota 19.

Jueves 05 de Julio del 2018.

- Se comienza la construcción de cajas para válvulas tipo 1-1-A. Incluye: Trazo, nivelación, excavación, Plantilla de piedra braza, piso de concreto simple, muro de tezon a base de block de cemento cadena de repartición, aplanado en muros, losa de concreto reforzado, contra marco sencillo de 4" x 1.40 ML (Centrado), tapa de FoFo c/marco metalico de 50 x 50 cms. Tipo STANDART, Relleno y Compactación c/material producto de la excavación y retiro de material excedente de la Obra.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL

Arq. Alonso Serrato S.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000196

Nota 20.

Viernes 06 de Julio del 2018

- Se comienza la elaboración de tomas domiciliarias de (3mts) con tubería y conexiones de cobre de 1/2" de diam. Incluye abrazadera de P.V.C. de 2 1/2 de diametro, trazo y nivelación, excavación, tendido de manguera RD 8 1/2" Terraplen y compactación.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000197

Nota 21.

Jueves 12 de Julio del 2018.

- Se continua con la elaboración de tomas domiciliarias con tubería y conexiones.
- Se comienza el acarreo de material producto de la excavación para la calle Porfirio Díaz (Relleno y Compactación).

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000138

Nota 22.

Lunes 16 de Julio del 2018

- Se comienza con el Relleno y la Compactación con material producto de la excavación en capas no mayores de 20cms. Con humedad Optima y pizon de mano.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL.

Arq. Alonso Serrato V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000139

Nota 23.

Jueves 19 de Julio del 2018.

- Se continua con el relleno y compactación con material producto de la excavación en capas no mayores de 20cms. con humedad optima y pizón de mano.
- Posteriormente al relleno y la compactación se comienza el retiro de material excedente de la Obra en camión volteo o de plataforma.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000200

Nota 24

Viernes 20 de Julio del 2018

- Se concluye la elaboración de la Red de Agua Potable.
- Se comienza trazo y nivelación en campo y se comienza con la preparación de cajon para colocación de base y pavimento hidraulico.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000201

Nota 25.

Martes 24 de Julio del 2018

- Se comienza con la elaboración de base para pavimento con material de banco (grava-arena) compactada al 95% Proctor, Incluye: suministro, colocación y nivelación, compactación. Acarreo de los materiales al sitio de su utilización, espesor 20cms.

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq Federico S. M.
Resdente de obra.

00000202

Nota 26

Viernes 27 de Julio del 2017.

- Se comienza con la elaboración de machueio de concreto tipo L, pecho paloma, hecho en obra de $F'c = 200\ kg/cm^2$, medidas 40 x 40. Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000203

Nota 27.

Miercoles 01 de Agosto del 2018

- Se comienza con el pavimento de concreto estampado de 250 kg/cm², color ocre, agregado máximo de 3/8, RR 28 días, de 20cm de espesor. Incluye cimbra y descimbrado de fronteras.

Arq Alonso Serratos V. Arq. Federico S. M
Dir. de Obras Públicas. Residente de Obra.

00000204

Nota 28

Lunes 06 de Agosto del 2018.

- Se comienza con el colado de banqueta de concreto estampado de 200 kg/cm², agregado máximo de 3/8", RR 28 días, de 8cms. de espesor incluye nivelación y compactación de piso, hechura de concreto, acarreo de concreto, colocación, picado, terminado martenilado de banqueta.

Arq. Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq. Federico S. M.
Residente de Obra.

00000205

Nota 29

Jueves 29 de Agosto del 2018.

- Se comienza con el colado de rampas de concreto para discapacitados ($F'c = 150 kg/cm^2$) Espesor = 8cms. Incluye forjado, cimbrado y colado, acabado escobillado con una pendiente mínima de 4% y máxima 10% con señalización visual y táctil. Ancho mínimo libre de rampa para circular de 0.90 mts, con acabado final antiderrapante.

Arq Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq Federico Sanchez M.
Residente de obra.

00000206

Nota 30

Lunes 13 de Agosto de 2018

- Se comienza con el corte de losas de concreto en pavimentos de 8 a 15cm de espesor con cortadora de disco.

Arq Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq. Federico Sanchez M
Residente de Obra

00000207

Nota 31

Jueves 16 de Agosto del 2018.

- Se comienza con el calafateo de concreto hidraulica con sellador de poliuretano. Incluye raspado de poliuretan o poliestireno en junta de 0.50 ML por 2cm

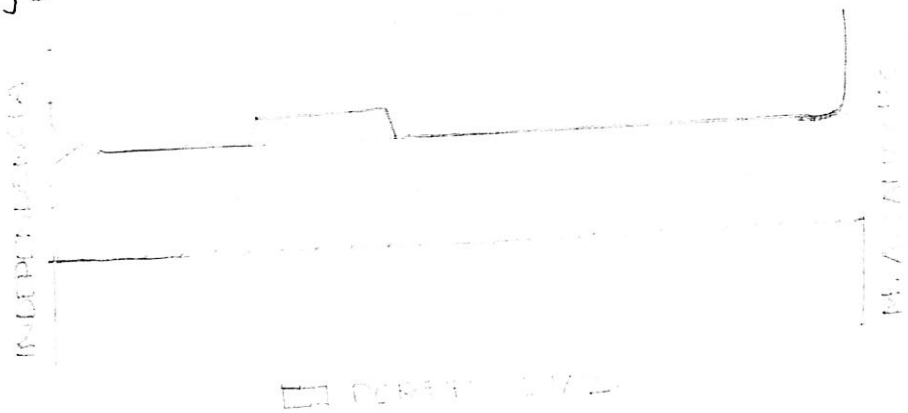

Arq Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas

Arq. Federico Sanchez M.
Residente de Obra.

00000208

Nota 32.

Miercoles 22 de Agosto del 2018.

- Se comienza la limpieza general de la Obra. Incluyendo barrido y retiro de material producto de la limpieza.

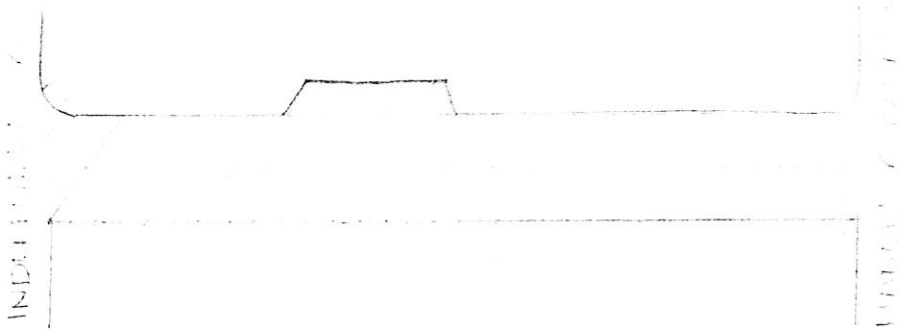

Arq Alonso Serratos V.
Dir. de Obras Públicas.

Arq Federico Sanchez M
Residente de Obra.

00000209

SAYULA

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
2015 – 2018

PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

FOTO 1 DEMOLICION CON EXCAVADORA ROTOMARTILLO DEL PAVIMENTO EXISTENTE

00000210

FOTO 2 CONSTRUCCION DE PLANTILLA PARA POZO DE VISITA

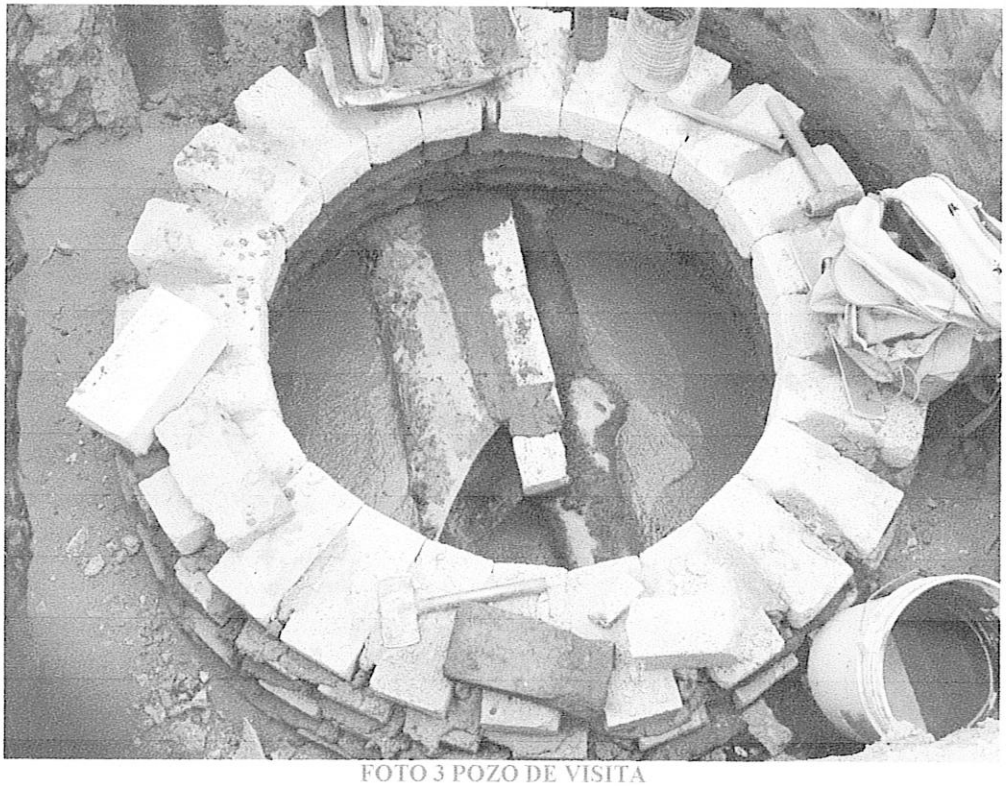

FOTO 3 POZO DE VISITA

00000211

FOTO 4 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS

FOTO 5 NIVELACION DE BASE

00000212

FOTO 6 COSNTRUCCION DE MACHUELO PECHO PALOMA

FOTO 7 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F´C=250KG/CM2, TERMINADO ESTAMPADO.

00009213

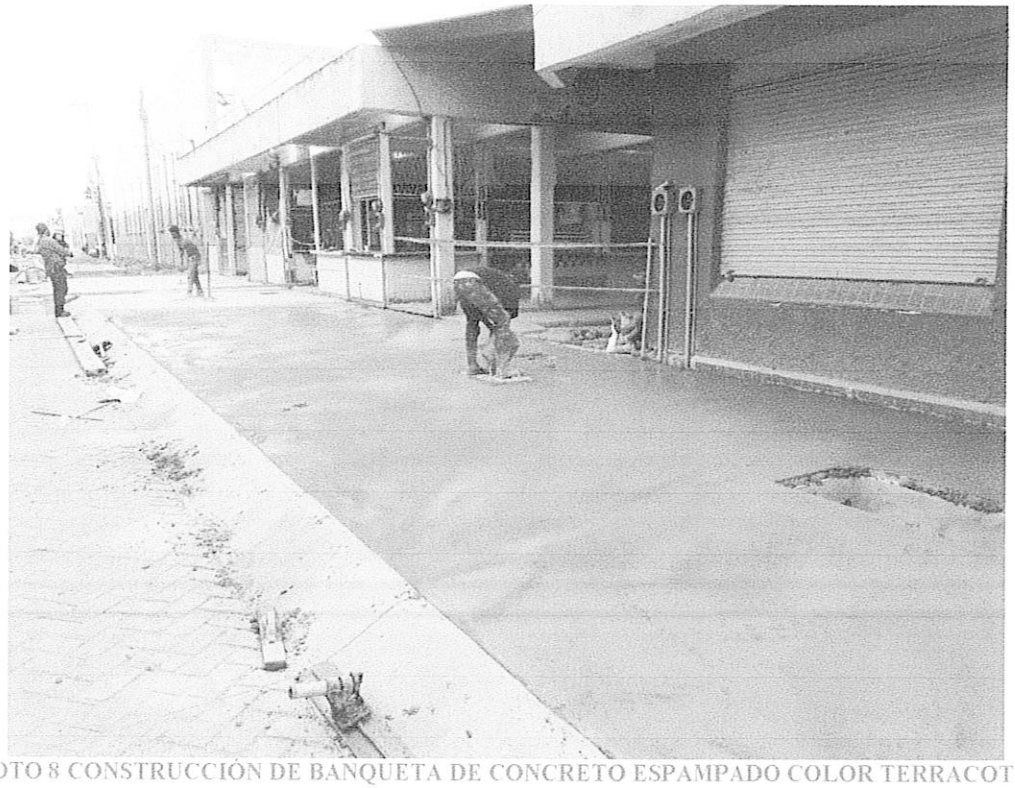

FOTO 8 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ESPAMPADO COLOR TERRACOTA.

FOTO 9 COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS Y TRABAJOS PREVIOS PARA LINEA SUBTERRANEA DE ELECTRICIDAD.

00000214

MUNICIPIO: SAYULA JALISCO

ESTADO DE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL GASTO:

2018

PROGRAMA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

SUBPROGRAMA

Nº OFICIO DE APROBACION Nº DE OBRA

DESCRIPCIC PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO

ANEXO	RUBRO AFECTADO		APROBADO	LIBERADO	%	
INGRESOS						
I 1	**APORTACION FEDERAL**	☐	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	%
I 2	**APORTACION ESTATAL**	☐	0.00	0.00	0.00	%
I 3	**APORTACION MUNICIPAL**	☐	0.00	0.00	0.00	%
I 4	**BENEFICIARIOS**	☐	0.00	0.00	0.00	%
I 5	**OTROS** _____ (ESPECIFICAR)	☐	0.00	0.00	0.00	%
		SUMA DE LOS INGRESOS	**1,483,500.00**	**1,483,500.00**	**100.00**	**%**
EGRESOS						
E 1	**JORNALES (SUELDOS)**	☐	299,374.94	299,374.94	20.18	%
E 2	**NOMINAS O DESTAJOS**	☐	0.00	0.00	0.00	%
E 3	**SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)**	☐	0.00	0.00	0.00	%
E 4	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	☐	104,416.80	104,416.80	7.04	%
E 5	**MATERIALES E INSUMOS (MATERIALES DIRECTOS)**	☐	1,090,070.25	1,090,070.25	73.48	%
E 6	**MATERIALES INDIRECTOS (EQUIPO MENOR)**	☐	0.00	0.00	0.00	%
E 7	**ORDENES DE PAGO**	☐	0.00	0.00	0.00	%
E 8	**ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO**	☐	0.00	0.00	0.00	%
E 9	**CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA**	☐	0.00	0.00	0.00	%
E 10	**BENEFICIARIOS OPCIONES PRODUCTIVAS**	☐	0.00	0.00	0.00	%
E 11	**OTROS**	☐	0.00	0.00	0.00	%
		SUMA DE LOS EGRESOS		**1,493,861.99**	100.70	
E 12	**REINTEGROS**	☐	-10,361.99		-0.70	%
		SUMA GENERAL		**1,483,500.00**	**100.00**	**%**

SELLO DE RECIBIDO

PRESIDENTE MUNICIPAL **TESORERO (A)** **ENCARGADO DE OBRA**

0000216

ANEXO DE EGRESOS **E 1**

JORNALES

Nº SEMANAS	PERIODO DE SEMANA DEL	AL	CHEQUE DE PAGO	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	IMPORTE
16	12-abr-18	18-abr-18	3	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
16	12-abr-18	18-abr-18	3	QUITAR TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS, DEMOLICION DE MACH	5,102.04
16	12-abr-18	18-abr-18	3	DEMOLICION DE MACHUELO	4,000.00
17	19-abr-18	25-abr-18	4	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
17	19-abr-18	25-abr-18	4	DIVERSAS ACTIVIDADES	12,230.59
18	26-abr-18	02-may-18	5	DIVERSAS ACTIVIDADES	12,230.59
18	26-abr-18	02-may-18	5	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
19	03-may-18	09-may-18	8	DIVERSAS ACTIVIDADES	12,075.97
19	03-may-18	09-may-18	8	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
20	10-may-18	16-may-18	11	DIVERSAS ACTIVIDADES	12,230.59
20	10-may-18	16-may-18	11	DIVERSAS ACTIVIDADES	2,575.05
20	10-may-18	16-may-18	11	DIVERSAS ACTIVIDADES	9,200.00
21	17-may-18	23-may-18	12	DIVERSAS ACTIVIDADES	12,230.59
21	17-may-18	23-may-18	12	DIVERSAS ACTIVIDADES	7,193.97
21	17-may-18	23-may-18	12	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
22	24-may-18	30-may-18	13	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
22	24-may-18	30-may-18	13	DIVERSAS ACTIVIDADES	12,029.31
22	24-may-18	30-may-18	13	DIVERSAS ACTIVIDADES	3,247.90
23	31-may-18	06-jun-18	15	DIVERSAS ACTIVIDADES	13,854.54
23	31-may-18	06-jun-18	15	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
24	07-jun-18	13-jun-18	17	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
24	07-jun-18	13-jun-18	17	DIVERSAS ACTIVIDADES	13,854.54
25	14-jun-18	20-jun-18	20	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
25	14-jun-18	20-jun-18	20	DIVERSAS ACTIVIDADES	13,854.54
26	21-jun-18	27-jun-18	22	DIVERSAS ACTIVIDADES	13,653.26
26	21-jun-18	27-jun-18	22	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
27	28-jun-18	04-jul-18	25	DIVERSAS ACTIVIDADES	13,699.92
27	28-jun-18	04-jul-18	25	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
28	05-jul-18	05-jul-18	26	DIVERSAS ACTIVIDADES	13,854.54
28	05-jul-18	05-jul-18	26	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
29	12-jul-18	18-jul-18	28	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
29	12-jul-18	18-jul-18	28	DIVERSAS ACTIVIDADES	10,606.64
30	19-jul-18	25-jul-18	29	DIVERSAS ACTIVIDADES	10,606.64
30	19-jul-18	25-jul-18	29	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
31	26-jul-18	01-ago-18	30	DIVERSAS ACTIVIDADES	10,452.02
31	26-jul-18	01-ago-18	30	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
32	02-ago-18	08-ago-18	35	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
32	02-ago-18	08-ago-18	35	DIVERSAS ACTIVIDADES	10,606.64
32	02-ago-18	08-ago-18	39	DIVERSAS ACTIVIDADES	566.74
33	09-ago-18	15-ago-18	39	DIVERSAS ACTIVIDADES	11,433.07
34	09-ago-18	15-ago-18	39	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
34	16-ago-18	22-ago-18	43	DIVERSAS ACTIVIDADES	11,634.35
34	16-ago-18	22-ago-18	43	RESIDENTE DE OBRA	2,575.05
				SUMA DE JORNALES	299,374.94

MONTO APROBADO	299,374.94

00002916

BBVA Bancomer

CHEQUE NOMINATIVO

25299632

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha 26 de abril de 2018

$ 11,677.09

CON LETRA: (ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.)

Moneda Nacional

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

8985 513 200 170 00111654020 0000003

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 3

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA AVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2018.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		11,677.09	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			11,677.09
		SUMAS IGUALES			

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

002978

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
				11,677.09	11,677.09

00000217

m.m.l. L.C.A.G.R. Impresos JEC P-1013NCR C.I.J.C.A.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

(1)

ORDEN DE PAGO SAY 24768

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 11,677.09

** Once Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 09/100 M.N.**

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16. DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2018.

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 26 de ABRIL de 2018

002979

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00000218

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	SEMANA Nº 16
FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA N° 16

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	QUITAR TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS, DEMOLICION DE MACHUELO,	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	QUITAR TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS, DEMOLICION DE MACHUELO,	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A.
JOSE DE JESUS MONTES MONTES	QUITAR TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS, DEMOLICION DE MACHUELO,	$ 253.09	5	$ 1,265.45	$ 210.91	$ -	$ 53.69	$ 1,422.67	José de Jesús Montes M
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	QUITAR TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS, DEMOLICION DE MACHUELO,	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador P
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 4,498.07	$ 749.68	$ 55.66	$ 201.37	$ 5,102.04	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

1862000

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO	ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
FORMULO	Vo. Bo.	REVISO	AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL. — DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	**SEMANA N° 16**
FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL	FIRMA DEL TRABAJADOR
J. JESUS LOPEZ ORDUÑEZ	DEMOLICION DE MACHUELO	100	M2	$ 40.00	$ 4,000.00	

LA CANTIDAD: CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. **TOTAL:** $ 4,000.00

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FORMULO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00002982

00002982

BBVA Bancomer

18146471 COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha 26 de abril de 2018

$ 14,805.64

CON LETRA (CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 64/100 M.N.) Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

0 24 51: 5 13 200 170: 00 11 16 540 20 "0000004

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 4

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2018

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		14,805.64	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			14,805.64
			SUMAS IGUALES		

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

002984

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
				14,805.64	14,805.64

00000222

m.m.l. L.C.A.G.R. Impresos JEC P-1013NCR C.I.J.C.A.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 24769

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 14,805.64

** Catorce Mil Ochocientos Cinco Pesos 64/100 M.N.**

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17. DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2018.

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 26 de ABRIL de 20 18

C. ING. JORGE CASTROS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C.ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

002985

HACIENDA MPAL SAYULA. JAL.

00000223

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	SEMANA Nº 17
FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	DEL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

0000224

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA N° 17

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	DEMOLICION DE MACHUELO, EXCAVACION DE CEPA PARA INSTALACION DE DRENAJE, AFINE DE TALUDES.	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	DEMOLICION DE MACHUELO, EXCAVACION DE CEPA PARA INSTALACION DE DRENAJE, AFINE DE TALUDES.	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A.
JOSE DE JESUS MONTES MONTES	DEMOLICION DE MACHUELO, EXCAVACION DE CEPA PARA INSTALACION DE DRENAJE, AFINE DE TALUDES.	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Jose de Jesus Montes M.
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	DEMOLICION DE MACHUELO, EXCAVACION DE CEPA PARA INSTALACION DE DRENAJE, AFINE DE TALUDES.	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador P.
ROSALIO RAMOS GOMEZ	DEMOLICION DE MACHUELO, EXCAVACION DE CEPA PARA INSTALACION DE DRENAJE, AFINE DE TALUDES.	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	DEMOLICION DE MACHUELO, EXCAVACION DE CEPA PARA INSTALACION DE DRENAJE, AFINE DE TALUDES.	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrique Fajardo
OSCAR MADRUEÑO AYALA	DEMOLICION DE MACHUELO, EXCAVACION DE CEPA PARA INSTALACION DE DRENAJE, AFINE DE TALUDES.	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar Madrueño
GUSTAVO SOTO CAMPOS	DEMOLICION DE MACHUELO, EXCAVACION DE CEPA PARA INSTALACION DE DRENAJE, AFINE DE TALUDES.	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo S.
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	DEMOLICION DE MACHUELO, EXCAVACION DE CEPA PARA INSTALACION DE DRENAJE, AFINE DE TALUDES.	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 11,020.86	$ 1,836.81	$ 111.32	$ 738.40	$ 12,230.59	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

BBVA Bancomer

31879446

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha 3 de mayo de 2018

$ 14,805.64

(CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 64/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

⑈9038⑈ ⑆196⑈513200170⑆00111654020⑈0000005

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 5

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18. DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2018

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		14,805.64	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			14,805.64
			SUMAS IGUALES		

SECRETARIA GENERAL

002838

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
				14,805.64	14,805.64

00000220

m.m.l. L.C.A.G.R C.I.J.C.A.

Impresos JEC P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

1

ORDEN DE PAGO SAY 24776

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 14,805.64

** Catorce Mil Ochocientos Cinco Pesos 64/100 M.N.**

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18. DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2018.

002839

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 03 de MAYO de 2018

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C.A. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00000227

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA Nº 18

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE, POZOS DE VISITA, AFINE DE TALUDES, COLOCACION DE TUBERIA DE 12"	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE, POZOS DE VISITA, AFINE DE TALUDES, COLOCACION DE TUBERIA DE 12"	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A
JOSE DE JESUS MONTES MONTES	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE, POZOS DE VISITA, AFINE DE TALUDES, COLOCACION DE TUBERIA DE 12"	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Jose De Jesus Montes
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE, POZOS DE VISITA, AFINE DE TALUDES, COLOCACION DE TUBERIA DE 12"	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador
ROSALIO RAMOS GOMEZ	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE, POZOS DE VISITA, AFINE DE TALUDES, COLOCACION DE TUBERIA DE 12"	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE, POZOS DE VISITA, AFINE DE TALUDES, COLOCACION DE TUBERIA DE 12"	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	E. Peña
OSCAR MADRUEÑO AYALA	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE, POZOS DE VISITA, AFINE DE TALUDES, COLOCACION DE TUBERIA DE 12"	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
GUSTAVO SOTO CAMPOS	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE, POZOS DE VISITA, AFINE DE TALUDES, COLOCACION DE TUBERIA DE 12"	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo Soto C.
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE, POZOS DE VISITA, AFINE DE TALUDES, COLOCACION DE TUBERIA DE 12"	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 11,020.86	$ 1,836.81	$ 111.32	$ 738.40	$ 12,230.59	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA N° 18

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	$2,575.05	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

1782.30

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR — FORMULO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO — Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ — REVISO

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR — AUTORIZO

00000220

BBVA Bancomer

28353856

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha 10 de mayo de 2018

$ 14,651.02

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

6271 513200170 00111654020 00000008

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REC 2018	00111654020	CH 8

CONCEPTO DEL PAGO: SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2018

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 24805

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 14,651.02

La cantidad de $ _____

** Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 02/100 M.N.**

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19. DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2018.

002850

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 10 de MAYO de 20 18

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

L.C.ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00000231

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA N° 19

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 3 AL 9 DE MAYO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE,COLOCACION DE TUBERIA DE 12", RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, CONST. DE POZOS DE VISITA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella P.
PEDRO BRISEÑO ALFARO	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE,COLOCACION DE TUBERIA DE 12", RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, CONST. DE POZOS DE VISITA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A.
JOSE DE JESUS MONTES MONTES	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE,COLOCACION DE TUBERIA DE 12", RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, CONST. DE POZOS DE VISITA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Jose de Jesus Montes
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE,COLOCACION DE TUBERIA DE 12", RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, CONST. DE POZOS DE VISITA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador P.
ROSALIO RAMOS GOMEZ	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE,COLOCACION DE TUBERIA DE 12", RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, CONST. DE POZOS DE VISITA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE,COLOCACION DE TUBERIA DE 12", RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, CONST. DE POZOS DE VISITA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE,COLOCACION DE TUBERIA DE 12", RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, CONST. DE POZOS DE VISITA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar Madrueño
GUSTAVO SOTO CAMPOS	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE,COLOCACION DE TUBERIA DE 12", RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, CONST. DE POZOS DE VISITA	$ 142.84	5	$ 714.20	$ 119.03	$ 39.86	$ -	$ 873.09	Gustavo Soto C.
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	EXCAVACION DE CEPAS PARA RAMALES DE DRENAJE,COLOCACION DE TUBERIA DE 12", RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, CONST. DE POZOS DE VISITA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 10,878.02	$ 1,813.00	$ 123.35	$ 738.40	$ 12,075.97	

16 MAY 2018

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
M.C.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HAC. ENDA MPAL. SAYULA, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA Nº 19

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 3 AL 9 DE MAYO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$ 374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR — FORMULO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO — Vo. Bo

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ — REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR — AUTORIZO

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL

BBVA Bancomer

41196391 COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha 17 de mayo de 2018

$ 24,005.64

CON LETRA (VEINTICUATRO MIL CINCO PESOS 64/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

9589: 513200170:00111654020 20: 00000111

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
BANCOMER	1116540 **20**	**11**

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA /IMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20. DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2018.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		24,005.64	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			24,005.64
				SUMAS IGUALES	

002867

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
				24,005.64	24,005.64

00000234

m.m.l. L.C.A.I.G.R. JEC P.C.I.J.C.A.R.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 24804

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 24,005.64

** Veinticuatro Mil Cinco Pesos 64/100 M.N.**

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20. DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2018. 002868

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018 (SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 17 de MAYO de 20 18

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00000235

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA Nº 20

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 10 AL 16 DE MAYO DEL 2018

C0000236

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", PELLENO Y COMPACTACION	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", PELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A
JOSE DE JESUS MONTES MONTES	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", PELLENO Y COMPACTACION	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Jose de Jesus Montes S
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", PELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador P
ROSALIO RAMOS GOMEZ	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", PELLENO Y COMPACTACION	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", PELLENO Y COMPACTACION	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
OSCAR MADRUEÑO AYALA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", PELLENO Y COMPACTACION	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar M.
GUSTAVO SOTO CAMPOS	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", PELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo Soto C.
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", PELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 11,020.86	$ 1,836.81	$ 111.32	$ 738.40	$ 12,230.59	

ANEXO DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO	ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
FORMULO	Vo. Bo.	REVISO	AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL. HACIENDA MPAL SAYULA JAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL

CARTA-PODER

18 de Mayo de 20 18

Sr. H. Ayuntamiento de Sayula

P r e s e n t e .

Por la presente otorgo al Sr. Federico Sanchez Munguia poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación reciba mi pago de la semana del 10 al 16 de mayo

y asimismo para que conteste las demandas y reconvenciones que se entablen en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, artícule y absuelva posiciones, recuse Jueces superiores o inferiores, oiga autos interlocutorios y definitivos, consienta a los favorables y pida revocación por contrario imperio, apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargos que contra mí se decreten, pida el remate de los bienes embargados, nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, transe este juicio, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decisión de los Jueces, árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantía, y en fin, para que promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos, así como para que sustituya este poder ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este particular.

00238

Suyo afmo. S.S.

ACEPTO EL PODER,

OTORGANTE,

Enrique Fajardo Peña

TESTIGO,

Rosalío Ramos R.

TESTIGO;

Juan José Estrella Peña

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

00000237

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	SEMANA N° 20
FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	DEL 10 AL 16 DE MAYO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR	ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO	L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ	ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
FORMULO	Vo. Bo.	REVISO	AUTORIZO

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

00000223

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	**SEMANA N° 20**
FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	DEL 10 al 16 DE MAYO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL	FIRMA DEL TRABAJADOR
DANIEL ZENON ANTONIA	EXCAVACION	40	M3	$ 50.00	$ 2,000.00	
	DEMOLICION DE MACHUELO	120	ML	$ 30.00	$ 3,600.00	
	DEMOLICION BANQUETA	120.00	M2	$ 30.00	$ 3,600.00	

LA CANTIDAD NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **TOTAL:** $ 9,200.00

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
FORMULO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

9,200.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

0000229

BBVA Bancomer

35952862 COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha 24 de mayo de 2018

$ 21,996.61

CON LETRA (VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

4566 513200 170 00111654020 00000012

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 12

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA VIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21. DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2018.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		21,996.61	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			21,996.61
			SUMAS IGUALES		

00287

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO: 21,996.61	POLIZA N° 21,996.61

m.m.l. L.C.A.G.R. JEC P-011/JCA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 24803

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 21,996.69

** Veintiun Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 69/100 M.N.**

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21. DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2018.

SECRETARIA GENERAL

002875

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018
(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 24 de MAYO de 20 18

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
* PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

000024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	SEMANA N° 21
FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella P.
PEDRO BRISEÑO ALFARO	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A
JOSE DE JESUS MONTES MONTES	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Jose de Jesus Montes
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador P.
ROSALIO RAMOS GOMEZ	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrique Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar Madrueño
GUSTAVO SOTO CAMPOS	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo S.
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, ENCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 11,020.86	$ 1,836.81	$ 111.32	$ 738.40	$ 12,230.59	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA Nº 21

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR
MARCO ALEXIS PONCE BERNABE	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, EXCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71
GUSTAVO HERNANDEZ LARIOS	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, EXCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71
DIEGO ARMANDO MARTINEZ AYALA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, EXCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71
CRISTOBAL SIERRA GONZALEZ	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, EXCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71
GUADALUPE VALDEZ BARRAZA	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, EXCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71
ALBERTO CARRION BARTOLO	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, EXCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71
ANTONIO DE JESUS VARGAS	ENCAVACION Y CONSTRUCCION DE POZOS Y VISITA, EXCAVACION PARA COLOC DE RAMALES, INSTALACION DE RAMALES DE 6", RELLENO Y COMPACTACION	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 5,999.28	$ 999.88	$ 194.81	$ -	$ 7,193.97

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA Nº 21

DEL 17 AL 23 DE MAYO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	$2,575.05	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

00287 8200

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA, JAL.

BBVA Bancomer

27553271

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha 1 de junio de 2018

$ 17,852.26

CON LETRA (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) Moneda Nacional

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

0 10 11: 5 13 200 170 1:00 1 1 16 540 20 11" 00000 13

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 13

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 2018.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		17,852.26	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			17,852.26
			SUMAS IGUALES		

SECRETARIA GENERAL

001933

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
				17,852.26	17,852.26

00000245

Impresos JEC® P-1013NCB L.C.O.A.G.R C.I.J.C.A.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

(1)

ORDEN DE PAGO SAY 25793

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____ del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 17,852.26

(DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22. DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 2018.

SECRETARIA GENERAL

001934

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EEECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 01 de JUNIO de 20 18

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA JAL.

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

00009246

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA N° 22

DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD									
		TOTAL		$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001935

00002247

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA N° 22

DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2018

00002248

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	AFINE DE TALUDES PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA, ENCAVACION PARA CONST. DE CAJAS DE VALVULAS, Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN CAJA DE VALVULAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	AFINE DE TALUDES PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA, ENCAVACION PARA CONST. DE CAJAS DE VALVULAS, Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN CAJA DE VALVULAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A.
JOSE DE JESUS MONTES MONTES	AFINE DE TALUDES PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA, ENCAVACION PARA CONST. DE CAJAS DE VALVULAS, Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN CAJA DE VALVULAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	AFINE DE TALUDES PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA, ENCAVACION PARA CONST. DE CAJAS DE VALVULAS, Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN CAJA DE VALVULAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxed. Labrador P.
ROSALIO RAMOS GOMEZ	AFINE DE TALUDES PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA, ENCAVACION PARA CONST. DE CAJAS DE VALVULAS, Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN CAJA DE VALVULAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	AFINE DE TALUDES PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA, ENCAVACION PARA CONST. DE CAJAS DE VALVULAS, Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN CAJA DE VALVULAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrrique Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	AFINE DE TALUDES PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA, ENCAVACION PARA CONST. DE CAJAS DE VALVULAS, Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN CAJA DE VALVULAS	$ 253.09	5	$ 1,265.45	$ 210.91	$ -	$ 53.69	$ 1,422.67	Oscar Madrueño
GUSTAVO SOTO CAMPOS	AFINE DE TALUDES PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA, ENCAVACION PARA CONST. DE CAJAS DE VALVULAS, Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN CAJA DE VALVULAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo S.
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	AFINE DE TALUDES PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA, ENCAVACION PARA CONST. DE CAJAS DE VALVULAS, Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN CAJA DE VALVULAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 10,767.77	$ 1,794.63	$ 111.32	$ 644.41	$ 12,029.31	

001936

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

CARTA PODER

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: SAYULA — DIA 01 — MES JUNIO — AÑO 2018

Sr.( ): H. AYUNTAMIENTO SAYULA
PRESENTE

POR LA PRESENTE OTORGO(AMOS) AL (A)
Sr.( ): FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA
PODER AMPLIO:CUMPLIDO Y BASTANTE PARA QUE A MI (NUESTRO) NOMBRE Y REPRESENTACION
PARA COBRAR LA SEMANA 24 MAYO – 30 MAYO 2018

001937

y así mismo para que conteste las demandas y reconvenciones que se entablen en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, articule y absuelva posiciones, recuse Jueces superiores o inferiores, oiga autos interlocutorios y definitivos, consienta de los favorables y pida revocación por contrario imperio apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las sentencias, ejecute, embargue y me represente en los embargos que contra mí se decreten, pida el remate, de los bienes embargados; nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, trance este juicio, perciba valores, y otorgue recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decisión de Jueces árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías, y en fin, para que promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos así como para que sustituya este poder; ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este particular.

Atentamente

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

NOMBRE Y DOMICILIO DEL ACEPTANTE
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA
FIRMA
ACEPTO

NOMBRE Y DOMICILIO DEL OTORGANTE
JOSE DE JESUS MONTES MONTES
FIRMA
JOSE DE JESUS MONTES MONTES
OTORGO

NOMBRE Y DOMICILIO DEL TESTIGO
Jonathan Juan Madrueño Ayala.
FIRMA
Jonathan M.

NOMBRE Y DOMICILIO DEL TESTIGO
Paola Isabel P
FIRMA
Paola Isabel P

000002249

USE LETRA DE MOLDE O MAQUINA DE ESCRIBIR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA Nº 22

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2018

00099250

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JOSUE YERAN MEDRANO ROJAS	AFINE DE TALUDES PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA, ENCAVACION PARA CONST. DE CAJAS DE VALVULAS, Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN CAJA DE VALVULAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Josue Yeran M R
GERARDO ALVARADO ECHAURI	AFINE DE TALUDES PARA COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA, ENCAVACION PARA CONST. DE CAJAS DE VALVULAS, Y COLOCACION DE TOMAS DE AGUA, RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN CAJA DE VALVULAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 3,037.08	$ 506.18	$ -	$ 295.36	$ 3,247.90	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001938

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL

BBVA Bancomer

6341748 7

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha 7 de junio de 2018

$ 16,429.59

CON LETRA (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

5778 513 200 170 00 111 654 020 00000 15

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 15

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23. DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2018.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		16,429.59	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			16,429.59
			SUMAS IGUALES		

001949

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
				16,429.59	16,429.59

00000251

Impresos JEC P-1013NCR m.m.l. L.C.A.G.R C.I.J.C.A.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 25792

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 16,429.59

(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23. DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2018.

001950 ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 07 de JUNIO de 20 18

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00000252

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA Nº 23

DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A.
JOSUE YERAN MEDRANO ROJAS	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Josue Yeran M R
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador P.
ROSALIO RAMOS GOMEZ	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrique Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
GUSTAVO SOTO CAMPOS	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo S.
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
GERARDO ALVARADO ECHAURI	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 12,539.40	$ 2,089.90	$ 111.32	$ 886.08	$ 13,854.54	

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
C.P.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

HACIENDA MPAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-201

00002253

001831

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA N° 23

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

0001952

0003254

BBVA Bancomer

23627675

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Fecha 14 de junio de 2018

$ 16,429.59

CON LETRA: (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

2905 513 200 170 00111654020 00000017

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 17

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2018.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		16,429.59	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			16,429.59
		SUMAS IGUALES			

001962

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
				16,429.59	16,429.59

00000255

m.m.l. L.C.A.G.R C.I.J.C.A.

Impresos JEC P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 25791

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 16,429.59

(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24. DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2018.

001963

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

SAYULA Jal., a 14 de JUNIO de 20 18

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00009256

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA Nº 24

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 7 AL 13 DE JUNIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
V. B°

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA

0001954

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA N° 24

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 7 AL 13 DE JUNIO DEL 2018

0000258

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella P.
PEDRO BRISEÑO ALFARO	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A.
JOSUE YERAN MEDRANO ROJAS	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Josue Yeran M R
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador P
ROSALIO RAMOS GOMEZ	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrrique Fajardo P
OSCAR MADRUEÑO AYALA	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
GUSTAVO SOTO CAMPOS	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo S.
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
GERARDO ALVARADO ECHAURI	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, ENCAVACION PARA INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS, RELLENO Y COMPACTACION,INST. TOMAS HIDRAULICAS Y VALVULAS DE COMPUERTAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 12,539.40	$ 2,089.90	$ 111.32	$ 886.08	$ 13,854.54	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
V°.B°.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
C.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

BBVA Bancomer

63264423

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Fecha 21 de junio de 2018

$ 16,429.59

CON LETRA (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

3874 5 13 200 170 00 1116540 20 00000 20

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	00111654020	CH 20

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA AVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25. DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2018.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		16,429.59	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			16,429.59
			SUMAS IGUALES		

001979

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
				16,429.59	16,429.59

m.m.l. L.C.A.G.R. JEC P-1913NCR OFICIA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

1

ORDEN DE PAGO SAY 25790

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 16,429.59

(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25. DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2018.

001980

SECRETARIA GENERAL

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 21 de JUNIO de 20 18

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C.A. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00000260

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA N° 25

DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD									
		TOTAL		$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
V°. B°.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
C.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA N° 25

DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS Y DE VALVULAS DE COMPUERTA, RELLENO, COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA GENERAL	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS Y DE VALVULAS DE COMPUERTA, RELLENO, COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA GENERAL	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A
JOSUE YERAN MEDRANO ROJAS	INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS Y DE VALVULAS DE COMPUERTA, RELLENO, COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA GENERAL	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Josue yeran M R
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS Y DE VALVULAS DE COMPUERTA, RELLENO, COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA GENERAL	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador R
ROSALIO RAMOS GOMEZ	INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS Y DE VALVULAS DE COMPUERTA, RELLENO, COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA GENERAL	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS Y DE VALVULAS DE COMPUERTA, RELLENO, COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA GENERAL	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrrique Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS Y DE VALVULAS DE COMPUERTA, RELLENO, COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA GENERAL	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar Madrueño
GUSTAVO SOTO CAMPOS	INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS Y DE VALVULAS DE COMPUERTA, RELLENO, COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA GENERAL	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo Sa
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS Y DE VALVULAS DE COMPUERTA, RELLENO, COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA GENERAL	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
GERARDO ALVARADO ECHAURI	INSTALACION DE TOMAS HIDRAULICAS Y DE VALVULAS DE COMPUERTA, RELLENO, COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA GENERAL	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Gerardo Alv E
LA CANTIDAD			TOTAL	$ 12,539.40	$ 2,089.90	$ 111.32	$ 886.08	$ 13,854.54	

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL SAYULA JAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

BBVA Bancomer

29815517

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Fecha 28 de junio de 2018

$ 16,228.31

CON LETRA (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

⑈9038⑈ ⑆513200170⑆00111654020⑈00000022

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	00111654020	CH 22

CONCEPTO DEL PAGO

GO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26. DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2018.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
3270 - 0300 - 6142					
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		16,228.31	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			16,228.31

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001991

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA N:
				16,228.31	16,228.31

m.m.l. L.C.A.G.R C.P.C.A

TEC P-2018/NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 25799

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 16,228.31

(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26. DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2018.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001992

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

SAYULA Jal., a 28 de JUNIO de 20 18

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

0000284

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — **SEMANA Nº 26**

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, LIMPIEZA GRAL	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, LIMPIEZA GRAL	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño.
JOSUE YERAN MEDRANO ROJAS	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, LIMPIEZA GRAL	$ 253.09	5	$ 1,265.45	$ 210.91	$ -	$ 53.69	$ 1,422.67	Josue Yeran M R
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, LIMPIEZA GRAL	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador
ROSALIO RAMOS GOMEZ	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, LIMPIEZA GRAL	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, LIMPIEZA GRAL	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrrique Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, LIMPIEZA GRAL	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar Madrueño
GUSTAVO SOTO CAMPOS	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, LIMPIEZA GRAL	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo Soto
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, LIMPIEZA GRAL	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
GERARDO ALVARADO ECHAURI	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS, LIMPIEZA GRAL	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 12,286.31	$ 2,047.72	$ 111.32	$ 792.09	$ 13,653.26	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR — FORMULO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO — Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ — REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR — AUTORIZO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACION DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	SEMANA N° 26
FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

BBVA Bancomer

98466393

COPIA DEL CHEQUE

5 de julio de 2018

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Fecha $ 16,274.97

CON LETRA: (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

⑈56 5⑈ 5 1 3 200 1 70⑈ 00 1 1 1 6 5 4 0 20⑈ 00000 25

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 25

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27. DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018 .

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		16,274.97	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			16,274.97
			SUMAS IGUALES	16,274.97	16,274.97

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

002949

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
m.m.l.	L.C.A.G.R	C.I.J.C.A.			00000267

Impresos JEC P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26363

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 16,274.97

(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27. DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018.

002950

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 05 de JULIO de 20 18

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00002955

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA Nº 27

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	COLOC. DE NIVELES PARA CORTE DE TERRACERIA, CORTE DE TERRACERIA EN LUGARES DONDE NO PUEDE LA MAQUINA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	COLOC. DE NIVELES PARA CORTE DE TERRACERIA, CORTE DE TERRACERIA EN LUGARES DONDE NO PUEDE LA MAQUINA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A.
JOSUE YERAN MEDRANO ROJAS	COLOC. DE NIVELES PARA CORTE DE TERRACERIA, CORTE DE TERRACERIA EN LUGARES DONDE NO PUEDE LA MAQUINA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Josue Yeran M. R.
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	COLOC. DE NIVELES PARA CORTE DE TERRACERIA, CORTE DE TERRACERIA EN LUGARES DONDE NO PUEDE LA MAQUINA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA	$ 142.84	5	$ 714.20	$ 119.03	$ 39.86	$ -	$ 873.09	Praxedis Labrador P.
ROSALIO RAMOS GOMEZ	COLOC. DE NIVELES PARA CORTE DE TERRACERIA, CORTE DE TERRACERIA EN LUGARES DONDE NO PUEDE LA MAQUINA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	COLOC. DE NIVELES PARA CORTE DE TERRACERIA, CORTE DE TERRACERIA EN LUGARES DONDE NO PUEDE LA MAQUINA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrique Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	COLOC. DE NIVELES PARA CORTE DE TERRACERIA, CORTE DE TERRACERIA EN LUGARES DONDE NO PUEDE LA MAQUINA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar Madrueño A.
GUSTAVO SOTO CAMPOS	COLOC. DE NIVELES PARA CORTE DE TERRACERIA, CORTE DE TERRACERIA EN LUGARES DONDE NO PUEDE LA MAQUINA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo Soto C.
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	COLOC. DE NIVELES PARA CORTE DE TERRACERIA, CORTE DE TERRACERIA EN LUGARES DONDE NO PUEDE LA MAQUINA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
GERARDO ALVARADO ECHAURI	COLOC. DE NIVELES PARA CORTE DE TERRACERIA, CORTE DE TERRACERIA EN LUGARES DONDE NO PUEDE LA MAQUINA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 12,396.56	$ 2,066.09	$ 123.35	$ 886.08	$ 13,699.92	

ESTE FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL MPIO. DE SAYULA, JAL. 2015-2018

ADMINISTRACIÓN

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL SAYULA

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

6926000

1506981

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA N° 27

DEL 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

BBVA Bancomer

CHEQUE POLIZA

38367173

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha 12 de julio de 2018

$ 16,429.59

CON LETRA: (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.) Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

A 709: 513 200 170: 00 111 654 020" 00000 26

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 26

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28. DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2018 .

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		16,429.59	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			16,429.59
			SUMAS IGUALES	16,429.59	16,429.59

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00954

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
m.m.l.	L.C.A.G.R.	C.I.J.C.A.			0000027

Impresos JEC P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26362

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 16,429.59

(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28, DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2018.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018 002055

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 12 de JULIO de 20 18

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

00000272

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — **SEMANA Nº 28**

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 5 AL 11 DE JULIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	LIMPIEZA DE CAJA DE VALVULAS, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	LIMPIEZA DE CAJA DE VALVULAS, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A.
JOSUE YERAN MEDRANO ROJAS	LIMPIEZA DE CAJA DE VALVULAS, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Josue Yeran M R
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	LIMPIEZA DE CAJA DE VALVULAS, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedes Labrador R
ROSALIO RAMOS GOMEZ	LIMPIEZA DE CAJA DE VALVULAS, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	LIMPIEZA DE CAJA DE VALVULAS, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrrique Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	LIMPIEZA DE CAJA DE VALVULAS, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar M.
GUSTAVO SOTO CAMPOS	LIMPIEZA DE CAJA DE VALVULAS, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo S.
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	LIMPIEZA DE CAJA DE VALVULAS, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
GERARDO ALVARADO ECHAURI	LIMPIEZA DE CAJA DE VALVULAS, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 12,539.40	$ 2,089.90	$ 111.32	$ 886.08	$ 13,854.54	

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

0000223

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ | SEMANA N° 28

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | DEL 5 AL 11 DE JULIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

BBVA Bancomer

24656249

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha 19 de julio de 2018

$ 13,181.69

CON LETRA (TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

0473 513200170 00111654020 00000028

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	11165 4020	CH 28

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29. DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2018 .

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		13,181.69	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			13,181.69
			SUMAS IGUALES	13,181.69	13,181.69

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

002065

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
m.m.l.	L.C.A.G.R.	C.I.J.C.A.			00000275

Impresos JEC P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

0

ORDEN DE PAGO SAY 26364

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 13,181.69

(TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 69/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29. DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2018.

002868

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 19 de JULIO de 20 18

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

0000276

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA Nº 29

DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD				TOTAL	$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA Nº 29

DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	RETIRO DE AGUA ESTANCADA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella P.
PEDRO BRISEÑO ALFARO	RETIRO DE AGUA ESTANCADA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A.
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	RETIRO DE AGUA ESTANCADA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	RETIRO DE AGUA ESTANCADA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedes Labrador P.
ROSALIO RAMOS GOMEZ	RETIRO DE AGUA ESTANCADA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	RETIRO DE AGUA ESTANCADA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrique Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	RETIRO DE AGUA ESTANCADA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar Mad.
GUSTAVO SOTO CAMPOS	RETIRO DE AGUA ESTANCADA, ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo Soto C.
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 9,502.32	$ 1,583.72	$ 111.32	$ 590.72	$ 10,606.64	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018 SAYULA, JAL.

H. HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 SAYULA, JAL.

03399278

BBVA Bancomer

61719958

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: Fecha 26 de julio de 2018

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO $ 13,181.69

CON LETRA: (TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 69/100 M. N.) Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

8977: 513 200 170: 00 1116 540 20" 00000 29

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
BANCOMER	1116540 20	29

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30. DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2018

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		13,181.69	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			13,181.69
			SUMAS IGUALES	13,181.69	13,181.69

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

002970

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
m.m.l.	L.C.A.G.R.	C.I.J.C.A.			00002970

Impresos JEC P-1013

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

1

ORDEN DE PAGO SAY 26355

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 13,181.69

(TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 69/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30. DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2018.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

(SE AGUN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

002971

SAYULA Jal., a 26 de JULIO de 20 18

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

00000280

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA Nº 30

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella P.
PEDRO BRISEÑO ALFARO	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador
ROSALIO RAMOS GOMEZ	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos S
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrrique Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar Madrueño
GUSTAVO SOTO CAMPOS	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo S.
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 9,502.32	$ 1,583.72	$ 111.32	$ 590.72	$ 10,606.64	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

002972

00002281

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ | **SEMANA Nº 30**

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

BBVA Bancomer

81145858 CÓPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: Fecha 2 de agosto de 2018

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO $ 13,027.07

CON LETRA: (Trece mil veintisiete pesos 07/100 M. N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

397 21 513 200 170 00 111 654 020 00000 30

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
BANCOMER	1116540 20	30

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. ORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31. DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2018 .

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		13,027.07	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			13,027.07
				003436	
				SUMAS IGUALES	13,027.07	13,027.07

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
m.m.l.	L.C.A.G.R.	C.I.J.C.A.			00000283

Impresos JEC P-1013

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26375

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 13,027.07

(TRECE MIL VEINTISIETE PESOS 07/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS

PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y

SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31. DEL 25 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2018.

003437

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 02 de AGOSTO de 20 18

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MPAL. SAYULA, JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL

00009284

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA Nº 31

DEL 26 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño. A
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador P
ROSALIO RAMOS GOMEZ	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrrique Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar Madrueño
GUSTAVO SOTO CAMPOS	TRAZO DE BANQUETAS Y MACHUELO, COMPACTACIO DE TERRACERIA CON VIBRO COMPACTADOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	$ 142.84	5	$ 714.20	$ 119.03	$ 39.86	$ -	$ 873.09	Gustavo Soto C
LA CANTIDAD			TOTAL	$ 9,359.48	$ 1,559.91	$ 123.35	$ 590.72	$ 10,452.02	

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA, JAL.

00003433
00009235

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA N° 31

DEL 26 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	$2,575.05	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

FORMULO
ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

00039286

00039239

BBVA Bancomer

52529175 COPIA DEL CHEQUE

1

Páguese por este cheque a la orden de: Fecha 9 de agosto de 2018

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO $ 13,181.69

CON LETRA: (TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 69/100 M. N.) Moneda Nacional

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MBA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

⑆20⑈513200170⑆00111654020⑈00000035

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
BANCOMER	1116540 20	35

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32. DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DE 2018 .

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		13,181.69	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			13,181.69
			SUMAS IGUALES	13,181.69	13,181.69

003462

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
m.m.l.	L.C.A.G.R.	C.I.J.C.A.			00000287

Impresos JEC P-1013

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

1

ORDEN DE PAGO SAY 26382

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 13,181.69

(TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 69/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE

PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y

SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32. DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DE 2018.

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

003463

SAYULA Jal., a 09 de AGOSTO de 20 18

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00000288

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA N° 32

DEL 2 AL 8 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	$2,575.05	
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

0034674

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR

FORMULO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO

Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ

REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL. DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA Nº 32

DEL 2 AL 8 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella P.
PEDRO BRISEÑO ALFARO	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador P.
ROSALIO RAMOS GOMEZ	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrrique Fajardo P.
OSCAR MADRUEÑO AYALA	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar Madrueño
GUSTAVO SOTO CAMPOS	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ 147.68	$ 1,027.71	Gustavo S.
LA CANTIDAD				TOTAL	$ 9,502.32	$ 1,583.72	$ 111.32	$ 590.72	$ 10,606.64

003465

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL ADMINISTRACION 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C.P. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

BBVA Bancomer

CHEQUE PÓLIZA

12626955

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: Fecha 16 de agosto de 2018

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO $ 14,574.86

CON LETRA (CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.) Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

7833 513 200170 00111654020 00000039

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
BANCOMER	1116540 20	39

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33. DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DE 2018 .

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		14,574.86	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			14,574.86
				003489	
			SUMAS IGUALES	14,574.86	14,574.86

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
m.m.l.	L.C.A.G.R.	C.I.J.C.A.			0000029

Impresos JEC P-1013

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26412

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____ del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 14,574.86

(CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33. DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DE 2018.

003490

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 16 de AGOSTO de 20 18

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

00000202

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA Nº 32

DEL 2 AL 8 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7º DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
RAFAEL MENDEZ ALONSO	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 142.84	3	$ 428.52	$ 71.42	$ 66.80	$ -	$ 566.74	Rafael M A
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 428.52	$ 71.42	$ 66.80	$ -	$ 566.74	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
C.P. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA N° 33

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador P.
ROSALIO RAMOS GOMEZ	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 253.09	5	$ 1,265.45	$ 210.91	$ -	$ 53.69	$ 1,422.67	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enrique Fajardo
OSCAR MADRUEÑO AYALA	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Oscar M.
GUSTAVO SOTO CAMPOS	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo S.
RAFAEL MENDEZ ALONSO	COMPACTACION DE BASE, TRAZO DE MACHUELO, NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS Y POZO DE VISITA, CIMBRADO DE REGISTROS Y ARMADO DE PARRILLAS DE TELMEX	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Rafael M-A
LA CANTIDAD	TOTAL			$ 10,106.27	$ 1,684.38	$ 139.15	$ 496.73	$ 11,433.07	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

03/09/18

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO	ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JORGE RAMOS AGUILAR
FORMULO	V°. B°.	REVISO	AUTORIZO

HACIENDA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA N° 33

DEL 9 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

00439

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMON 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
Vo. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA CORICHI
REVISO

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

1

BBVA Bancomer

78328770 COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: Fecha 23 de agosto de 2018

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO $ 14,209.40

CON LETRA (CATORCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 40/100 M. N.) Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

3014 513 200170 00111654020 0000043

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
BANCOMER	1116540 20	43

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34. DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DE 2018 .

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		14,209.40	
		PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			14,209.40
				SUMAS IGUALES	14,209.40	14,209.40

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003521

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
m.m.l.	L.C.A.G.R.	C.I.J.C.A.			00000200

Impresos TEC P-1013

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

1

ORDEN DE PAGO SAY 26418

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO La cantidad de $ 14,209.40

(CATORCE MIL DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS 40/100 M. N.)

por el siguiente concepto PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE LABORO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34. DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DE 2018.

003522

(SEGÚN COMPROBANTE ANEXO)

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 23 de AGOSTO de 20 18

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ.
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA JAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00000297

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ — SEMANA Nº 34

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 — DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
JUAN JOSE ESTRELLA PIÑA	IMPRADO DE REGISTROS DE TELMEX, ACARREO DE MATERIAL PARA NIVELACION DE BANQUETAS, REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Juan José Estrella Piña
PEDRO BRISEÑO ALFARO	IMPRADO DE REGISTROS DE TELMEX, ACARREO DE MATERIAL PARA NIVELACION DE BANQUETAS, REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Pedro Briseño A
JONATHAN MADRUEÑO AYALA	IMPRADO DE REGISTROS DE TELMEX, ACARREO DE MATERIAL PARA NIVELACION DE BANQUETAS, REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Jonathan M.
PRAXEDIS LABRADOR PADILLA	IMPRADO DE REGISTROS DE TELMEX, ACARREO DE MATERIAL PARA NIVELACION DE BANQUETAS, REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Praxedis Labrador
ROSALIO RAMOS GOMEZ	IMPRADO DE REGISTROS DE TELMEX, ACARREO DE MATERIAL PARA NIVELACION DE BANQUETAS, REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Rosalio Ramos G.
ENRIQUE FAJARDO PEÑA	IMPRADO DE REGISTROS DE TELMEX, ACARREO DE MATERIAL PARA NIVELACION DE BANQUETAS, REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	Enr
OSCAR MADRUEÑO AYALA	IMPRADO DE REGISTROS DE TELMEX, ACARREO DE MATERIAL PARA NIVELACION DE BANQUETAS, REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	$ 253.09	6	$ 1,518.54	$ 253.09	$ -	$ 147.68	$ 1,623.95	
GUSTAVO SOTO CAMPOS	IMPRADO DE REGISTROS DE TELMEX, ACARREO DE MATERIAL PARA NIVELACION DE BANQUETAS, REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Gustavo S.
RAFAEL MENDEZ ALONSO	IMPRADO DE REGISTROS DE TELMEX, ACARREO DE MATERIAL PARA NIVELACION DE BANQUETAS, REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS	$ 142.84	6	$ 857.04	$ 142.84	$ 27.83	$ -	$ 1,027.71	Rafael M A
LA CANTIDAD				$ 10,359.36	$ 1,726.56	$ 139.15	$ 7,590.72	$ 11,634.35	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
V°. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMBEROS QUIROZ
AUTORIZO

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

00000000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018

SAYULA,JALISCO

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

NOMINA PERSONAL EVENTUAL

OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEMANA N° 34

DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DEL 2018

NOMBRE Y REGISTRO FED. DE CAUSANTES	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DIAS	IMPORTE PARCIAL	7° DIA	SUBE	ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA DEL TRABAJADOR
FEDERICO SANCHEZ MUNGUIA	RESIDENTE	$421.39	6	$2,528.34	$421.39	$ -	$374.68	**$2,575.05**	
LA CANTIDAD		TOTAL		$ 2,528.34	$ 421.39	$ -	$ 374.68	$ 2,575.05	

ARQ. FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR
FORMULO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
VO. Bo.

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
AUTORIZO

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HACIENDA SAYULA, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

ANEXO DE EGRESOS **E 4**

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FOLIO	PROVEEDOR	RFC	N ° CHEQUE	FECHA CHEQUE	JUSTIFICACION Y Nº DE CONTRATO	IMPORTE
A61	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	AAGA9007197F7	10	11-may-18	RETROEXCAVADORA	2,436.00
A60	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	AAGA9007197F7	10	11-may-18	RETROEXCAVADORA	6,090.00
A66	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	AAGA9007197F7	14	01-jun-18	CAMION 7M3	4,384.80
A78	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	AAGA9007197F7	16	18-jun-18	RETROEXCAVADORA	2,842.00
A77	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	AAGA9007197F7	16	18-jun-18	RETROEXCAVADORA	6,496.00
A1108	TOMAS FLORES JIMENEZ	FORT691210PRA	19	20-jun-18	CAMION 7M3	1,148.40
A1107	TOMAS FLORES JIMENEZ	FORT691210PRA	19	20-jun-18	CAMION 7M3	1,461.60
168	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIAN	COAM80731B56	21	28-jun-18	CAMION 7M3	3,549.60
184	MANUEL MEJIA VALENCIA	MEVM530421I1A	24	04-jul-18	EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO	19,720.00
5869F086	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	MAMA6206209L2	27	18-jul-18	CAMION 7M3	2,505.60
FE278089	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	MAMA6206209L2	31	03-ago-18	CAMION 7M3	5,011.20
185	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIAN	COAM80731B56	32	03-ago-18	CAMION 7M3	1,252.80
AAA103F8	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	MSA8501018C8	33	03-ago-18	CAMION 7M3	1,252.00
4164BEDA	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	MAMA6206209L2	36	09-ago-18	CAMION 7M3	5,011.20
195	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIAN	COAM80731B56	37	09-ago-18	CAMION 7M3	6,681.60
236	VOLTA AGROINSUMOS, SA DE CV	VAI1160805B74	38	09-ago-18	RETROEXCAVADORA	3,248.00
241	VOLTA AGROINSUMOS, SA DE CV	VAI1160805B74	46	24-ago-18	RETROEXCAVADORA	8,526.00
E3965	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AAGA9007197F7	49	11-sep-18	BAILARINA	22,800.00

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

COPIA DEL CHEQUE

91732235

1

Páguese por este cheque a la orden de: Fecha 11 DE MAYO DEL 2018

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN $ 8,526.00

(OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

9038

0012 011 5 13 200 170 1 00 1116540 20 1 00000 10

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY.REG.2018	1116540 20	10

CONCEPTO DEL PAGO

FACTURA A61 A 60 PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 24851

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____ 2,436.00

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN La cantidad de $ _____

(DOS MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PAGO POR

por el siguiente concepto

6 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADOPRA CAT 420 E IT EL DIA 21 DE ABRIL 2018

PARA LA OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE

MUNICIPIO. * FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018.

SECRETARIA GRAL.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO 002859

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

_____ Jal., a _____ de 11 MAYO de 20 18

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

CH.

0000302

I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: A 61
FECHA: 3/5/2018 12:09:07
Folio Fiscal: C81CAB9E-BA44-4F94-A7A8-5A5AF1FE4547 Fecha y hora de certificación: Mayo 3 2018 - 12:09:18 Serie del Certificado del emisor: 00001000000305365791 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
CONDICIONES:
USO CFDi: P01 - Por definir

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

RFC: AAGA9007197F7 Contreras Medellin No. 24 El Santuario, San Gabriel 49700
San Gabriel Jalisco México

EXPEDIDO EN: CP: 49700

CLIENTE:	SAYULA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	**R.F.C:** MSA8501018C8
DOMICILIO:	Escobedo No. 52, COLONIA: Sayula Centro, POBLACIÓN: Sayula, Jalisco, C.P.: 49300	
FORMA DE PAGO: 02 - Cheque nominativo, **MÉTODO DE PAGO:** PPD - Pago en parcialidades o diferido, **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano		
Observaciones:	Referencia:	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
6.0000	HUR - Hora	RETRO SAT: 72141701	HORA DE RETROEXCAVADORA	350.00	002 - IVA - 336.00 --	2,100.00

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
621 - Incorporación Fiscal
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL:	2,100.00
ImpuestosTrasladados I.V.A. 16%:	336.00
Impuestos Retenidos	
TOTAL:	2,436.00

Sello digital del CFDI

Whv4gbl4dnoh/yfAeoNlMaRxz1U8INC2lmCs+RUBhUKvOlPERUXDw55UMP6J0G7hcKQ7Dls35OPWrZa9Czx9HP
a05f06DARbIgIszE9Dbbh6eLzSTnp81ULs811p0Hm9FEgmUMfTwQUWdb4MPbgf2FWx9W5CIB0lLdF4zNfl2v8=

Sello del SAT

HenLpCwK+bfuwPr7eOTogf06ywu/nRLGUkXVsPdQhswC6uOIE5y2WrqkACD4leAlH5lOKcyBhCHPqRD3
xmNRXeo/YsnP6GDKvNV5kFduYWQaTl2/kceFBa9F/tofqAR0olLR8iTl9geP2/lX8uTV6tnFuWQZQvRp
pUMEcC+0d7GcGiULHuzYo10lC6lYHCJb1TVyf3rrO77x+RVe+aoeAZM8046YlSoW081mp811X8HQ+d9m
bll9cDTKY2QcOITNP23m3FMqwtvxPi3y2s861bokz6ph6fv7rT57Lf9xGC10ewzTLm1nKZjxC6srMEYU
lEDGZuLEpk683rjzsSc9hQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C81CAB9E-BA44-4F94-A7A8-5A5AF1FE4547|2018-05-03T12:09:18|MASD810247C0|Whv4
gbl4dnoh/yfAeoNlMaRxz1U8INC2lmCs+RUBhUKvOlPERUXDw55UMP6J0G7hcKQ7Dls35OPWrZa9Czx9
HPa05f05DARbIgIszE9Dbbh6eLzSTnp81ULs811p0Hm9FEgmUMfTwQUWdb4MPbgf2FWx9W5CIB0lLdF4
zNfl2v8=|00001000000404486074||

Banco:
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN en San Gabriel, Jalisco el día _____ la cantidad de: $2,436.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según articulo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Firma de Aceptación

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00000303

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

SAYULA
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

FECHA: 21/04/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am 2pm 6 hrs.

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Retroexcavadora CAT 420EIT

OBRA: (X) Agua, Drenaje. MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.
Pavimento.

TRABAJOS REALIZADOS:

Cargando camiones con escombro

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

PROVEEDOR: Jose Arturo Altamirano G.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra:

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 420 E IT

Fecha: 21 DE ABRIL DEL 2018

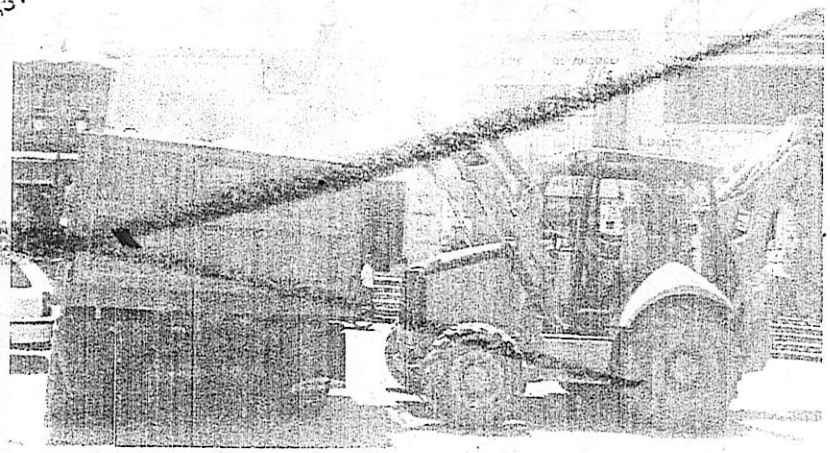

ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2018

0000394

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 24849

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN 6,090.00

La cantidad de $ _____

(SEIS MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

PAGO POR

por el siguiente concepto

15 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 420 E LOS DIAS 12,16 DE ABRIL 2018

PARA LA OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE

MUNICIPIO. * FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SECRETARIA GENERAL

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

002062

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

_____ Jal., a ____ de 11 MAYO de 20 18

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

CH.

00009305

I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: A 60
FECHA: 3/5/2018 12:08:00
Folio Fiscal: DFB90097-9880-4C34-96F9-B854AAB18F58 Fecha y hora de certificación: Mayo 3 2018 - 12:08:06 Serie del Certificado del emisor: 00001000000305365791 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
CONDICIONES:
USO CFDi: P01 - Por definir

1

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

RFC: AAGA9007197F7 Contreras Medellin No. 24 El Santuario, San Gabriel 49700
San Gabriel Jalisco México

EXPEDIDO EN: CP: 49700

CLIENTE:	SAYULA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	**R.F.C:** MSA8501018C8
DOMICILIO:	Escobedo No. 52, COLONIA: Sayula Centro, POBLACIÓN: Sayula, Jalisco, C.P.: 49300	
FORMA DE PAGO: 02 - Cheque nominativo, **MÉTODO DE PAGO:** PPD - Pago en parcialidades o diferido, **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano		
Observaciones:	Referencia:	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15.0000	HUR - Hora	RETRO SAT: 72141701	HORA DE RETROEXCAVADORA	350.00	002 - IVA - 840.00	5,250.00

IMPORTE CON LETRA
SEIS MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
621 - Incorporación Fiscal
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL:	5,250.00
ImpuestosTrasladados I.V.A. 16%:	840.00
Impuestos Retenidos	
TOTAL:	6,090.00

Sello digital del CFDI

F3l72H97lA23mG8l07hZiMpXj7r9VWLtrVvo+Pr6HmAF94HscXz2DyqVtwxCucMKQRZjTLDxn9qemqlSU8U5z
g5WKP9cBpmhpUoleduV7oUey7hzgzBWZN/BZOsKvS19/14abvxwguA3Tj4n8O4jS70FBwK19SmvWDrdmJdT0l=

Sello del SAT

QVEFllnmgj792+c21F2RW7LOxKsFbTZbhr5SPEWS9rgVCC7zU7mM3/ZqOlU+MTt/Lz/pYgqcH/3Bq1W
N0ZpvihW0sSEU7RMBGWiNraSvUgDC8QA+70qR52E+BhtHDBGLvATGMN6x0GgQ9DTy3z+Ito9PydrUFkl
Pk/fs2U7/y5RVEiyJSPFE5zv300gl/SrHzEPGdS+DWFey6s+yOQbW2PoVHsUlqZZ/MSDVngbyFTArzd
Nd3OHlj4cEMsryVLcZDWKJSMZLaz9aS1XgorWA2Jf2yVkQH6XecNkTFWOuzVB6mPQExabPuCRvyme2T
0bew2RdMjoy3YKcxcBQ+mg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DFB90097-9880-4C34-96F9-B854AAB18F58|2018-05-03T12:08:06|MAS0810247C0|F3l7
2H97lA23mG8l07hZiMpXj7r9VWLtrVvo+Pr6HmAF94HscXz2DyqVtwxCucMKQRZjTLDxn9qemqlSU8U
5zg5WKP9cBpmhpUoleduV7oUey7hzgzBWZN/BZOsKvS19/14abvxwguA3Tj4n8O4jS70FBwK19SmvWDr
dmJdT0l=|00001000000404486074||

Banco:
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN en San Gabriel, Jalisco el día _____ la cantidad de: $6,090.00 (SEIS MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según articulo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Firma de Aceptación

002863

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

00000306

SAYULA
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 12.04.2018

HORAS O VIAJES: 9:00am a 6pm 7hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Retroexcavadora CAT 420 E

OBRA: (X) Porfirio Diaz de Sayula. MANTENIMIENTO: ( )

TRABAJOS REALIZADOS:

Cargando y Arrancando pavimento de concreto.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

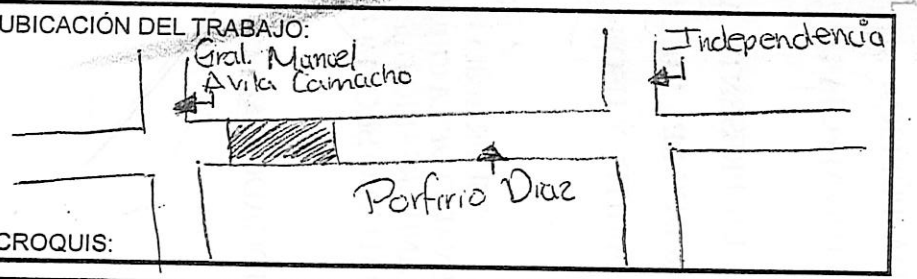

PROVEEDOR: Jose Arturo Altamirano Guzman.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 420 E

Fecha: 12 DE ABRIL DEL 2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 16/04/2018

HORAS O VIAJES: 8 a 5 pm 8hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Retroexcavado CAT 420E

OBRA: Porfirio Diaz. Sayula.

MANTENIMIENTO:

TRABAJOS REALIZADOS:

Quitando pavimento en la calle Porfirio Diaz.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:



CROQUIS:

PROVEEDOR:

Jose Arturo Altamirano Guzman

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 420 E

Fecha: 16 DE ABRIL DEL 2018

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

42313120

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

Fecha: 1 de junio de 2018

$ 4,384.80

CON LETRA (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

4 28 51 5 13 200 170 1: 00 111 654 0 20 1" 00000 14

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	00111654020	CH 14

CONCEPTO DEL PAGO: FACTURA 48 PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA: PAVIMENTO Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

1

ORDEN DE PAGO SAY 25101

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____ del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN La cantidad de $ 4,384.80

(CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR

21 HRS DE RENTA DE CAMION 7M3 LOS DIAS 19,20,21 DE ABRIL 2018 PARA LA OBRA:

PAVIMENTO Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO.

* FONDO DE PROTECTO DE DESARROLLO REGIONAL DE 2018.

SECRETARIA GENERAL

001941

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

_____ Jal., a _____ de 21 MAYO de 20 18

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

CH.

00000310

<IMG SRC="FA0000000066_Log.jpg">

I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: A 66

FECHA: 11/5/2018 10:39:42

Folio Fiscal: 4A9CFE02-5EB3-4532-8FE6-3CA3A0B40209
Fecha y hora de certificación: Mayo 11 2018 - 10:39:47
Serie del Certificado del emisor: 00001000000305365791
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

CONDICIONES:

USO CFDi: P01 - Por definir

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

RFC: AAGA9007197F7 Contreras Medellin No. 24 El Santuario, San Gabriel 49700
San Gabriel Jalisco México

EXPEDIDO EN: CP: 49700

CLIENTE:	SAYULA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	**R.F.C:** MSA8501018C8
DOMICILIO:	Escobedo No. 52, COLONIA: Sayula Centro, POBLACIÓN: Sayula, Jalisco, C.P.: 49300	
FORMA DE PAGO: 02 - Cheque nominativo, **MÉTODO DE PAGO:** PPD - Pago en parcialidades o diferido, **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano		
Observaciones:		Referencia:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
21.0000	HUR - Hora	VOLTEO SAT: 72141701	HORA DE VOLTEO 7 M3	180.00	002 - IVA - 604.80 --	3,780.00

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
621 - Incorporación Fiscal
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL:	3,780.00
ImpuestosTrasladados I.V.A. 16%:	604.80
Impuestos Retenidos	
TOTAL:	4,384.80

SECRETARIA GENERAL

Sello digital del CFDI

QPB1Cp4Lc5u7pyg3gbbVf9UdOaCTUQA5FE2ILBPU0ly4u3zNlQmWU3+IL3OEFlyn1jXury+e8SroGo+k6FO4Pm
rez+5ixwqQa79eZqwjpKPSRTwk8fPehVtAKVbjTon7G+LM8t1yfuaOeJQiwPlYI2ir1ym+DJ5JllnW7cQ5NNY=

Sello del SAT

uJ6BlWawV0lnPjvSLq2+SFgESOnztawvPD6a/eNDMwf/sRaFlj4NjUCPtBxtJbas38dW2Z0op1AE6Pz
IDY/cKWSkpYiz/OTTXRHL585+xf2HYx4mTM9hDETJ+ED+SjHv1ibHjQHpAcqfZN5Q54h0rUjCEyHVMY
ENQELq2XXV3Tlc2/EfJW41z37K7wpfbZABshBuJxrC5jkHKVnOUCraBgWDqb1MaBgBAjwzpymXb/BWTP
WKg011Ag+bjdDPzaJhgFnNslSwiz1lJ4SJj3elbR7gef+LhNXHXoX1MXTZ7jivl4btRfKzIHll1VUkiO
0haWNOWOM89vxFJx2GGMIg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4A9CFE02-5EB3-4532-8FE6-3CA3A0B40209|2018-05-11T10:39:47|MAS0810247C0|QPB1
Cp4Lc5u7pyg3gbbVf9UdOaCTUQA5FE2ILBPU0ly4u3zNlQmWU3+IL3OEFlyn1jXury+e8SroGo+k6FO4
Pmrez+5ixwqQa79eZqwjpKPSRTwk8fPehVtAKVbjTon7G+LM8t1yfuaOeJQiwPlYI2ir1ym+DJ5JllnW
7cQ5NNY=|00001000000404486074||

Banco:

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN en San Gabriel, Jalisco el día _____ la cantidad de: $4,384.80 (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según articulo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Firma de Aceptación

001342

00000311

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

SAYULA
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

FECHA: 19/04/2018

HORAS O VIAJES: 8am a 5pm 8hrs.

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Volteo 7m³ JG75370.

OBRA: (X) Porfirio Diaz.

MANTENIMIENTO: ( )

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de escombro de la calle Porfirio Diaz.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Independencia

Porfirio Diaz

CROQUIS:

Gral. Manuel Av. la Camacho

PROVEEDOR: Jose Arturo Altamirano Guzman

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALENCIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAS.
Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3 JG75370
FECHA: 19 DE ABRIL 2018

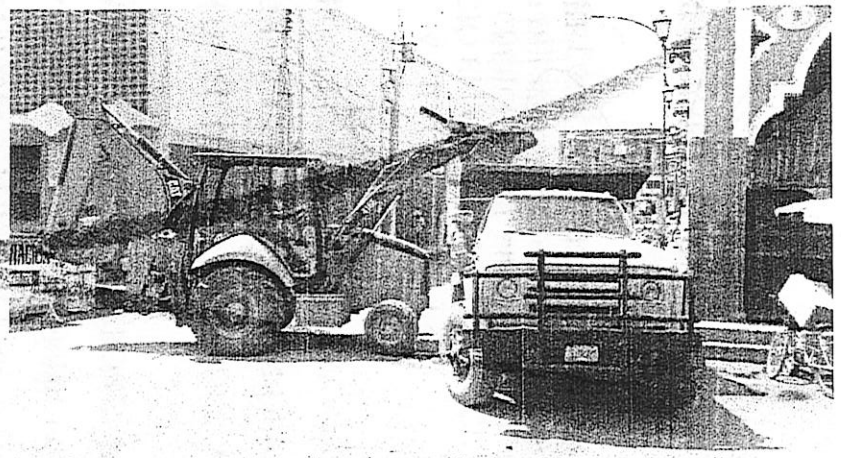

001943

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

SAYULA

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 20/04/2018

HORAS O VIAJES: 8am a 5pm 8hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Bolteo 7m³, JG75370.

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de escombro de la calle Porfirio Diaz.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

PROVEEDOR: Jose Arturo Altamirano Guzman.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALDIVIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAS.
Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3 JG75370
FECHA: 20 DE ABRIL 2018

0001944

0001944

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 21.04.2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 2pm 5hrs.

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Volteo 7m³ JG 75370.

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de escombro de la calle porfirio Diaz.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:



PROVEEDOR: Jose Arturo Altamirano G.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAS.

Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3 JG75370

FECHA: 21 DE ABRIL 2018

ESTE DOC... CUMENTO ES COPIA FIEL DE LA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

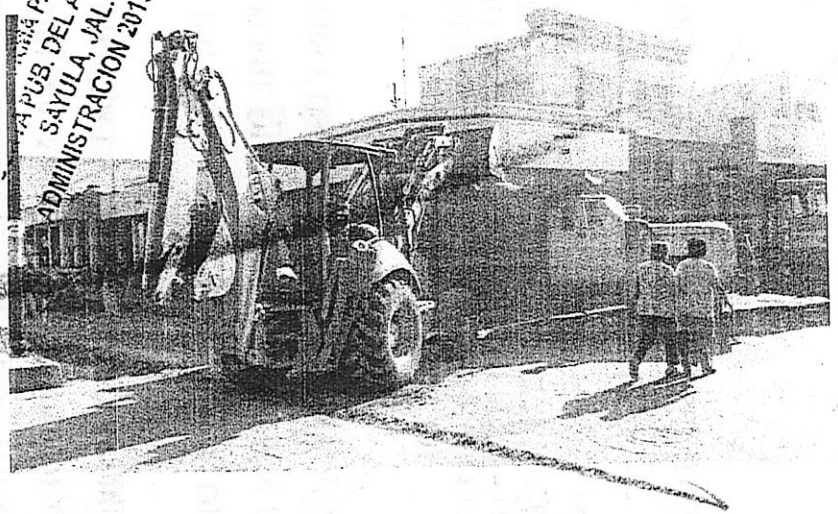

001945

0000314

1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco al día 02 (dos) del mes de abril del año 2018 (dos mil dieciocho), encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal de esta ciudad; el **ABOG. JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES** en su carácter de Síndico Municipal y a quien en lo sucesivo del presente contrato se le denominara **"EL REQUIRENTE"**, y por la otra parte el **C. J. ARTURO ALTAMIRANO GUZMÁN,** con domicilio en la calle Ignacio Mejía número 7 (siete) del municipio de San Gabriel Jalisco e identificándose en este acto con Credencial de Elector, expedida por el Instituto Federal Electoral con el número de folio 0914192110446 y a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se le denominara **"PRESTADOR DE SERVICIOS",** por lo que ambas partes se sujetaran a las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta tener los conocimientos, el personal, la maquinaria e instrumentación necesaria para realizar los trabajos requeridos y se compromete a la prestación de los siguientes servicios:

I.- TRASLADO DE MATERIAL y/o ACARREO CON CAMION DE 7m³ (metros cúbicos) cobrando la cantidad de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) MÁS IVA, POR VIAJE REALIZADO.

II.- RENTA DE CAMION DE 7m³ (metros cúbicos) cobrando la cantidad de $180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 m.n.) MÁS IVA, POR HORA DE TRABAJO.

III.- RENTA DE RETROEXCAVADORA, con un costo de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) MÁS IVA, POR HORA DE TRABAJO.

IV.- RENTA DE REVOLVEDORA, con un costo de $380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.)MÁS IVA, POR DÍA DE 8 HORAS.

V.- RENTA DE VIBROCOMPACTADOR, con un costo de $1,900.00 (mil novecientos pesos 00/100 m.n.) MÁS IVA, POR DÍA DE 8 HORAS.

La prestación de los servicios se llevara a cabo en los siguientes puntos, donde se realizan obra pública:

1. Construcción de red de agua potable en calle Escobedo.
2. Construcción de red de drenaje en calle Escobedo.
3. Construcción de pavimento hidráulico en calle Escobedo.
4. Construcción de machuelos y banquetas en calle Escobedo.
5. Construcción de red de agua potable en calle Hidalgo de Usmajac, segunda etapa
6. Construcción de red de drenaje en calle Hidalgo de Usmajac, segunda etapa.
7. Construcción de pavimento hidráulico en calle Hidalgo de Usmajac, segunda etapa.
8. Construcción de machuelos y banquetas en calle Hidalgo de Usmajac, segunda etapa.
9. Construcción de red de agua potable en calle Alameda.
10. Construcción de red de drenaje en calle Alameda.
11. Construcción de pavimento hidráulico en calle Alameda.
12. Construcción de machuelos y banquetas en calle Alameda.
13. Construcción de drenaje sanitario en calle Hidalgo de Usmajac, 1era etapa.
14. Construcción de red de agua potable en calle Hidalgo de Usmajac, 1era etapa.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001946

00000315

15. Construcción de drenaje sanitario en calle Josefa Ortiz de Usmajac.
16. Construcción de drenaje sanitario en calle Zaragoza de Usmajac.
17. Construcción De La Unidad Deportiva en Fraccionamiento Jardines de La Moret de la localidad De Usmajac
18. Rehabilitación de unidad depotiva Gustavo Diaz Ordaz.
19. Construcción de unidad deportiva en col. Villas de Guadalupe, en la cabecera municipal.
20. Mantenimiento en diversos puntos del municipio

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", iniciara los trabajos a la firma del presente contrato, acatando las indicaciones que le señale **"EL REQUIRENTE"** por conducto del Director de Obras Públicas del Municipio de Sayula Jalisco, quien le dará a conocer los días y horas que necesitaran de sus servicios y quien tendrá la obligación de presentar una bitácora de trabajo la cual deberá contener lo siguiente: *fecha, hora, lugar donde se prestó el servicio, fotografía de los trabajos ejecutados, descripción del trabajo, croquis de localización, descripción de la maquinaria utilizada, nombre del proveedor, y en su caso firmado por el residente o encargado de obra.*

TERCERA.- "EL REQUIRENTE" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la cantidad que resulte de aplicar los precios unitarios antes mencionados.

CUARTA.- El pago de los servicios contratados, se hará por conducto de Tesorería Municipal; obligándose "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a expedir las facturas correspondientes y con los requisitos fiscales a favor del Municipio de Sayula, Jalisco.

QUINTA.- El presente contrato inicia vigencia a la suscripción y firma del mismo, es decir, inicia el día 02 (dos) del mes de abril del año 2018 (dos mil dieciocho) y termina el día 30 (treinta) de junio del año 2018 (dos mil dieciocho). Con la particularidad que la contratación de sus servicios **NO SERA DE MANERA CONTINUA** por lo que **"EL REQUIRENTE"** le dará indicaciones a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** los trabajos que se vayan requiriendo, pudiendo dar por terminada la relación contractual anticipadamente sin cargo alguno y con la simple notificación por escrito que se haga de la otra parte con un lapso de 8 ocho días de anticipación.

SEXTA.- Manifestando ambas partes que el presente contrato no implica prestaciones distintas que las consignadas en el presente instrumento, deslindándose "EL REQUIRENTE" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" y/o el personal tenga a su cargo así como los distintos consignados en el presente instrumento.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES Y ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y FIRMANDO ANTES DOS TESTIGOS EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.

C. JOSÉ ARTURO ALTAMIRANO GUZMÁN.
"PRESTADOR DE SERVICIOS"

001947

ABOG. JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES
"SÍNDICO MUNICIPAL / EL REQUIRENTE"

V.B.

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

TESTIGO.

TESTIGO.

00000316

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SINDICATURA

BBVA Bancomer

84743442

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

Fecha 13 de junio de 2018

$ 9,338.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

96 29 513 200170 00111654020 00000016

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 16

CONCEPTO DEL PAGO: 77 PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 25671

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN La cantidad de $ 9,338.00

(NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE RETRO-- EXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD (FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018).

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001955

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

SAYULA Jal., a 13 de JUNIO de 20 18

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

T. SAYULA DE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

00000318

<IMG SRC="FA0000000078_Log.jpg">

I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: A 78
FECHA: 11/6/2018 10:09:37
Folio Fiscal: A10F8100-8A5A-4254-B16B-46102D5B0F7C Fecha y hora de certificación: Junio 11 2018 - 10:09:43 Serie del Certificado del emisor: 00001000000305365791 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
CONDICIONES:
USO CFDi: P01 - Por definir

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

RFC: AAGA9007197F7 Contreras Medellin No. 24 El Santuario, San Gabriel 49700
San Gabriel Jalisco México

EXPEDIDO EN: CP: 49700

CLIENTE:	SAYULA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	**R.F.C:** MSA8501018C8
DOMICILIO:	Escobedo No. 52, COLONIA: Sayula Centro, POBLACIÓN: Sayula, Jalisco, C.P.: 49300	
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir, **MÉTODO DE PAGO:** PPD - Pago en parcialidades o diferido, **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano		
Observaciones:	Referencia:	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
7.0000	HUR - Hora	RETRO SAT: 72141701	HORA DE RETROEXCAVADORA	350.00	002 - IVA - 392.00 - -	2,450.00

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
621 - Incorporación Fiscal
CFDi Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL:	2,450.00
ImpuestosTrasladados	
I.V.A. 16%:	392.00
Impuestos Retenidos	
TOTAL:	2,842.00

Sello digital del CFDI

BPmM1pG1Gy8AfqvOyOc0cfqv4Hbnti5sLTNltY3rtP+rB8FjOFzy+fDzAwIFWN3Z9OYHLWS9SqneZlipB+YR8f
mtB0/TTcmWfcdJOaYPzrvgj2gjq6gRjw9yNP0SmSCIbWJUSTrcbGj8NRT0cOlhEOXab7mi52VAZsdP7VGHVTHc=

Sello del SAT

IOlo+THxOwfOfrdjhMyP+y3pWBuXkd7DmVB8jzC8nPWYvugggyZJcHXiu0EEaZZLEhB0D8NZ6CvZ8a/zi
z8Eu4/THQ4+UST09O/QSIqcxCrw+x8OnEolops++Ys9pvRQhoCe9mZnuG5w6uhVgpwlcUiYRE5ujqvCK
l0Hqs4Wp6CL0IrR5C5B0Cj2MWvZWeZMXNxHat6YQgsvAlptfWo3Adm9fEmSelsCfkMdlXI9f75DWlg
COOHzdQzHMCAHYcFENumYuVo35XKFOTEE9Ry0sQNTUTQGeZYoJhLFOVbNOkiPcnQgKBzzY4uEzd/q
ItuRNR8WOEzeG2IBryFGCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A10F8100-8A5A-4254-B16B-46102D5B0F7C|2018-06-11T10:09:43|MSD810247C0|BPmM
1pG1Gy8AfqvOyOc0cfqv4Hbnti5sLTNltY3rtP+rB8FjOFzy+fDzAwIFWN3Z9OYHLWS9SqneZlipB+YR
8fmtB0/TTcmWfcdJOaYPzrvgj2gjq6gRjw9yNP0SmSCIbWJUSTrcbGj8NRT0cOlhEOXab7mi52VAZsdP7
VGHVTHc=|00001000000404486074||

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Banco:
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN en San Gabriel, Jalisco el día _____ la cantidad de: $2,842.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Firma de Aceptación

001956

00000319

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

SAYULA
GOBIERNO CON RESULTADOS

FECHA: 07 / 05 / 2018

HORAS O VIAJES: 9:00am a 6pm 7hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Retroexcavadora CAT 420E

OBRA: Porfirio Diaz Agua

MANTENIMIENTO:

TRABAJOS REALIZADOS:

Abriendo zanjas para la tuberia de Agua potable

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

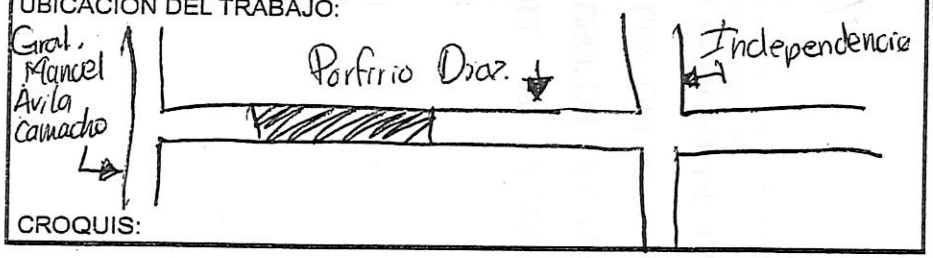

CROQUIS:

PROVEEDOR: Jose Arturo Altamirano G.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE, AGUA Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

Concepto: Renta de retroexcavadora CAT 420 E

Fecha: 07 DE MAYO 2018

001957

<IMG SRC="FA0000000077_Log.jpg">

I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: A 77

FECHA: 11/6/2018 10:07:17

Folio Fiscal: 780EE74A-CA27-4A70-9C7D-DF3D60B14545
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2018 - 10:07:27
Serie del Certificado del emisor: 00001000000305365791
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

CONDICIONES:

USO CFDi: P01 - Por definir

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

RFC: AAGA9007197F7 Contreras Medellin No. 24 El Santuario, San Gabriel 49700
San Gabriel Jalisco México

EXPEDIDO EN: CP: 49700

CLIENTE:	SAYULA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	**R.F.C:** MSA8501018C8
DOMICILIO:	Escobedo No. 52, COLONIA: Sayula Centro, POBLACION: Sayula, Jalisco, C.P.: 49300	
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir, **MÉTODO DE PAGO:** PPD - Pago en parcialidades o diferido, **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano		
Observaciones:	Referencia:	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
16.0000	HUR - Hora	RETRO SAT: 72141701	HORA DE RETROEXCAVADORA	350.00	002 - IVA - 896.00 --	5,600.00

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Esle documento es una representación impresa de un CFDI

621 - Incorporación Fiscal

CFDi Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

SUBTOTAL:	5,600.00
ImpuestosTrasladados	
I.V.A. 16%:	896.00
Impuestos Retenidos	
TOTAL:	6,496.00

Sello digital del CFDI

GetMd+J0JANVAloYEjvO7LOfPfCuV2oJlEgYs9V2ChrMa80cLuqQLg3AZ3uv9U0SGVlHhdG9+3xV6GwOZvp
kW5+ljB88ICJ6x30lCB1uAlQaBT0alXl3iDgd4JbC+gBNW6GKwcx1nhEgklMKZpR2RFLK9Xd6Z0H1
XJsfFzI=

Sello del SAT

tYCzNEd7ZA7HD/PTvq2vwNU4GNC35wv1xA/EgHJXLFFDPcQVj2YKzZ9bTwnzdaQ5DAqKFyAi9P7FbIf
j3sAsJvod/XaWBq3origO2jCNFdveA8xVngt2Oub6KawuGMGHnGfVJ0qjiu6mKKokZ3tS1YNexEQFz
U18roit0x9+svNpIKv3nCM8jXPZZfnE6vAkd37AQ1k6w+UpsHAsX5QnEg7G96HrxgQKVBQFh4FzqHs/
0duVBTeaCLxGqDILHVy8oH6ralwAjy3O/jBZXaYd0GuV1VJFgSlvecUlHC9jlGgUlOh4JlolqI5CHzI
2UQUexNdyfPVnzz/kcEiWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|780EE74A-CA27-4A70-9C7D-DF3D60B14545|2018-06-11T10:07:27|MAS0810247C0|Qe
d+J0JANVAloYEjvO7LOfPfCuV2oJlEgYs9V2ChrMa80cLuqQL/g3AZ3uv9U0SGVlHhdG9+3xV6GwOZ
vpkW5+ljB88ICJ6x30lCB1uAlQaBT0alXl3iDgd4JbC+gBNW6GKwcx1nhEgklMKZpR2RFLK9Xd6Z0H1
XJsfFzI=|00001000000404486074||

Banco:

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN en San Gabriel, Jalisco el día _____ la cantidad de: $6,496.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según articulo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Firma de Aceptación

001958

00000321

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

SAYULA

FECHA: 23 / 04 / 2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 5pm 8hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Retroexcavadora CAT 420 E IT

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Cargando pedazos de concreto y escombro de la calle Porfirio Diaz.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

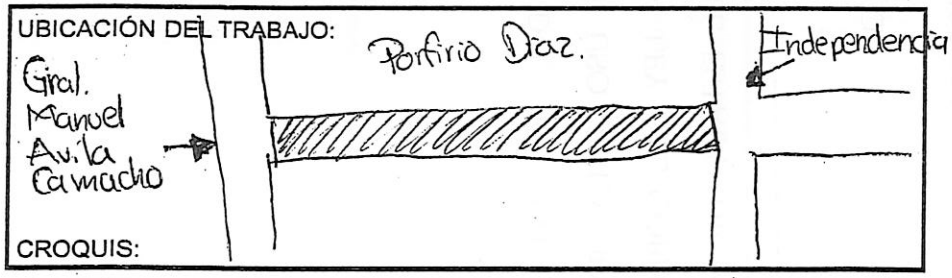

CROQUIS:

PROVEEDOR: Jose Arturo Altamirano Gurman.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 420 E IT
Fecha: 23 DE ABRIL DEL 2018

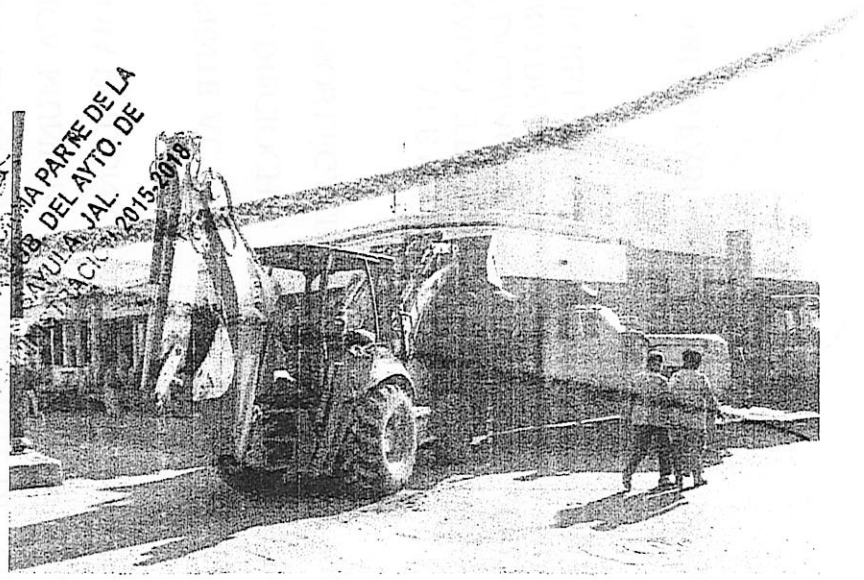

COPIA PARTE DE LA OBRA DEL AYTO. DE SAYULA JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001959

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

SAYULA

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 27/04/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 5pm 8hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Retroexcavadora CAT 420E IT

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Cargando escombro y cargando a camiones de 7m³.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

PROVEEDOR: Jose Arturo Altamirano Guzmen.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

0001330

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT 420 E IT
Fecha: 27 DE ABRIL DEL 2018

0001330

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

COPIA DEL CHEQUE

68519296

Páguese por este cheque a la orden de: TOMAS FLORES RAMIREZ

Fecha 20 de junio de 2018

$ 2,610.00

CON LETRA (DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

5 1 7 1 5 1 3 2 0 0 1 7 0 1 0 0 1 1 1 6 5 4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 9

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	00111654020	GH 19

CONCEPTO DEL PAGO: A1108 Y A1107 PAGO POR LA RENTA DE CAMION 7M3 UTILIZADOS EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO: Luis Vargas P.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
3270	- 0300 - 6142		2,610 -		
1112	- 01 -	87		2,610 -	

SECRETARIA GENERAL

001972

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					00009324

Impresos TEC P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

1

ORDEN DE PAGO SAY 25558

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

TOMAS FLORES RAMIREZ La cantidad de $ 2,610.00

(DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR LA RENTA DE CAMION 7M3 UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. (FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018).

001973

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Luis Vargas P

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

SAYULA Jal., a 20 de JUNIO de 20 1

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00000325

Factura A 1108

PAAL
MAQUINARIA CONSTRUCCION

TOMÁS FLORES RAMÍREZ

RFC: FORT691210PRA

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000401853730

Folio Fiscal: 01796567-d0e7-4954-975e-0d26b7175840

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

RFC: MSA8501018C8

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:49300

Fecha y hora de emisión: 2018-06-11T11:46:36

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
5.5	NL - 1	78141501 - ACARREO MATERIAL CAM 7 MTS JS-59 802 DIA: 23-ABRIL OBRA: PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ * FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	180.00	002 - IVA: 158.40	990.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SECRETARÍA GENERAL

001974

SubTotal $	990.00
+IVA (16%) $	158.40
=TOTAL $	1,148.40

CANTIDAD CON LETRA : MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO : 99 - Por definir
FECHA TIMBRADO : 2018-06-11T11:48:05
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDi

qybEWVpdSy7NqwrwhsPCg0XcPIJ3N84dNyvnspMlW6zOKITxcOaV53BKa8IFiAkDWazsoPSuA1E0municYEeQuWv94VN9mdb+uWg
W6xnyruvcb155GLcmRTrYulOf3eRq0F3ZE08QC+pU1366vQYNtCcmK2dvzIG+9O/CXGZ6vVY9YzyIY269noqspUvHimABBReFrWqg5
c5QgTen+ilNDSR6DNAPON6WkLF1wk9m/WCGM91vhGlnOK2rnW8I+ci0fdLjBIB5sGpuAoURZE6Ma/UGibzT4gGYcn6VryIN+dRNyFx
yxnKGvT7dxSwbSyrxnQAC6Z/JWKj/ieikBpnQg==

Sello Digital del SAT

Y2wWDdqKG1ehG94bdK113+OEJ0ljPK7eE2ztmmO+ZF32ZGajf5Bh7SEhubE7j1WfeQANDw5b/KEE5SZgWgyB3zszjldwDbJab0nyDl
Vrwx8Nq0faUp4uG/BMUpOWGMbRhP2PUolw/Gp4eKClSvsZENmZYhyTGYUJqlwLf+bGv46GYqk1YQQsrhhijdGv+K29QShLtLIyyptvp
1n6X3n6YVa2QSEwvg6l+Wd8YztdvgohP68hjid4x30dPUuhTg+sdlEEFm8CekH4+ulbLphMWNc86WXR5mRR1dbWL1e62AD//Yr/+a53
UnvXs0SpVymJWorzH4YdR2OD/S7aMQXaiQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|01796567-d0e7-4954-975e-0d26b7175840|2018-06-
11T11:48:05|CAD100607RY8|qybEWVpdSy7NqwrwhsPCg0XcPIJ3N84dNyvnspMlW6zOKITxcOaV53BKa8IFiAkDWazsoPSuA1E0mu
nicYEeQuWv94VN9mdb+uWgW6xnyruvcb155GLcmRTrYulOf3eRq0F3ZE08QC+pU1366vQYNtCcmK2dvzIG+9O/CXGZ6vVY9YzyIY2
69noqspUvHimABBReFrWqg5c5QgTen+ilNDSR6DNAPON6WkLF1wk9m/WCGM91vhGlnOK2rnW8I+ci0fdLjBIB5sGpuAoURZE6Ma/UGibzT4gGYcn6VryIN+dRNyFxyxnKGvT7dxSwbSyrxnQAC6Z/JWKj/ieikBp
nQg==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000326

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

SAYULA
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 23, 04, 2018

HORAS O VIAJES: 9:20am a 3:00pm 5.5hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Volteo 7m³, JS 59 802

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

~~Cero~~ Acarreo de escombro de la calle. Porfirio Diaz.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:



PROVEEDOR:

Tomas Flores Ramirez.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA, PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE CAMION 14M3, JS59802
Fecha: 23 DE ABRIL DEL 2018

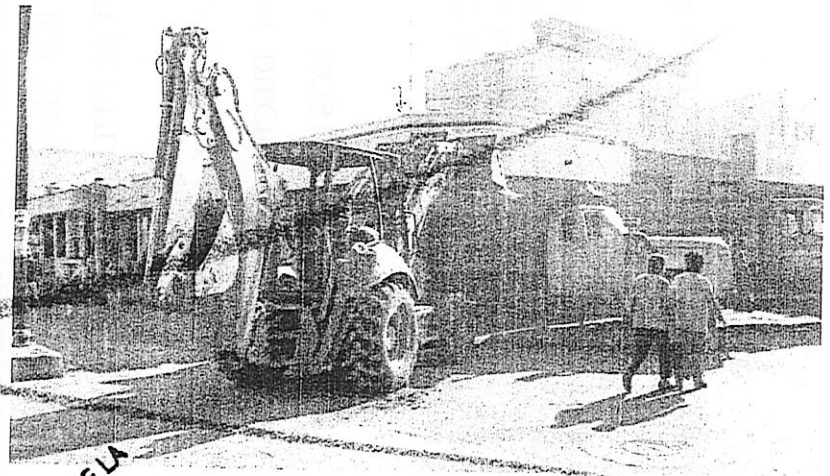

001975

Factura A 1107

PAMAL
MAQUINARIA CONSTRUCCION

TOMÁS FLORES RAMÍREZ
RFC: FORT691210PRA
Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000401853730
Folio Fiscal: 00f88c5f-a6dd-4dc7-9e97-a40572125b02
Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA8501018C8
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN
CP:49300
Fecha y hora de emisión: 2018-06-11T10:39:21

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
7	NL - 1	78141501 - ACARREO MATERIAL CAM 7 MTS JT-09736 DIA: 08-MAYO OBRA: PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ *FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018	180.00	002 - IVA: 201.60	1,260.00

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001976

SECRETARÍA GENERAL

SubTotal $	1,260.00
+IVA (16%) $	201.60
=TOTAL $	1,461.60

CANTIDAD CON LETRA : MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PPD - Pago en parcialidades o diferido | FORMA PAGO : 99 - Por definir
FECHA TIMBRADO : 2018-06-11T10:40:50
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDi

mBNQn48nmCdIC50piraXpOHKDeqHwCX/CCYa4dkXONWF9rQBkcZseNUzbp5SGSZ0pgbfeN+cLAM4xR4q9pJvSgMxiHgoT2E4o937
EqIhlKUn2lB+jzJPUcDOUiV7YR2CNMmQGIE3EltHB/9XnQPUpvgL2QMlbQhhFbmL7A4g6LSWdunGsk2QupUsObTK7zpDee5jQfbVL9
WLL000le3S+XPsX1aexifbzHpE2+XimLkgLIWG2vZVqW+XaSIGgRS8XA+xx7plqfDKsv0Dy91PmZfOvcgmGdjLDJvM9FJncKMNOBcR
mzNUnjtW0/qQeET4t1nZl6NffgxNBUTwyCziig==

Sello Digital del SAT

nV0WqKHvylGdLEOLoG04FLDg8H36UIgMwuxj9FgQXI7II/pCrE8cVZK1zQaJfBdgMLIpQ2Y/wLIU8nXgQc7goK76ESiwhYKd/Fd3IPKa2
B7HmfPShvO6VDbmP+8pJtTQTu7m/yec+vPfxB5cNkqbAtjBzQA0flxeBHG6KXeXUwRVBH+sDfog7Owjg2Hvwwd9GCCpC2tS3j4idLrm
aTkuQQ35uDul6X/grGzfTTC736ba6nWjMctvUjbNPUE1jyl8KPP2rdhJPnEAytOLoMdJHsuLA0aerDqeDDkwKO5w/pRAfW9P8kN5L291
2E4KG4CNjVTaJG3klz3gl/otv1oxUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00f88c5f-a6dd-4dc7-9e97-a40572125b02|2018-06-
11T10:40:50|CAD100607RY8|mBNQn48nmCdIC50piraXpOHKDeqHwCX/CCYa4dkXONWF9rQBkcZseNUzbp5SGSZ0pgbfeN+cLAM4
xR4q9pJvSgMxiHgoT2E4o937EqIhlKUn2lB+jzJPUcDOUiV7YR2CNMmQGIE3EltHB/9XnQPUpvgL2QMlbQhhFbmL7A4g6LSWdunGsk
2QupUsObTK7zpDee5jQfbVL9WLL000le3S+XPsX1aexifbzHpE2+XimLkgLIWG2vZVqW+XaSIGgRS8XA+xx7plqfDKsv0Dy91PmZfOvcgmGdjLDJvM9FJncKMNOBcRmzNUnjtW0/qQeET4t1nZl6NffgxNBUTwy
Cziig==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000328

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
2015 - 2018

SAYULA
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 08 / 05 / 2018

HORAS O VIAJES: 9:30am a 4:30 7hrs

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA:
Renta de Volteo 7m3, JT09736.

OBRA: (X) Drenaje Porfirio Diaz Usmajac. MANTENIMIENTO: ( )

TRABAJOS REALIZADOS:
Acarreo de la limpieza de la calle Hidalgo de Barros y escombro.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

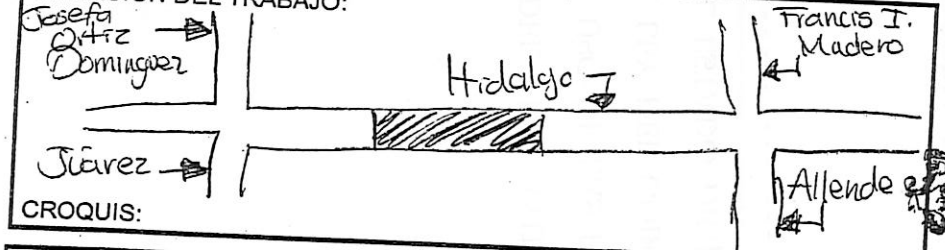

CROQUIS:

PROVEEDOR:
Tomas Flores Ramirez

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLE.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3, JT09736

Fecha: 08 DE MAYO DEL 2018

C0000329

L16100

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

44847247

COPIA DEL CHEQUE

(1)

Páguese por este cheque a la orden de: MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

Fecha 28 de junio de 2018

$ 3,549.60

CON LETRA TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

6708 5132001701 00111654020 00000021

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 21

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO POR LA RENTA DE CAMIÓN UTILIZADA EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
3270	- 0300 - 6142		3,549.60	0	
1112	- 01 - 87			3,594.60	

SECRETARÍA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001984

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 00000330

Impresos JEC P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 25826

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO La cantidad de $ 3,549.60

(TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMION 7M3 UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. (FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018.).

001985

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SECRETARIA GENERAL

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

SAYULA Jal., a 27 de JUNIO de 20 18

LIC. JOSE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL
SAYULA, JAL.

CORTEZ ANGUIANO MARTHA REGINA

COAM800731B56

(621) Incorporación Fiscal

PROLONGACION INDEPENDENCIA No. 284-A

Col. Sayula Centro. C.P. 49300.

Sayula, Sayula, Jalisco, MEX.MEX

Referencia: VINS421210

3121161093

regina_8007@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 168

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (49300)

No. Certificado: 00001000000406844140

Fecha de emisión: 2018-06-11T12:47:27

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (02) Cheque nominativo

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: $ 3,549.60

Receptor

(07) MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

MSA8501018C8

Domicilio: ESCOBEDO No. 52

Col. CENTRO. C.P. 49300.

SAYULA. SAYULA, Jalisco, MEX.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
renta de camion de 7m3 JE 63531 LOS DIAS 24 Y 26 DE ABRIL	17	$ 180.00	$ 3,060.00

Clave de producto o servicio: 01010101 Clave de unidad: E48

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	$ 3,060.00	$ 489.60

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	$ 489.60

Importe con letra:

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN

Subtotal	$ 3,060.00
Total de impuestos trasladados	$ 489.60
Total	$ 3,549.60

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-06-11T12:47:28 UUID: ABF23DAA-7CCD-430D-A740-39DF5AB4B653

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

BvpzLG2hg47pktCG2QrSIQTgMTFHTk91hGLuxnSszJrDEOqZcG9EcjbwJks3E28umIYnsXeyil9qjyjmxmuR2Q3ulynEjkInQbkDiZEUiCQOsQQ5qrUMOY+FOoRE/ZKIdg/Bvr
yANjr4QunyvZNTo8UHsZ80bJi02eDg8ewj1k0sq0Y5F+/w0IzF11cbDMjgjTsnRHLCUkmNO3ULdyCIVAC/s33GJ7uBV32TN6bNQ6kTNnjsduimUxYxUD2jPMnit5e9SkRXpxO
grWujoD6cioUi9OJhPs3xTNnU7eadgJAsGkoRN+hvtPxfd7rLu6eFg0XaqHoHv3tQkTK1YYfyzw==

Sello digital del SAT:

dVdO5iqn/q3PFbz5U8TNzml5lVsgrAJwJzowXc4d5SWv9IKKa4ZjWH6ZIsJCDfIN76JD+ieb8canVSUAlgBAGIphFa17ZvihvIicvS5yPAJe62JeutHX5WEzgHqdh869dRlh33sB
dDUQdDigVnzHZJo4nwmrbnFdJJxuBX35J1s2dGCafguexp4GXLKwNIOowKDmwb/QiuF5RIgIC9IAPIIvQGK9JF2IC0bvaCT+Fho+7QWWGw+QJLJLhqds+wd4ypI+wYd
pcJpQnYC1UNfsBpwQyIKpHLpOVfzXLQ1gPhuq0n9JUGFEMGyVOTAmPNaWlW6LZNyu9aXo7M0B4g7

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ABF23DAA-7CCD-430D-A740-39DF5AB4B653|2018-06-
11T12:47:28|FCG840618N51|BvpzLG2hg47pktCG2QrSIQTgMTFHTk91hGLuxnSszJrDEOqZcG9EcjbwJks3E28umIYnsXeyil9qjyjmxmuR2Q3ulynEjkInQbkDiZEUiCQOsQ
Q5qrUMOY+FOoRE/ZKIdg/BvryANjr4QunyvZNTo8UHsZ80bJi02eDg8ewj1k0sq0Y5F+/w0IzF11cbDMjgjTsnRHLCUkmNO3ULdyCIVAC/s33GJ7uBV32TN6bNQ6kTNnjsdui
mUxYxUD2jPMnit5e9SkRXpxOgrWujoD6cioUi9OJhPs3xTNnU7eadgJAsGkoRN+hvtPxfd7rLu6eFg0XaqHoHv3tQkTK1YYfyzw==|00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

ESTE FOLIO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL EJ. FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018

001988

00000332

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 24, 04, 2018

HORAS O VIAJES: 8:00 a 5pm — 7hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Volteo 7m³, JE63537

OBRA: (X) — MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de escombro.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

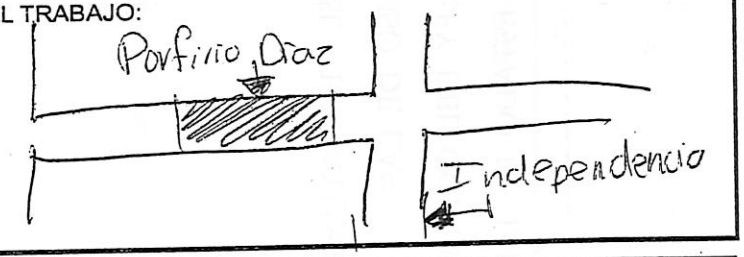

PROVEEDOR: Martha Regina Cortez.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCION DE DRENAJE, LINEA DE AGUA, PAVIMENTO HIDRAULICO.
Concepto: RENTA DE CAMION 7M3, PLACAS JE635
Fecha: 24 ABRIL DEL 2018

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA ... DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION 2015-2018

00000323

05/1537

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

SAYULA
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

FECHA: 26/04/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 5pm 6hrs.

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:
Renta de Camion 7m3 JE 6 3531

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de Escombro.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

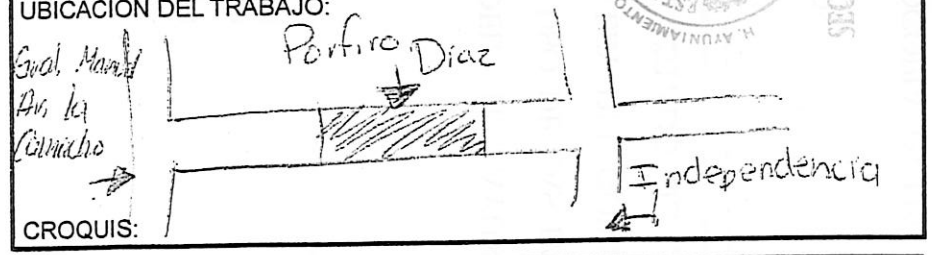

CROQUIS:

PROVEEDOR: Martha Regina Cortes

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCION DE DRENAJE, LINEA DE AGUA, PAVIMENTO HIDRAULICO.
Concepto: RENTA DE CAMION 7M3, PLACAS JE63531
Fecha: 26 ABRIL DEL 2018

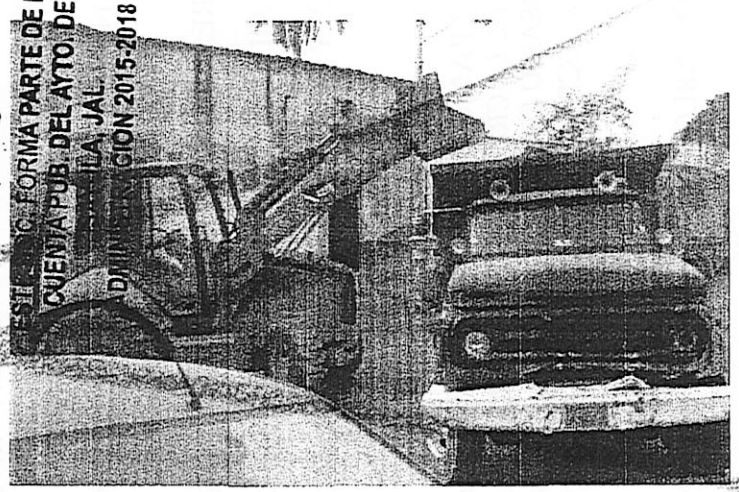

ESTA COPIA ES FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001988

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 01/05/2018

HORAS O VIAJES: 9:00am a 1pm 4hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:
Renta de Volteo 7m³, JE G 3531

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Calle Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Limpieza de la calle Porfirio Diaz

UBICACIÓN DEL TRABAJO:



CROQUIS:

PROVEEDOR: Martha Regina Cortes.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS V. EJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCION DE DRENAJE, LINEA DE AGUA, PAVIMENTO HIDRAULICO.
Concepto: RENTA DE CAMION 7M3, PLACAS JE63531
Fecha: 01 DE MAYO DEL 2018

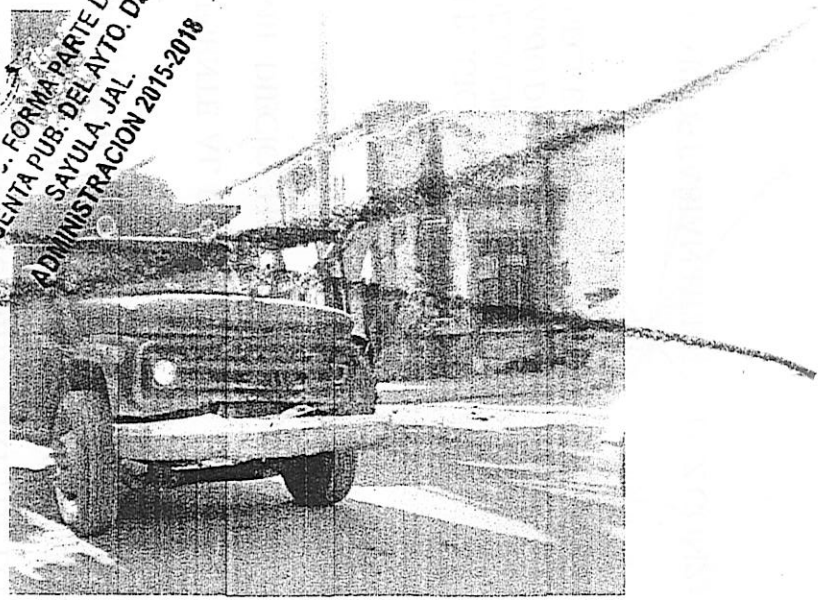

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

6881.38

BBVA Bancomer

43826827

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: MANUEL MEJIA VALENCIA

Fecha 4 de julio de 2018

$ 19,720.00

CON LETRA: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

9315 513200170 00111654020 00000024

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	00111654020	CH 24

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA CON ROTOMARTILLOS UTILIZADO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIO DE LA CALLE .

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
8270	0300 - 6142		19,720.-		
NO - 01 - 87				19,720.	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

002943

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 00000336

Impresos JEC P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 25938

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MANUEL MEJIA VALENCIA La cantidad de $ 19,720.00

(DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N)

por el siguiente concepto PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA ROMPER CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. (FONDO PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018).

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

002911

SEGUN COMPROBANTE A

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

_____ Jal., a 03 de JULIO de 20 18

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C3333327

UUID FISCAL B2ED56E9-4B74-40B6-A0A1-6A2FA55B300C

1

EMISOR

MANUEL MEJIA VALENCIA

RFC: MEVM530421I1A
KM. 2.5 CARRETERA LIBRE A COLIMA S/N

CURP: MEVM530421HJCJLN03

ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO CP: 49000

GYTIME
CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES MEJIA
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
KM. 2.5 CARRET. LIBRE A COLIMA S/N
50 MT. DE TEL. 01 341 [illegible]
TELCEL (341 [illegible])

RECEPTOR

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

RFC MSA8501018C8
ESCOBEDO 52
SAYULA CENTRO SAYULA - CP 49300 - SAYULA JALISCO MEXICO

Fecha de elaboración
2018-06-02T11:40:25

002945

Folio: 184
Serie: F

CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
72141701	1	E48	SERVICIO DE EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA ROMPER CONCRETO A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.	17.000.000000	17.000.00

Lugar de Expedición
49000

Moneda
PESOS

Forma de Pago
99 - POR DEFINIR

Tipo de Cambio
1.0000

Método de Pago
PD - Pago en parcialidades o diferido

Totales

SUBTOTAL	17,000.00
IVA	2,720.00
RETENCION ISR	0.00
RETENCION IVA	0.00
TOTAL	$19,720.00

SECRETARÍA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Total con letra :
(DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

No. de Serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000405680885

Régimen Fiscal del Emisor :
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Sello Digital del CFDI :
IOUUACuKqQGpmGyHWqrCDXkrvEPE8FUIsgCawBNFdKv0jxCVnI28zTZf29rkP3o5SpMYaqv/Cdw4mAbeiQFJM74iu7IICfLEqUCEYP9QX2EMOms/xFsliL
ZVt+dR/uhKP9jKsxTol4oLS7SCf/aqPRuzOklplKppHpWJwrSWSP4uwcjQ7OuFfB2LEPVgv0KbFRql1gFvho+8koZklB93VhmFNTQ770/dVrcqOZg5HgLCa3e
TzCP9w3JitRezcq/zsMlfDFapd/rTNrZvDvtovhGgkqR3Vcu6eThdg6nk6a4SkdXHABzL3GGbzjQ8F3Vd579jqHoLDJA2z9URhyiw==

Sello del SAT :
BDwyFqhCr6yrVLXyt2RNaflCqkkcFpyluEDeM5h5JMD5Uxq0++Ar6KuAZguoWudIrj+b8XMLs3CjF8ohwPW8SnpSZhWFIRklQENGkbDDdGjQzR+coWShdh
XmLIXDIKhvEGF0M2cABkmg1P3wmw4ykf2ukSyPkzcf366eH4fQOOCCelb2vJd8VyNBBmxPvYivhcpRyzU6i75Va+aEMs5dJ1dsF7pNXaKBXolRdyQ3J6Eu
MqkbU/cMDfTlu68K+ot8OTposwUqzjnBPWJ9gMtXWNsmNv86m6rEr0C64IBiFw2ZD1bP2JAhiG4+l6ZkcUiO8W/4R7z7DVDRAb/vbnCw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :
1|B2ED56E9-4B74-40B6-A0A1-6A2FA55B300C|2018-06-02T11:41:36|DCD090706E42||IOUUACuKqQGpmGyHWqrCDXkrvEPE8FUIsgCawBNFdKv0j:
28zTZf29rkP3o5SpMYaqv/Cdw4mAbeiQFJM74iu7IICfLEqUCEYP9QX2EMOms/xFsliUHZVt+dR/uhKP9jKsxTol4oLS7SCf/aqPRuzOklplKppHpWJwrSW
4uwcjQ7OuFfB2LEPVgv0KbFRql1gFvho+8koZklB93VhmFNTQ770/dVrcqOZg5HgLCa3eWTzCP9w3JitRezcq/zsMlfDFapd/rTNrZvDvtovhGgkqR3Vcu6eT
g6nk6a4SkdXHABzL3GGbzjQ8F3Vd579jqHoLDJA2z9URhyiw==|00001000000406258094||

Número de Serie del Certificado del SAT :
00001000000406258094

Fecha y hora de certificación :
2018-06-02T11:41:36

Uso del CFDI :
G03 - Gastos en general

00000338

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al Pago

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

SAYULA GOBIERNO CON PRINCIPIOS

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 19/04/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 5pm 7hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Excavadora con Rotomartillo.

OBRA: Porfirio Diaz.

MANTENIMIENTO:

TRABAJOS REALIZADOS:

trabajo de tronar el concreto que se encuentra en la calle Porfirio Diaz.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

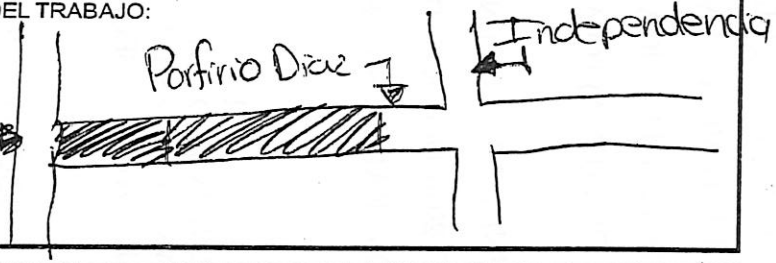

PROVEEDOR: Manuel Mejia Valencia.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO.

Concepto: RENTA DE EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO.

Fecha: 19 DE ABRIL 2018

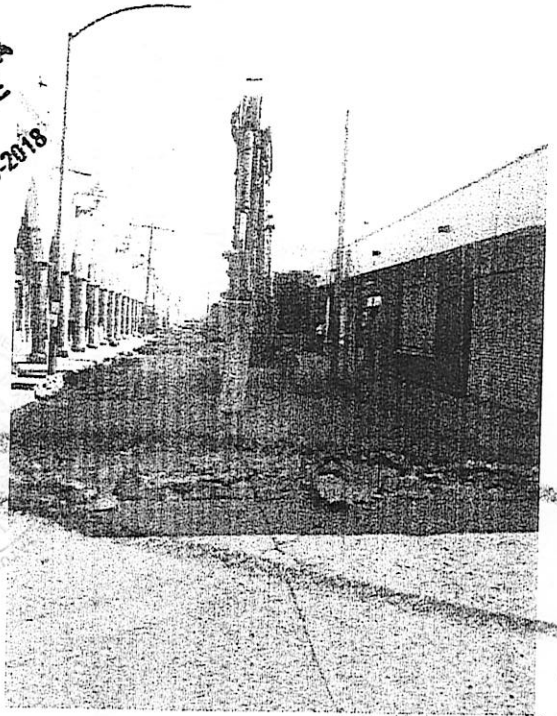

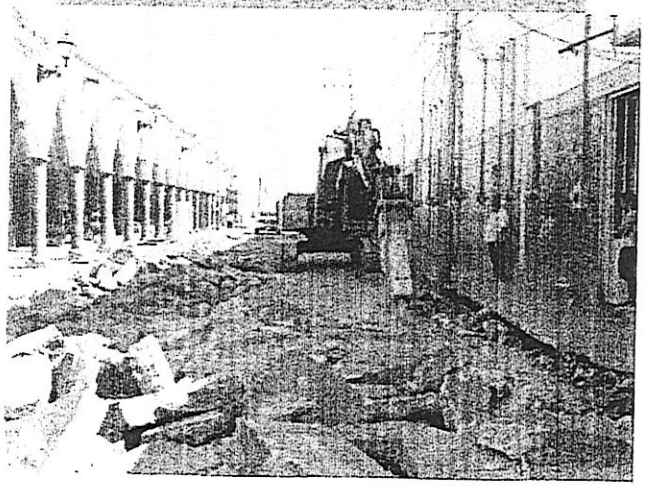

(1)

002947

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00000340

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BBVA Bancomer

47378047

Páguese por este cheque a la orden de: ANA ISABEL MACIAS MACIAS

Fecha 18 de julio de 2018

$ 2,505.60

CON LETRA: (DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.) Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

2733 513200170100111654020 28 00000027

BANCO: FONDO PROY REG 2018

No. DE CUENTA: 111654020

No. DE CHEQUE: CH 27

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA ;PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

002959

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					000934

9038

Impresos JEC P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26301

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

ANA ISABEL MACIAS MACIAS La cantidad de $ 2,505.60

(DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS DE LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFORIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. (FONDO DE APORTACION DE DESARROLLO REGIONAL 2018).

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

002960

SEGÚN COMPROBANTE

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

SAYULA Jal., a 16 de JULIO de 20 18

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000342

ANA ISABEL MACIAS MACIAS

RFC: MAMA6206209L2

Factura

Domicilio y Expedido en:
C.MAGUEY N° Ext.36 Col.LA MEZCALERA CP.49300,SAYULA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 49300
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA8501018C8
Domicilio: C.ESCOBEDO N° EXT.52 COL.CENTRO CP.49300,SAYULA,JALISCO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 5869F086-1D32-4E30-A16A-F1BDE5F823CC
Número de comprobante: 75
Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Fecha comprobante: 2018-07-13T09:35:50
Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-13T09:36:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
12	HRS	SERVICIO DE CAMION VOLTEO DE 7 MT3 JH 15 029, 2, Y 19 DE JUNIO 2018	180.00	2,160.00

Subtotal	2,160.00
IVA (16) %	345.60
Total	**2,505.60**

DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000407207765

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5869F086-1D32-4E30-A16A-F1BDE5F823CC|2018-07-13T09:36:55|TSP080724QW6|Zb07B2sPiqxqiQhM2S4b5N1l5lzQZS0CfQAgA4LgaN8lI1VMZOGngse/uwHbfF/VKGdSl4fookVulr0E3+focVj135XNv3qizP2WtYwnmiAD4oGPhTdHoVMNGUIlH1KFSjfg3jGJakG23du9xF/m6alTusjM4mHAY36r8MLQ6PJNSE+VWkfOD8PWdXCx+TSJQAbtcxBaqMOONbrZzcczzmquAfm4xyxHWAXL/XTBcS7/Kszk1Vva7a7DqawQjj6PLL/pJjbGnPx6OZeVZpBuxMxHNtKo1OKWGeHwPYROWRbl9oU86O32xtzNoOZJiGBe0FbYi5EioWUt+SYekQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

Zb07B2sPiqxqiQhM2S4b5N1l5lzQZS0CfQAgA4LgaN8lI1V/kZOGngse/uwHbfF/VKGdSl4fookVulr0E3+focVj135XNv3qizP2WtYwnmiAD4oGPhTdHoVMNGUIlH1KFSjfg3jGJakG23du9xF/m6alTusjM4mHAY36r8MLQ6PJNSE+VWkfOD8PWdXCx+TSJQAbtcxBaqMOONbrZzcczzmquAfm4xyxHWAXL/XTBcS7/Kszk1Vva7a7DqawQjj6PLL/pJjbGnPx6OZeVZpBuxMxHNtKo1OKWGeHwPYROWRbl9oU86O32xtzNoOZJiGBe0FbYi5EioWUt+SYekQ==

Sello digital del SAT:

gkWpfORyOzeE+W61TE6iM8/5dhNE8d4nroj3OcX6sUOTx5a+iGtAbZ3l3UqZBFIUcP2OY+h7k+eDTx0QNqQ84ONWjA0kWApvWyeAaoEc7vD6pHVyQjc2i9j4p2PJP/HqocgpS+rW64cZF9nNIIF0nZ66vd9yg/NvQTI8GMIN/c6Lnjq0bl2MRT2YxfrzEkAnn2BmzdxWd3YPdBWg+MAyM9RZ+rVcwY1zI5wZsS2w1zIFY+JtL9TaXeTECpg77QVmEM/O3h4KzfjE1+Nt7x6H4aJ2b3iV3HcbMwte16HPJvzMqGx0K7AmrnpsoT9/kFYjt439uLUfxNtyTjL+9lqg==

002961

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

00000343

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 02 / 06 / 2018

HORAS O VIAJES: 9:00am a 4pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m3 JH15029

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de tierra de la calle Porfirio Diaz, al tianguis Municipal

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

PROVEEDOR: Ana Isabel Maria Macias

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE, Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3, Jh15029

Fecha: 02 DE JUNIO 2018

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 19 / 06 / 2018

HORAS O VIAJES: 7:00am a 3pm

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m³ placas JH 15 029

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Rumeo de tierra de la calle Porfirio Diaz a/ tianguis Municipal.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

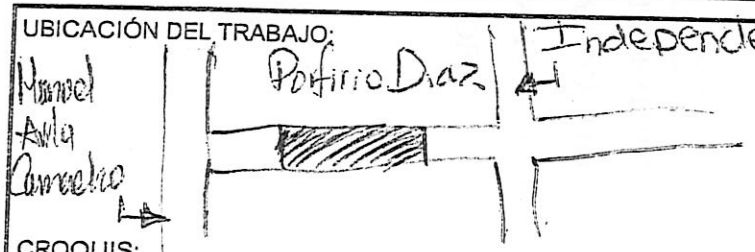

PROVEEDOR: Ana Isabel Matas Macias

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE, Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3, Jh15029

Fecha: 19 DE JUNIO 2018

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

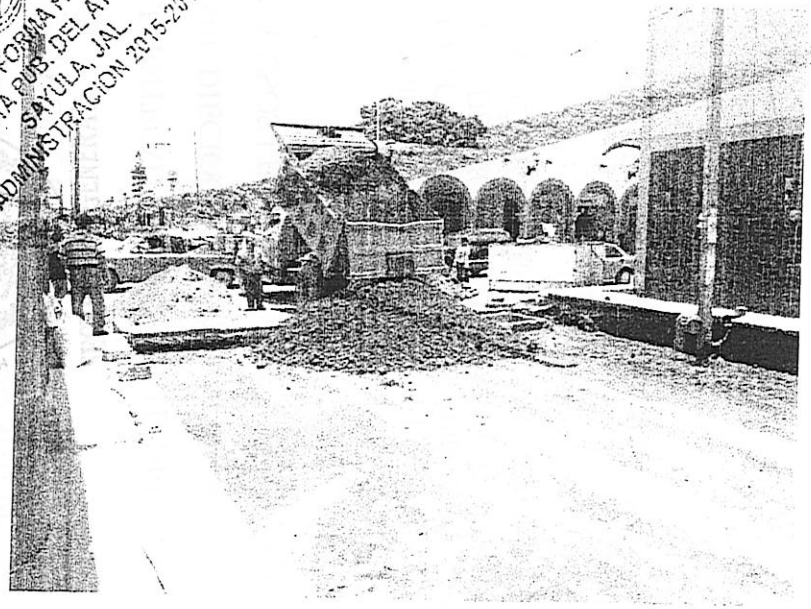

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

COPIA DEL CHEQUE

41769898

Páguese por este cheque a la orden de: ANA ISABEL MACIAS MACIAS

Fecha: 3 de agosto de 2018

$ 5,011.20

CON LETRA: (CINCO MIL ONCE PESOS 20/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

0127 513200170 00111654020 00000031

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
PROYECTOS REGIONALES J	111654020	CH 31

CONCEPTO DEL PAGO: FACTURA 37 PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO MES UTILIZADO EN AL OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO: Julio Flores

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003441

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					00000346

Impresos JEC® P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26574

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

ANA ISABEL MACIAS MACIAS La cantidad de $ 5,011.20

(CINCO MIL ONCE PESOS 20/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ. (FONDO DE APORTACION DE DESARROLLO REGIONAL 2018).

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 01 de AGOSTO de 20 18

LIC. [illegible] CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

003442

ANA ISABEL MACIAS MACIAS
RFC: MAMA6206209L2

Factura

Domicilio y Expedido en:
C.MAGUEY N° Ext.36 Col.LA MEZCALERA CP.49300,SAYULA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 49300
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA8501018C8
Domicilio: C.ESCOBEDO N° EXT.52 COL.CENTRO CP.49300,SAYULA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: FE278089-432E-4F83-A3FA-B92E9D4509B9
Número de comprobante: 77
Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Fecha comprobante: 2018-07-17T12:19:39
Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-17T12:21:34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
24	HRS	SERVICIO DE CAMION VOLTEO DE 7 MT3 JH 15 029, 3,4,5,6 DE JULIO 2018	180.00	4,320.00

Subtotal	4,320.00
IVA (16) %	691.20
Total	**5,011.20**

CINCO MIL ONCE PESOS 20/100 M.N.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00010000000407207765

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|FE278089-432E-4F83-A3FA-B92E9D4509B9|2018-07-17T12:21:34|TSP080724QW6|gj0mruhlooSJ/PkcWAV5RE5MyFzFh/1ku4V6bGdwjloD
tK6aOFCIOKXfEsI9YUZMYN8sI+D/LnnKvAMDJZ0M+go+qVasPTXsgWj1IlrbHUXQkBYP+C6W5prdFNFZTM2Flp5J0OYaWmgAbFRmcJ6ZAMkSzNWKaKja8oB9
4lORwdvCfSJTyd1zdnXEuMUcalMQQxa/6apyTOCkmMYy6agmJp/kXag6OGLMJw6FEtW97qHlrtmIlwm0qahKOls2dAAdpxheIY+ZWW/jydQCXO0FZDQPxPco
oM7Zw2JJFWhGUEbZEW8kvRtulkR6YW6g+lOwSW0Q1+abpC4jfucuVkzVg==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:
gj0mruhlooSJ/PkcWAV5RE5MyFzFh/1ku4V6bGdwjloDtK6aOFCIOKXfEsI9YUZMYN8sI+D/LnnKvAMDJZ0M+go+qVasPTXsgWj1IlrbHUXQkBYP+C6W5prdFNFZTM2Flp
5J0OYaWmgAbFRmcJ6ZAMkSzNWKaKja8oB94lORwdvCfSJTyd1zdnXEuMUcalMQQxa/6apyTOCkmMYy6agmJp/kXag6OGLMJw6FEtW97qHlrtmIlwm0qahKOls2dAAdpxhe
tY+ZWW/jydQCXO0FZDQPxPcooM7Zw2JJFWhGUEbZEW8kvRtulkR6YW6g+lOwSW0Q1+abpC4jfucuVkzVg==

Sello digital del SAT:
FrmhEO2flbnK5El3wa1hQYxZ3UBDCPhWy671wVtF0jnJ3aqxopAu2mH1fiR+GU46lcI5FWedcE+wUvYZlmVHRss3KjGhUpzJkm9JXCdz670MoY0LCoFy67nYmDWeb6F
ds9wR7UeU66hb/SS9v1fqvErcQcABAsm0K+g0RvqVtzXfiN0GSrrZZjDZz9eBJmipEJs4qb0x63yM5VxTScHaGwZEo26rgaLjR7xuzzN7HR7uolqfGRW2QY7kqNgBaoa5V
7vlkXzNh+oCh+oowERinHmcPA9NWeXK29nwxXTlqpDEDdUqf3SchN1xJqKDLjE/RHShn7hinlDA3d0CZrg==

003443

Emitido por: FACTURe Aspel de México S.A. de C.V

00009348

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

SAYULA

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 03/07/2018

HORAS O VIAJES: 9:00am a 4pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de camion de 7m³, JH15029.

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de base para la calle Porfirio Diaz

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

PROVEEDOR: Ana Isabel Macias Macias

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATO VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FORFIRIO DIAZ.

Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3, JH15029

Fecha: 03 DE JULIO 2018

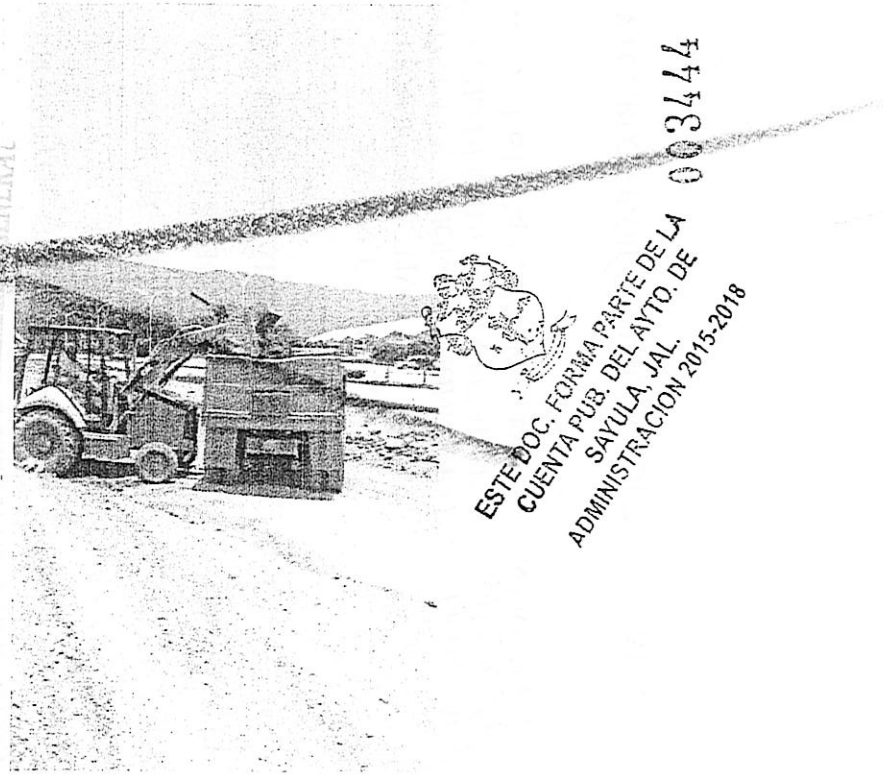

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003444

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

SAYULA
GOBIERNO CON PROYECTO

FECHA: 04/07/2018

HORAS O VIAJES: 9:00am a 3pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:
Renta de Camion 7m³, JH15029

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de tierra de la calle Porfirio Díaz al tiraderos Municipal.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

PROVEEDOR:
Ana Isabel Macias Macias

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS [illegible]LLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3, JH15029
Fecha: 04 DE JULIO 2018

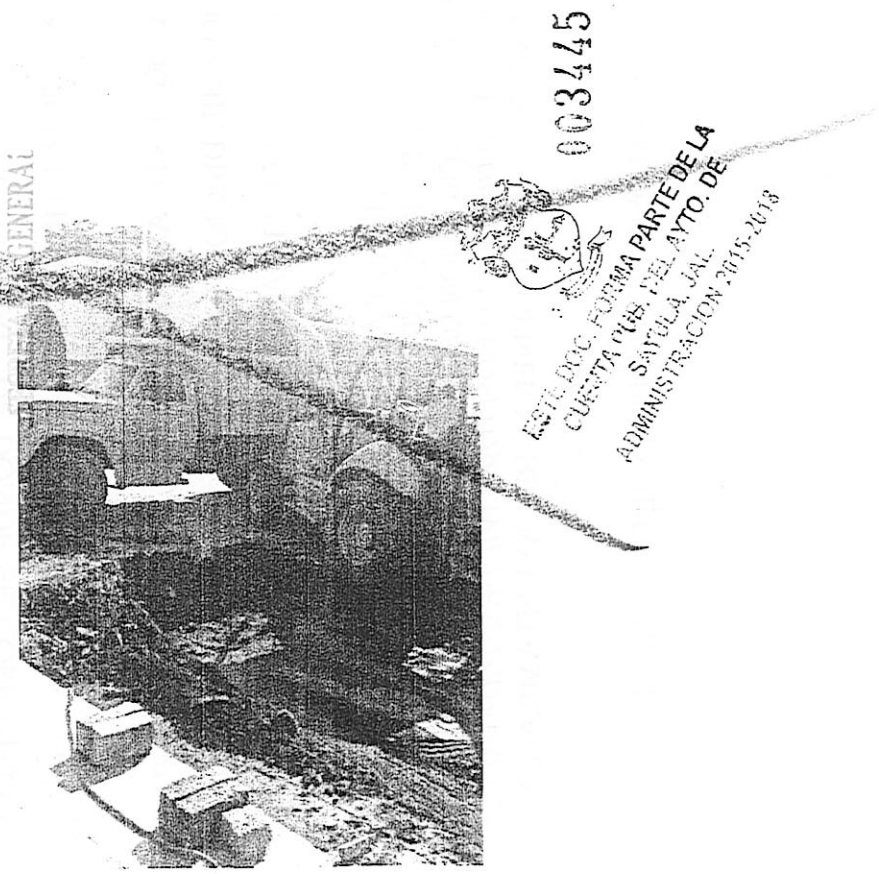

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

SAYULA
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

FECHA: 05/07/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 5pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m3, JH15029.

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de tierra de la calle Porfirio Diaz. al Municipal para hacer el cajon de la calle para poner base.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

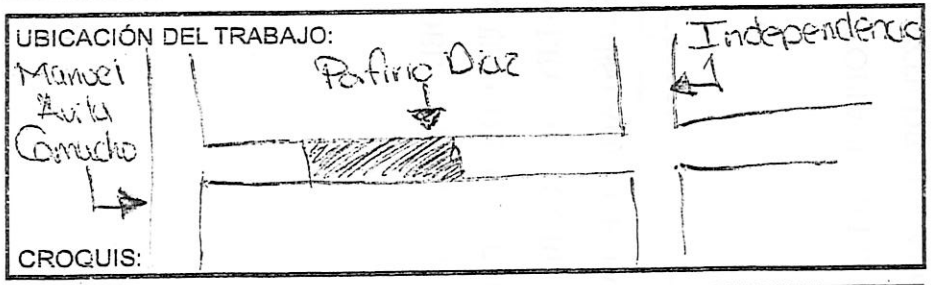

PROVEEDOR: Ana Isabel Macias Macias

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATO VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FORFIRIO DIAZ.

Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3, JH15029

Fecha: 05 DE JULIO 2018

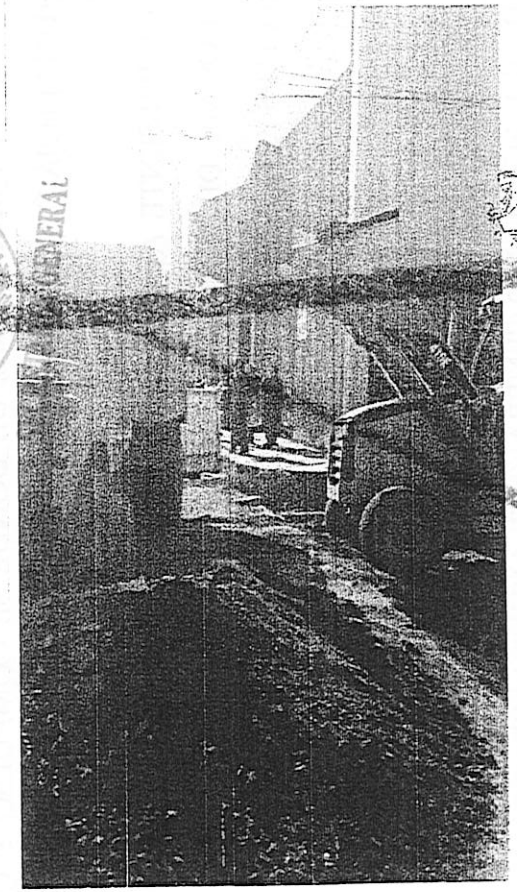

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

SAYULA
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 06/07/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 3pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:
Renta de Camion 7m3, JH15029.

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de base del tianguis Municipal a la calle Porfirio Diaz.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

PROVEEDOR: Ana Isabel Macías Macías

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATO VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FORFIRIO DIAZ.

Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3, JH15029

Fecha: 06 DE JULIO 2018

03447

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

COPIA DEL CHEQUE

42597720

Páguese por este cheque a la orden de: MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

Fecha 3 de agosto de 2018

$ 1,252.80

CANTIDAD: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

8191:513200170100111654020100000322

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
OYECTOS REGIONALES 2	111[illegible]4020	CH 32

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO 7 M3 UTILIZADO EN AL OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26573

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO La cantidad de $ 1,252.80

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR LA RENTA DE 6 HORAS DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ. (FONDO DE APORTACION DE DESARROLLO REGIONAL 2018).

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA JAL.

SAYULA 01 AGOSTO

Jal., a _____ de _____ de 20

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA JAL.

ING. [illegible] DE CAMPOS AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

003450

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00000354

CORTEZ ANGUIANO MARTHA REGINA
COAM800731B56
(621) Incorporación Fiscal
PROLONGACION INDEPENDENCIA No. 284-A
Col. Sayula Centro. C.P. 49300.
Sayula. Sayula, Jalisco, MEX.MEX
Referencia: VINS421210
3121161093
regina_8007@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 185
Versión: 3.3
Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (49300)
No. Certificado: 00001000000406844140

Fecha de emisión: 2018-07-17T13:55:17
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (99) Por definir
Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Total del CFDI: $ 1,252.80

Receptor

(07) MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MSA8501018C8
Domicilio: ESCOBEDO No. 52
Col. CENTRO. C.P. 49300.
SAYULA. SAYULA, Jalisco, MEX.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Descripción

renta de camion de 7 m3 je 63531 26 de junio 2018

Clave de producto o servicio: 01010101 Clave de unidad: E48

Cantidad	Valor unitario	Importe
6	$ 180.00	$ 1,080.00

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	$ 1,080.00	$ 172.80

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	$ 172.80

Subtotal	$ 1,080.00
Total de impuestos trasladados	$ 172.80
Total	$ 1,252.80

Importe con letra:
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 MXN

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-07-17T13:55:19 UUID: E74C5A16-9045-447D-8517-D96A53CB3053

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

YiiHxKY8dUFS8aG6V0u7BaLp2+Q9y8FyEk+6ReyV2zOf1iILyIVvix4tJTfIvon387KQ2TPHIM1iGzq9A5msOAknEAM37/LCVI3ueuVzipxldUzlw1v8HNb6LQW43/xvxs33Qzwf
Lsj96za9TmJyqES6DdTqaW3+IX/xtqZkLV0dOmHujOq0slAaZCZalZqWTnXjurDj1TOdXsRwKrC0plMFb2bDvzMkAdGrNdDkEE2sT3boVEVmka9eX1sXTVJIGGHgpHkaz3F
4vFsWul2KC61mbk6wRQhapcQwodLNjwB91v7dd83fmGnC3XDhAL1ixDSzmoozyuoXqO4f3lBdbA==

Sello digital del SAT:

osJbcaMSWR7C3jORixTKkwSLfcd7QJpnQmz+qChUN7jGFPAigwWpzgZxFc2Q+824O1JneTsFZPH5PqdXdVMDgSUV/ovXxYuz1nDlatBm4bifB5g3YoL8QAA/sCURm1rFJ
ktAhkeSp6QqcAdj34qVMT9zDilzMBr4fQnAzpeMieZp52nP0DI7Ys3esVVKq/cMfmjW04RnbRJ1Ta9D4UrJOvEfmvd4ea3aAvnoXxMqUzEagjq6oOxnMnGe0dgkMO64Z2z+o
CBhUOFIGFQBaANAdu7LiLMBpayW+Kz5E9INrxam9OF7iMrcDPxPzbwaKBbVr5Og/qDbjX++msu+YYxNMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E74C5A16-9045-447D-8517-D96A53CB3053|2018-07-
17T13:55:19|FCG840618N51|YiiHxKY8dUFS8aG6V0u7BaLp2+Q9y8FyEk+6ReyV2zOf1iILyIVvix4tJTfIvon387KQ2TPHIM1iGzq9A5msOAknEAM37/LCVI3ueuVzipxldUzlw
1v8HNb6LQW43/xvxs33QzwfLsj96za9TmJyqES6DdTqaW3+IX/xtqZkLV0dOmHujOq0slAaZCZalZqWTnXjurDj1TOdXsRwKrC0plMFb2bDvzMkAdGrNdDkEE2sT3boVEVm
ka9eX1sXTVJIGGHgpHkaz3F4vFsWul2KC61mbk6wRQhapcQwodLNjwB91v7dd83fmGnC3XDhAL1ixDSzmoozyuoXqO4f3lBdbA==|00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003451

00000355

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

SAYULA

FECHA: 26/06/2018

HORAS O VIAJES: 9:00am a 4pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m³, placas JE63531

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Acariando tierra de la calle al tianguis Municipal.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

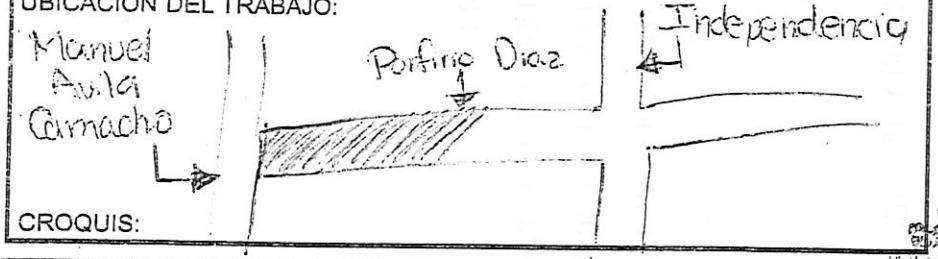

CROQUIS:

PROVEEDOR: Martha Regina Cortes Anguiano.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS LEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLIC.

ESTE DOC.: FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Obra: CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN SAYULA.

Concepto: RENTA DE CAMION 7M3, PLACAS JE635

Fecha: 26 JUNIO DEL 2018

003452

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

BBVA Bancomer

95475541

Páguese por este cheque a la orden de: MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ

Fecha: 3 de agosto de 2018

$ 1,252.00

(CANTIDAD EN LETRA) UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

9038

0187 0513 2001 7001 0011 1654 0201 0000 0033

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
PROYECTOS REGIONALES 7	11165 4020	CH 33

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO 37 PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO 7 M3 UTILIZADO EN AL OBRA, PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			003454		
		SUMAS IGUALES			

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					00000033

Impresos JEC® P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26569

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ La cantidad de $ 1,252.00

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR LA RENTA DE CAMION DE 7M3 UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. (FONDO DE APORTACION DE DESARROLLO REGIONAL 2018).

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SECRETARIA GENERAL

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA JAL.

SAYULA Jal., a 01 de AGOSTO de 20 18

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

ING. CARLOS AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

003455

00000358

RFC emisor:	VAJE690502UJ8	**Folio fiscal:**	AAA103F8-2521-4766-8F44-B31956D86F37
Nombre emisor:	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000403258748
RFC receptor:	MSA8501018C8	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	49300 2018-07-17 08:47:00
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Otra maquinaria y equipo	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78101801		6	E48		180.00	1080.00			
Descripción	HORAS DE RENTA DE CAMION DE 7 M3 PLACAS JD 94 612 DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 PARA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	1080.00	Tasa	16.0000%	172.80

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 1,080.00
Forma de pago:	Cheque Nominativo	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 172.80
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	$ 1,252.80

Sello digital del CFDI:

jWrYmA5tl4tb1+iKXDznNWO0Y7PuR7NXcgXVTUHhGy85o8KDPXKF0vemvZcT1Zma/WvjaUEF4a1y+/G/kxySx/eTNkYiBQgqatdpcjRI1T61XLLzuPbpRLnuh7o+juX7xxFAycYc+vsP6CHZE
voSbgJ3eNQpy9PBudnq6p8kUxl8eHnTPy+XVwt52k0w25WZ3IOVKv79fQpztIlNbMnJFcdx/hWo15VXtilbGIpUtVD7SMfTxb0vMoptQPWi9t48qiu5ARDjTxOI0ciJqJo1XLp++MWbCVMrT7p2C
LXhP3ifcPJiFB+lGcSk7Nch1/5rhwa3Kk5Vhqrq0wCFZZx2/w==

Sello digital del SAT:

S/YUTh81KV4MFtgUc8VaS/HM92nzzygYODggQhDZyzzOKhfFVr4qKaU0UwsKKP4nm7gAJfrKEFAL0zqW3VfG2eS1fu0B1fo1p+/kK21LrKPXUbabniNhDyUVB1czGYw1Rs1sL7+div0w0uk
UZB6Ul+nlj2tOwAx2CzcVUGrc7YnbHsM5IPGzbKQao1MMyFhnXEjHk2BPOBFkNd8q5LRlIiffAI5l6qb4U0J1GGX1KDrjCuxlptPq8vpNaADMcyIt25vDumopwlx/G1mBTrzVSckwmRJbuPPDR
94gAH12lfnU49bneMcupUSig31CtJ/shluS0V7a7by5JUTuKbFv44Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA103F8-2521-4766-8F44-B31956D86F37|2018-07-17T08:50:13|SAT970701NN3|jWrYmA5tl4tb1+iKXDznNWO0Y7PuR7NXcgXVTUHhGy85o8KD
PXKF0vemvZcT1Zma/WvjaUEF4a1y+/G/kxySx/eTNkYiBQgqatdpcjRI1T61XLLzuPbpRLnuh7o+juX7xxFAycYc+vsP6CHZEvoSbgJ3eNQpy9PBudnq6p8kU
xl8eHnTPy+XVwt52k0w25WZ3IOVKv79fQpztIlNbMnJFcdx/hWo15VXtilbGIpUtVD7SMfTxb0vMoptQPWi9t48qiu5ARDjTxOI0ciJqJo1XLp++MWbCVMrT7p
2CLXhP3ifcPJiFB+lGcSk7Nch1/5rhwa3Kk5Vhqrq0wCFZZx2/w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-07-17 08:50:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003456

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

SAYULA

FECHA: 19/06/2018

HORAS O VIAJES: 9:00am a 3pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m³ JD 94612.

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Apanado escombros de la calle. Porfirio Diaz.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:



CROQUIS:

PROVEEDOR: Maria Elena Vazquez Jimenez

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATO VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: Renta de camión de 7m3 JD94612
Fecha: 19 DE JUNIO 2018

003457

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

COPIA DEL CHEQUE

23224786

Páguese por este cheque a la orden de: ANA ISABEL MACIAS MACIAS

Fecha 9 de agosto de 2018

$ 5,011.20

CON LETRA (CINCO MIL ONCE PESOS 20/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

91 291 513 200 170 00 116 540 20 00000036

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
PROYECTOS REGIONALES 2	111654020	CH 36

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26941

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

ANA ISABEL MACIAS MACIAS La cantidad de $ 5,011.20

(CINCO MIL ONCE PESOS 20/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR EL SERVICIO POR LA RENTA DE VOLTEO CAMION 7M3 UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD (FONDO DE APORTACION DE DESARROLLO REGIONAL 2018).

JUAN CRUZ FIGUEROA

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL MPIO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003468

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

SAYULA Jal., a 09 de AGOSTO de 20 _____

ING. JORGE RAMOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

0000938

ANA ISABEL MACIAS MACIAS

RFC: MAMA6206209L2

Factura

Domicilio y Expedido en:
C.MAGUEY N° Ext.36 Col.LA MEZCALERA CP.49300,SAYULA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 49300
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA8501018C8
Domicilio: C.ESCOBEDO N° EXT.52 COL.CENTRO CP.49300,SAYULA,JALISCO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 4164BEDA-6193-4D53-BCF5-19B8C97077D1
Número de comprobante: 80
Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Fecha comprobante: 2018-08-06T10:20:40
Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-06T10:21:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
24	HRS	SERVICIO DE CAMION VOLTEO DE 7 MT3 UH 15 029 9,10,11,12 DE JULIO 2018	180.00	4,320.00

Subtotal	4,320.00
IVA (16) %	691.20
Total	**5,011.20**

CINCO MIL ONCE PESOS 20/100 M.N.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000407207765

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4164BEDA-6193-4D53-BCF5-19B8C97077D1|2018-08-06T10:21:45|TSP080724QW6|AmmYwCofQ7bBi2z/7Sy16Lcnjtl6tyF08H3p6RV7awuDV9uNEymDLy9lj+Fmd6l/XHqDlMNRhRWucpv0otrqIJlHrfbVE9LQblpjeCSlpkFVCsu4EZMnfRsyPyZ4tOTU0k23XTVsvKNGDouKOs16Tzg0K+NAwYb7VzVwztANAI2B2oWTultlFd63cFf+6gq3eF0+F3wR+/Lov3PEQEobzBX7lqY0/3zzShRYw6Jp7ScW2yKTTj4Pr10VLE35YqK2dsfhpq+ZRpGaGvivLrEmQXZ4NNDPp/0ralzgY9bdrp12DZ/Ksrw3pMmc7uVJJgr+kDlz7NbGAK7cLRWGOzb/g==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

AmmYwCofQ7bBi2z/7Sy16Lcnjtl6tyF08H3p6RV7awuDV9uNEymDLy9lj+Fmd6l/XHqDlMNRhRWucpv0otrqIJlHrfbVE9LQblpjeCSlpkFVCsu4EZMnfRsyPyZ4tOTU0k23XTVsvKNGDouKOs16Tzg0K+NAwYb7VzVwztANAI2B2oWTultlFd63cFf+6gq3eF0+F3wR+/Lov3PEQEobzBX7lqY0/3zzShRYw6Jp7ScW2yKTTj4Pr10VLE35YqK2dsfhpq+ZRpGaGvivLrEmQXZ4NNDPp/0ralzgY9bdrp12DZ/Ksrw3pMmc7uVJJgr+kDlz7NbGAK7cLRWGOzb/g==

Sello digital del SAT:

i18+mMW5ASuHasNHz1U6XkYeQQbSis0GY6Sa6ulHBlJxYWmel6Q+qHL1sS9sMlkUmMl6BxwbJUpV9JsO+bhFLiIAFpcblZi27EcDILG+slYtRMeHIdJlwX6ilhNbNbPZy0T2mJvUoisps9UvCiKzzrs0ivpDJsrNSbhRYV0DZFjxR7c2MPUDHIh/RDleNOiD5Lxsk+6MbEWCcVNh0nKFGINQfEfVRuBnsfDEZOZmCbNSQBBY6Rc2coWxUOUsstRADQ68MM1aYM/OsQDPXkNXo+/QkZMRKse2UhrEGFaUiVQFFlrMgGlKzlx0caDdLNT0bFoMoTgFNOEZFxngw==

003469

00000383

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 09/07/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 4pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m³ JH15029.

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de tierra sacando tierra producto de la excavacion de cajon.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:



PROVEEDOR: Ana Isabes Macias Macias

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3, JH15029
Fecha: 09 DE JULIO DE 2018

003470

ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

SAYULA
GOBIERNO CON PROYECTO

FECHA: 10 / 07 / 2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 3pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m3 JH 15029.

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de base a la calle Porfirio Dias.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Gral. Manuel Avila Camacho — Porfirio Diaz — Independencia

CROQUIS:

PROVEEDOR: Ana Isabel Naras Naras.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VA JO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3, JH15029
Fecha: 10 DE JULIO DE 2018

003471

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

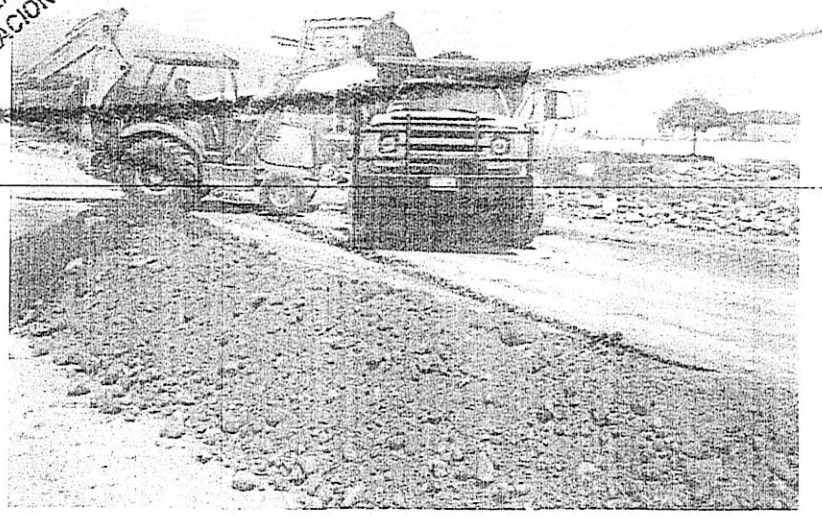

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

SAYULA
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 11/07/2018

HORAS O VIAJES: 8:00 a.m. a 4 pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m3, JH15029

OBRA: (11)

Porfirio Diaz.

MANTENIMIENTO: ( )

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de tierra producto de la excavacion de calon tierra de la calle para despues meter base.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:



PROVEEDOR:

Ana Isabel Mañus Macias.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3, JH15029
Fecha: 11 DE JULIO DE 2018

ESTE DOC. FORMA PARTE DE CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003472

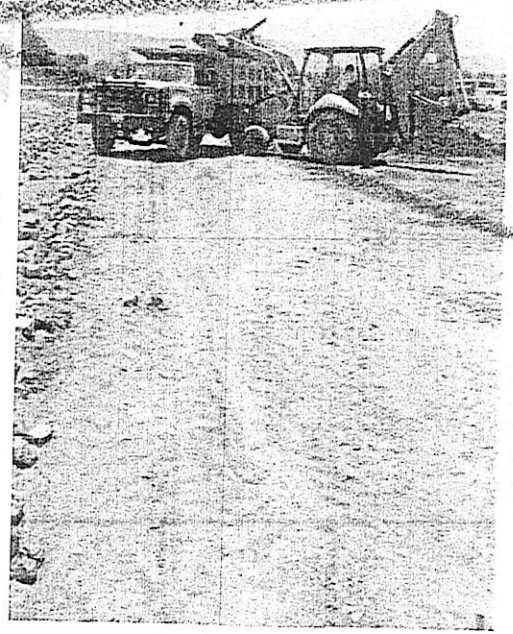

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

SAYULA
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 12, 07, 2018

HORAS O VIAJES: 9:00am a 2pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:
Renta de Camion 7m3, JH15029.

OBRA: (RA)

Porfirio Diaz

MANTENIMIENTO: ( )

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de base del tianguis
a la calle Porfirio Diaz.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

CROQUIS:

PROVEEDOR:
Ana Isabel Macias Macias

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VA JO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Obra: CONSTUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE CAMION DE 7M3, JH15029
Fecha: 12 DE JULIO DE 2018

0003473

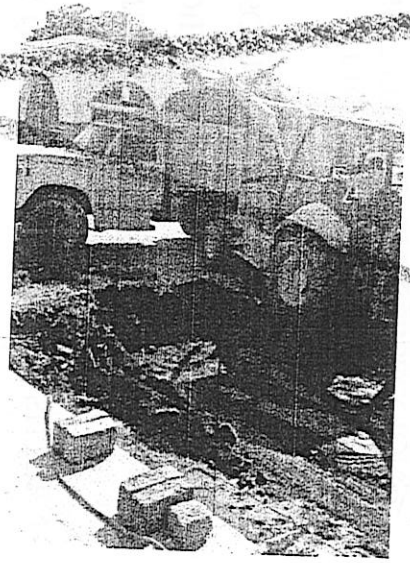

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

COPIA DEL CHEQUE

25435346

Páguese por este cheque a la orden de: MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO

Fecha 9 de agosto de 2018

$ 6,681.60

CON LETRA (SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

9371:513200170100111654020:00000377

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
PROYECTOS REGIONALES 2	111654020	CH 37

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

003475

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB... SAYULA, JAL. ... DE LA ADMINISTRACION 2015-2018

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					00002369

Impresos JEC® P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26971

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO La cantidad de $ 6,681.60

(SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR LA RTENTA DE CAMION DE 7M3 UTILIZADO EN LA OBRA; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ (FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL).

003476

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SE ANEXA COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

17 AGOS 18

Jal., a _____ de _____ de 20

ING. JORGE [illegible] AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIA [illegible] RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

00000389

CORTEZ ANGUIANO MARTHA REGINA
COAM800731B56
(621) Incorporación Fiscal
PROLONGACION INDEPENDENCIA No. 284 A
Col. Sayula Centro. C.P. 49300
Sayula. Sayula, Jalisco, MEX.MEX
Referencia: VINS421210
3121161093
regina_8007@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 195
Versión: 3.3
Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (49300)
No. Certificado: 00001000000406844140

Fecha de emisión: 2018-08-06T12:10:15
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (02) Cheque nominativo
Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: $ 6,681.60

Receptor

(07) MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
MSA8501018C8
Domicilio: ESCOBEDO No. 52
Col. CENTRO. C.P. 49300.
SAYULA. SAYULA, Jalisco, MEX.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
RENTA DE CAMION DE 7 M3 JE 63531, 4, 5, 6, 10 12 DE JULIO	32	$ 180.00	$ 5,760.00

Clave de producto o servicio: 01010101 Clave de unidad: E48

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	$ 5,760.00	$ 921.60

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	$ 921.60

Importe con letra:
SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 MXN

Subtotal	$ 5,760.00
Total de impuestos trasladados	$ 921.60
Total	$ 6,681.60

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-08-06T12:10:19 UUID: 03AB1EEB-51AE-46C1-9FC5-7D55BDC26D9B

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

h6SK7Hli4S+cTVowc9dvZ2CjjX4NrwZRekBLvyBXFpJs4anrSYs2AFJ9gJnk1xLjXABvDHCBc5jQcj93e1sm6VvNfTWxvvYJxTTg48/ho3cgyjFMS1km4tXmAly40Jqb2I9Qa9nu
HuooJb6okkkch9nBkTWJbmalQtY7/jbpELjcMJFfTSTlcFOMm/TXDkaNAJpfqwfHn75erelle8lauAF5heKE9vDyuVRhR3KViJeor0nU0SUffHchRjk+hbP6cd/3O/iXYC0ZRmCda
SjZYpRYVXsdXlUzbma22GBSlDbjZCRE0LBU4lhAOJ9ID7GxaJDy/a6alekIHw9WTF0H8A==

Sello digital del SAT:

t0LcOekEa6VBMAp9BqiW1JlQ26PWMYeb89dR0QHbQvyWDBFFz8Tr8hUsmRs62EWKBkIB8TnO09cHsOsID9wMZVi3W+pbzy+Rdt7Y+v7M4Jr6M8TPCuMYbB0OdJjjdnK
Ga2FmKUrjSLCOi4z6H9pCE/KtGIDi/IXrtG9JNiOR/593Fy7tLK5rDWPJKrqxibZchCR2Wgs50/nY0BEViNQt6RvyUeS4IM80WyP3Hycxwl3ovuebi7jJg8KXWJMsDKhq7IcSYP
gFb3AFSkD25ke456rEckdyC8a8wwpCWGhmE0DnR7vAvj+/N/40j/udz0SGoydrPlmlDRyHOPJeKTJBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|03AB1EEB-51AE-46C1-9FC5-7D55BDC26D9B|2018-08-
06T12:10:19|FCG840618N51|h6SK7Hli4S+cTVowc9dvZ2CjjX4NrwZRekBLvyBXFpJs4anrSYs2AFJ9gJnk1xLjXABvDHCBc5jQcj93e1sm6VvNfTWxvvYJxTTg48/ho3cgyjFM
S1km4tXmAly40Jqb2I9Qa9nuHuooJb6okkkch9nBkTWJbmalQtY7/jbpELjcMJFfTSTlcFOMm/TXDkaNAJpfqwfHn75erelle8lauAF5heKE9vDyuVRhR3KViJeor0nU0SUffHchR
jk+hbP6cd/3O/iXYC0ZRmCdaSjZYpRYVXsdXlUzbma22GBSlDbjZCRE0LBU4lhAOJ9ID7GxaJDy/a6alekIHw9WTF0H8A==|00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003477

00000370

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 04/07/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 3pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion. 7m3, JL63581

OBRA: (X) | MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de tierra producto de la excavacion del cajon para poner la base

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Gral. Manuel Avila Camacho → Porfirio Diaz → Independencia

CROQUIS:

PROVEEDOR: Martha Regina Cortes Anguiano

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE CAMION 7M3, JE63531
Fecha: 04 DE JULIO DE 2017

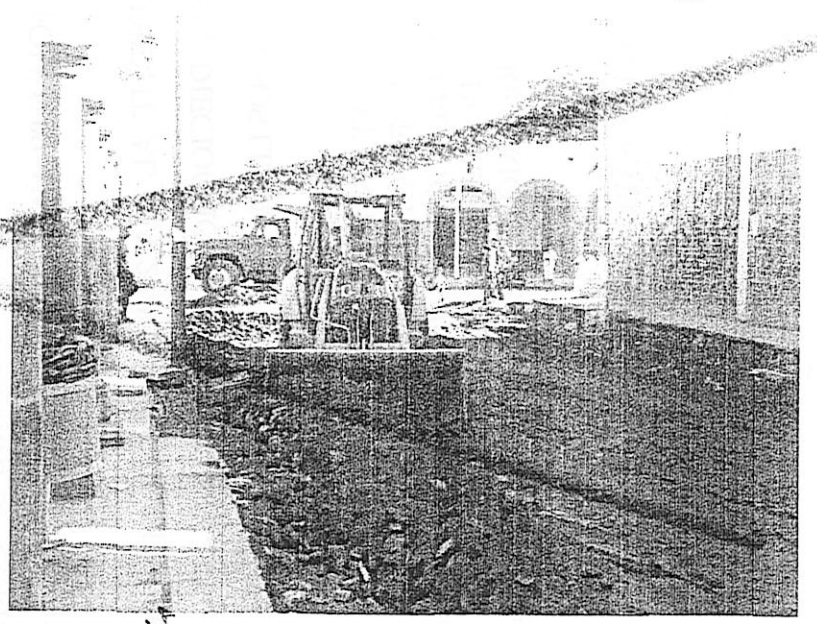

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 05/07/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 3pm 7hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m³, JL63531

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Retiro de tierra de la calle Porfirio Diaz, la tierra es producto de la excavacion para el colon.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Gral. Manuel Avila Camacho — Porfirio Diaz. — Independencia

CROQUIS:

PROVEEDOR: Martha Regina Cortes Anguiano

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE CAMION 7M3, JE63531
Fecha: 05 DE JULIO DE 2017

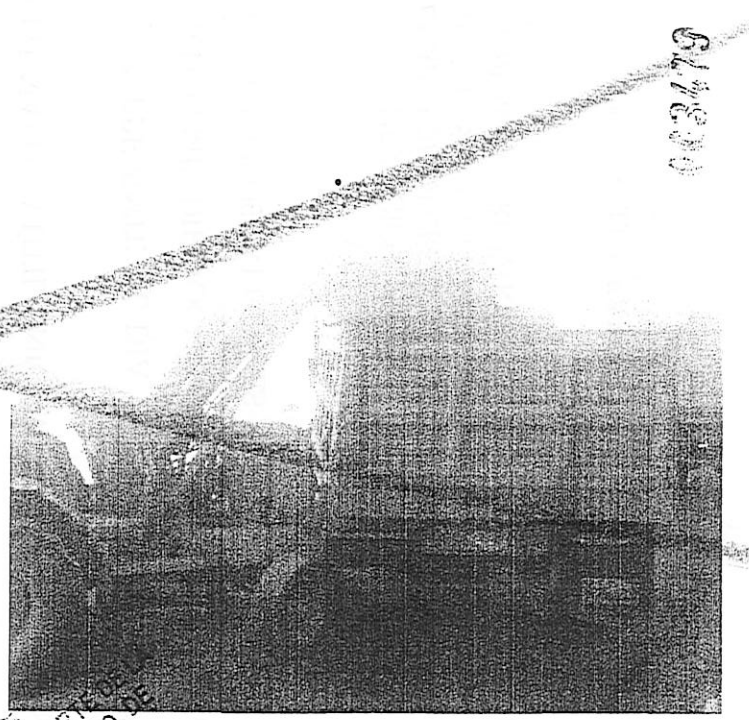

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 06/07/2018

HORAS O VIAJES: 9:00am a 6pm 9hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m3 JE63531

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de tierra de la calle Porfirio Diaz, la tierra es producto de la excavacion para el cajon.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:

Gral. Manuel Avila Camacho

Porfirio Diaz.

Independencia

CROQUIS:

PROVEEDOR: Martha Regina Cortes Anguiano

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VA JO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE CAMION 7M3, JE63531
Fecha: 06 DE JULIO DE 2017

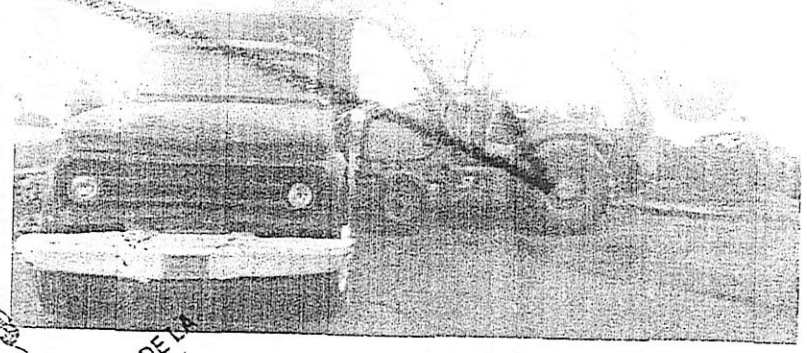

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

SAYULA
GOBIERNO CON PRINCIPIOS

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 10, 07, 2017

HORAS O VIAJES: 8:00am a 3pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m³, JL63531

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de base para la calle Porfirio Diaz

UBICACIÓN DEL TRABAJO:



CROQUIS:

PROVEEDOR: Martha Regina Cortes Aguiano

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS V. EJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE CAMION 7M3, JE63531
Fecha: 10 DE JULIO DE 2017

SECRETARIA GENERAL
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

SAYULA

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 12/07/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 4pm 6hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Camion 7m3, JL63531

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Acarreo de base para la calle Porfirio Diaz.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:



CROQUIS:

PROVEEDOR: Martha Regina Cortes Aguirre

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS [illegible]LEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: RENTA DE CAMION 7M3, JE63531
Fecha: 12 DE JULIO DE 2017

0038482

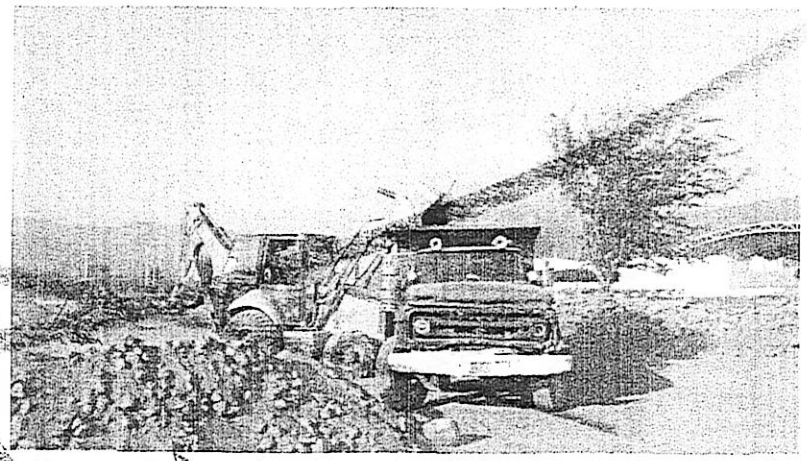

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

COPIA DEL CHEQUE

21729759

Páguese por este cheque a la orden de: VOLTA AGRO INSUMOS, S.A DE C.V.

Fecha 9 de agosto de 2018

$ 3,248.00

CON LETRA (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma(s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

0 2 7 0 1 5 1 3 2 0 0 1 7 0 1 0 0 1 1 1 6 5 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 8

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
PROYECTOS REGIONALES 2	111654020	CH 138

CONCEPTO DEL PAGO: POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADO EN LA OBRA ALIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

0

ORDEN DE PAGO SAY 26133

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

VOLTA AGRO INSUMOS, S.A DE C.V. La cantidad de $ 3,248.00

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA

UTILIZADA EN LA OBRA, PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO

DIAZ DE ESTA CIUDAD (FONDO DE APORTACION DE DESARROLLO REGIONAL 2018).

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003485

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 07 de AGOSTO de 20 18

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIAN GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MPAL.
SAYULA, JAL.

0000337

1

VOLTA AGRO INSUMOS, S.A. DE C.V.

PRIVADA RAMON CORONA No. 38 No. Int A, CENTRO, 49000
Zapotlán el Grande, Jalisco, México
R.F.C.: VAI160805B74

VOLTA agroinsumos

Tipo de Comprobante	I - Ingreso
Lugar de Expedición	49000
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio	236	Forma de Pago	99 Por definir
Fecha	6/8/2018 11:42:39	Método de Pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
		Moneda	MXN Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC	MSA8501018C8
Domicilio	ESCOBEDO No. 52, CENTRO, C.P. 49300, Sayula, Jalisco, México.
Uso CFDI	G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
8.0	HORAS	LH - Hora de trabajo	22101500	Maquinaria para trabajo de desmonte: RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 M DÍAS: 13/ JUL /2018	350.00	0.00	002 - IVA - 448.00	2,800.00

Importe con Letra

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,800.00
IVA	448.00
Total	3,248.00

Serie del Certificado del Emisor	00001000000403725783
Folio Fiscal	8624E966-6228-495A-AF30-2C4A4EB642B0
No. De Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación	Agosto 6 2018 - 11:42:48
Datos de Deposito	

Sello Digital del CFDI

BOG0AFLIqpoly1Pjzt2CnZD0Rzhtdv8/7utNHZ4ReSDdC3l+Sh5G01cPFk50f24k93ixhENkH9QcgPPqrUT887
FYrA77JPK3xNjHB4bY7uMOpSNPZnIKYA/xtUkeUDjv6fgR4lPD39Zm/g0HkNxM/n3uCKTbBcFbvsW8dmoTTa/B
aZ7sVcstpfjXWB64zgK2MO2+3zialWbMOFv+ck+GhJQVgdXiKF74NpudEfljd467ukFLjDe1o0O1wqjV3PYGL
NMLUy5jfW+wgvai24XehihydLVjGWgRcF61eYgpByXnTrzCSiW+AJ3vt2rCk1G8M1a3qsdxY0/BJh9180Cw==

Sello del SAT

pkSiKXppFkRUhkx5SLCzrGL9o7rGihF9Z/mxARbgBK+5Gz0JQgcB0qtVTrLD5xhad08gVn/h5qi1ijFh
8OP0LdxXXxv8jzJKq4pITGwPcpqhvGTLkkee0V8XhQVioKwGqLI8NKo5yvG3zOn2YH89GknjlqYYUvue
fDVmjfm+UL1MTHK9ArUrKBTmy/z+FvmLBOvmO/kBqE3WmZlDWs5GJaQ8123iNbH9jJrMhijY6ibWOSW
TBrVe8d8yDS/4BgMG9Dv+3ac+V5rsIB83fCvkrW4AsYUfe5gNtWo8mJePUcevBK8ea0wpclhw/3cO94D
FsQYT2FVRbr9FMB7xNgR4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8624E966-6228-495A-AF30-2C4A4EB642B0|2018-08-06T11:42:48|MAS0810247C0|BOG0
AFLIqpoly1Pjzt2CnZD0RzhtdvB/7utNHZ4ReSDdC3l+Sh5G01cPFk50f24k93ixhENkH9QcgPPqrUT8
87FYrA77JPK3xNjHB4bY7uMOpSNPZnIKYA/xtUkeUDjv6fgR4lPD39Zm/g0HkNxM/n3uCKTbBcFbvsW8
dmoTTa/Ba27sVcstpfjXWB64zgK2MO2+3zialWbMOFv+ck+GhJQVgdXiKF74NpudEfljd467ukFLjDe
1o0O1wqjV3PYGLNMLUy5jfW+wgvai24XehihydLVjGWgRcF61eYgpByXnTrzCSiW+AJ3vt2rCk1G8M1
a3qsdxY0/BJh9180Cw==|00001000000404486074||

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003486

00369378

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 13/07/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 5pm 8hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Retroexcavadora

OBRA: (X) Porfirio Diaz MANTENIMIENTO: ( )

Sayula.

TRABAJOS REALIZADOS:

Limpieza de la calle y Carga de base para llevar a la calle.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:



CROQUIS:

PROVEEDOR: Guillermo Alfredo López

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VA JO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

003487

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.
Concepto: Renta de retroexcavadora
Fecha: 13 DE JULIO DEL 2017

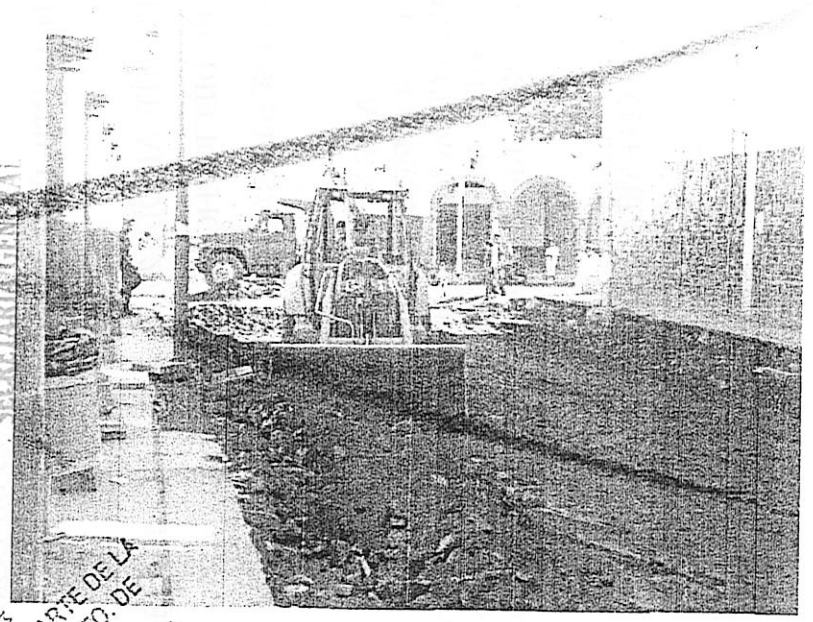

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

BBVA Bancomer

CHEQUE NOMINATIVO

44639217

COPIA DEL CHEQUE

1

Páguese por este cheque a la orden de: VOLTA AGRO INSUMOS, S.A DE C.V.

Fecha 24 de agosto de 2018

$ 8,526.00

CON LETRA: (OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

⑆0791⑆513200170⑆00111654020⑈0000046

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REC 2018	111654020	CH 46

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORTERIO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
529	1 - 0360 - 6147	5504	8,526 -		
1112	5101 - 87			8,525 -	
				003533	
		SUMAS IGUALES			

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					0000032

Impresos JTEC® P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

1

ORDEN DE PAGO SAY 26027

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

VOLTA AGRO INSUMOS, S.A. DE C.V. La cantidad de $ 8,526.00

(OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR

21 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA LOS DIAS 1,2,3, DE AGOSTO 2018 PARA LA

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO.

*FONDO DE APORTACION DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SECRETARIA GENERAL

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

003534

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

_____ Jal., a 9 de AGOSTO de 20 18

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

CH.

00000381

VOLTA AGRO INSUMOS, S.A. DE C.V.

PRIVADA RAMON CORONA No. 38 No. Int A, CENTRO, 49000
Zapotlán el Grande, Jalisco, México
R.F.C.: VAI160805B74

VOLTA agroinsumos

1

Tipo de Comprobante	I - Ingreso
Lugar de Expedición	49000
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales

Factura			
Folio	241	**Forma de Pago**	99 Por definir
Fecha	8/8/2018 14:37:24	**Método de Pago**	PPD Pago en parcialidades o diferido
		Moneda	MXN Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		
RFC	MSA8501018C8	**Uso CFDI**	G03 Gastos en general
Domicilio	ESCOBEDO No. 52, CENTRO, C.P. 49300, Sayula, Jalisco, México		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
21.0	HORAS	LH - Hora de trabajo	22101500	Maquinaria para trabajo de desmonte RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580M DÍAS: 01, 02 Y 03/ AGOSTO 2018	350.00	0.00	002 - IVA - 1,176.00	7,350.00

Importe con Letra

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	7,350.00
IVA	1,176.00
Total	8,526.00

Serie del Certificado del Emisor	00001000000403725783
Folio Fiscal	FEAE4203-F5E8-4954-BCDD-2D4597DFFFDE
No. De Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación	Agosto 8 2018 - 14:37:28
Datos de Deposito	

Sello Digital del CFDI

PZ8SDr9TDgj6w5xa3tUUzmKFtvB02x0IhIcTYO+HEQl2TXkbpcV2Msf6YzAFJqvMy7sA03ErjXcrPTMuioieDH
qc5Qwmd/6nQT5Lnh4FkHGUpEoe/fLqJhYryJ9nqi4S5lmhk57d4DMojftTFt0yIlZyxaYVGmNZoGsymkqaR0jP
O+uw967elyeVv8pFcy1OFagTQLh8GMCwhHaTyauhS/bi59pNAvaA3WIzwx9NBTsN0jlUBjBtEfD9XyOTTpbL+A
TSAnAT27N6SRWHLyJ1lqhcfo65JIep2OELUx8jg2nW6WlNCp4tYJUnu6nofkFoFnJfTiz7fG8JABUfF5KO3g==

Sello del SAT

K1VJi/gUzeWaE1uIVX71vMzICL/nh76y3S7ydoShic+vJEeHwh3IXqrBFLEz5UeXBOeB3VebNjvMktY8
PDjn7j0TJqa0q2/shtIxiHgfGxRK5ohqoLm6MIKxcF8KnZE915JrT9/iqg3AUXsrMgABg1NTX3dLf49Y
/kBppxDMK5OKJRSRUnPg5JlE3esZD2huq/GIZE00m9g6SZ/ndI13tpoYFRuvMFnfMzi4/vt2onV8qPk
eadQekkBtyeMBzz75DV+pPbM7Ota9uq1Sp0rprY/9+P1+7pl8kQge4zy6jYyzYxxJyA9pq5Teor4IKPm
5pKYtB2Yk1CQYP8uKJ57IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FEAE4203-F5E8-4954-BCDD-2D4597DFFFDE|2018-08-08T14:37:28|MAS0810247C0|PZ8S
Dr9TDgj6w5xa3tUUzmKFtvB02x0IhIcTYO+HEQl2TXkbpcV2Msf6YzAFJqvMy7sA03ErjXcrPTMuioie
DHqc5Qwmd/6nQT5Lnh4FkHGUpEoe/fLqJhYryJ9nqi4S5lmhk57d4DMojftTFt0yIlZyxaYVGmNZoGsy
mkqaR0jPO+uw967elyeVv8pFcy1OFagTQLh8GMCwhHaTyauh5/bi59pNAvaA3WIzwx9NBTsN0jlUBjBt
EfD9XyOTTpbL+ATSAnAT27N6SRWHLyj1lqhcfo65JIep2OELUx8jg2nW6WlNCp4tYJUnu6nofkFoFnJf
Tiz7fG8JABUfF5KO3g==|00001000000404486074||

003535

0000938

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 01 / 08 / 2018

HORAS O VIAJES: 8:00 am 5pm 7hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Retroexcavadora

OBRA: (X) MANTENIMIENTO: ( )

Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Acomodando base y limpieza de la calle.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:



CROQUIS:

PROVEEDOR: Guillermo Alfredo López

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

003536

Obra: construcción de red de agua potable, red de drenaje, pavimento en la calle Porfirio días.
Concepto: Renta de retroexcavadora
Fecha: 01 de agosto del 2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

FECHA: 02 / 08 / 2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 5pm 7hrs

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:

Renta de Retroexcavadora.

OBRA: (M)	MANTENIMIENTO: ( )
Porfirio Diaz.	

TRABAJOS REALIZADOS:

Acomodando base y limpiando calle.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:



CROQUIS:

PROVEEDOR: Guillermo Alfredo Lopez.

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VALDIVIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

003537

Obra: construcción de red de agua potable, red de drenaje, pavimento en la calle Porfirio días.
Concepto: Renta de retroexcavadora
Fecha: 02 de agosto del 2018

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

2015 - 2018

BITACORA DE MAQUINARIA

SAYULA
GOBIERNO CON RESULTADOS

FECHA: 03/08/2018

HORAS O VIAJES: 8:00am a 5pm 7hrs.

DESCRIPCION DE MAQUINARIA:
Renta de Retroexcavadora -

OBRA: (x) MANTENIMIENTO: ( )
Porfirio Diaz.

TRABAJOS REALIZADOS:

Acomodando base para la terminacion de ella limpiando y quitando el sobrante de la calle.

UBICACIÓN DEL TRABAJO:



CROQUIS:

PROVEEDOR: Guillermo Alfredo Lopez

SUPERVISOR O RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. ALONSO SERRATOS VA[illegible]JO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

033538

Obra: construcción de red de agua potable, red de drenaje, pavimento en la calle Porfirio días.
Concepto: Renta de retroexcavadora
Fecha: 03 de agosto del 2018

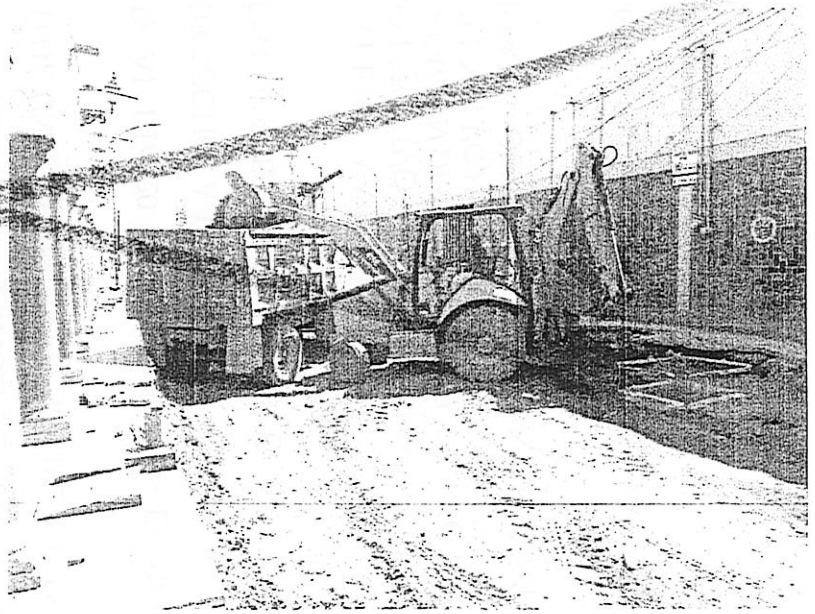

BBVA Bancomer

29837371

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Fecha 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

$ 22,800.00

(VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CON LETRAS

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

⑈58⑈ 513200170⑈00111654020⑈0000049

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO DE PROYECTOS REG.	11165 4020	49

CONCEPTO DEL PAGO

FACTURA E 3965 PAGO POR LA RENTA DE BAILARINA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Yesenia Aguilar.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
8270	0-0300-6142	5504	22,800.-		
1112	-01-	87		22,800.-	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

Impresos JEC P-1013

0000033

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 20985

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ La cantidad de $ **22,800.00**

(VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PAGO POR

por el siguiente concepto

60 DIAS DE RENTA DE BAILARINA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO 2018 PARA LA OBRA:

PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

Yesenia Aguilar.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

_____ Jal., a ____ de 7 SEPTIEMBRE de 20 18

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

CH.

00000337

Factura E 3965

FERRE-MATERIALES GANTE

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

RFC: AUBL820329LK1 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000406868638

Folio Fiscal: 57305b2f-710a-498b-9ac7-22bcdae50eb4

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE	EXPEDIDO EN
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CP:49300
RFC: MSA8501018C8 Uso CFDi: G03 - Gastos en general	Fecha y hora de emisión: 2018-08-14T19:01:00

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	NA - NO APLICA	72141700 - 60 DIAS DE RENTA DE BAILARINA DE 01 DE JUNIO AL 30 JULIO	19,655.17	002 - IVA: 3144.83	19,655.17

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Condiciones de Pago : PAVIMENTO PORFIRIO DIAZ

SubTotal $	19,655.17
+IVA (16%) $	3,144.83
=TOTAL $	22,800.00

CANTIDAD CON LETRA : VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 02 - Cheque nominativo

FECHA TIMBRADO : 2018-08-14T19:02:29

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

Oz90LAKKkWEHsUnbOlb/Jdfu4TMpOi6rVsr3bgSdd8EaaJFXK4JJjzox5HPFZllQOgNcnUghoTPC8W1iEPvxi3kx92PyQkZdnA6MYXkwfEu7na+HC1xh+2naraQMiKezC/punGcoSkZTZdjkU4ErCvVtJ7rqkBStYlO0gNtqEC4s1tJfQ/OOMmXRLVREoN0NQBc5YhhOsoWYR0vnWL1rCEYcQ5j+5DFEB7ZaswFCVCWDJZklwZTQ2YqlvaJu++aygPaUPKgCrPW84vEbu5qI+jp9Jf28YXUKmPCQD2bRwl/CNTC64RmIh1x/G6NnOwdTGwUvrm2TxWM01WZ2T4D6CQ==

Sello Digital del SAT

Z/lAuf5FQAn6syG+ixVR9mWyj2bf+Z7BD6kUu6SoRwzmVsNbVvLdrf8uCrXyXfJiG1Rda4iPKM9EJAgJ0vK4UrGvZRXGwLngZV6qVNVOLxH8savypZwrXhLY25+1IbHO9/czEjPIXk3ssaq2NrkjSXKOaDVqwatiL8bAwXUb8zOpLxtdFSp6P+WwvZFEZvp9oNmu3rwRVGCQVLZTJlMqjjvbjFm4vEn6RtC3cHMU01qwoqYG9X4BzRznYP3sKchPRLPLvXOyGxPTSEiy2Q0bdr2ICKP1GXc8FjCnRq6lX/zZLBd3FC5IDYchgwyMG/7Aa39Ib5k1xX1DK38zYBmQSg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|57305b2f-710a-498b-9ac7-22bcdae50eb4|2018-08-14T19:02:29|LSO1306189R5|Oz90LAKKkWEHsUnbOlb/Jdfu4TMpOi6rVsr3bgSdd8EaaJFXK4JJjzox5HPFZllQOgNcnUghoTPC8W1iEPvxi3kx92PyQkZdnA6MYXkwfEu7na+HC1xh+2naraQMiKezC/punGcoSkZTZdjkU4ErCvVtJ7rqkBStYlO0gNtqEC4s1tJfQ/OOMmXRLVREoN0NQBc5YhhOsoWYR0vnWL1rCEYcQ5j+5DFEB7ZaswFCVCWDJZklwZTQ2YqlvaJu++aygPaUPKgCrPW84vEbu5qI+jp9Jf28YXUKmPCQD2bRwl/CNTC64RmIh1x/G6NnOwdTGwUvrm2TxWM01WZ2T4D6CQ==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ANEXO DE EGRESOS **E 5**

MATERIALES E INSUMOS (MATERIALES DIRECTOS)

FOLIO	PROVEEDOR	RFC	N° CHEQUE	FECHA CHEQUE	JUSTIFICACION	IMPORTE
FE49947	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	9	04-may-18	DIVERSOS MATERIALES	46,273.96
FE51958	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	18	18-jun-18	DIVERSOS MATERIALES	36,229.20
FE53201	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	23	02-jul-18	DIVERSOS MATERIALES	1,050.48
219	DOVEGA SERVICE CONCRETOS SA	DSC170824UH0	40	23-ago-18	ANTICIPO DE PAVIMENTACION	257,583.34
223	DOVEGA SERVICE CONCRETOS SA	DSC170824UH0	41	23-ago-18	PRIMERA ESTIMACION	336,693.47
227	DOVEGA SERVICE CONCRETOS SA	DSC170824UH0	47	03-sep-18	SEGUNDA ESTIMACION	260,633.96
FE58642	RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	48	11-sep-18	BROCAL POZO DE VISITA PLASTICO	2,727.81
0233A566	ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	50	11-sep-18	DIVERSOS MATERIALES	34,800.00
E3964	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	51	11-sep-18	DIVERSOS MATERIALES	81,482.02
A105	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMA	AAGA9007197F7	45	23-ago-18	TEPETATE Y GRAVARENA	32,596.01

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

COPIA DEL CHEQUE

63398463

11 DE MAYO DEL 2018

Páguese por este cheque a la orden de: Fecha

RAMIRO OCHOA CUADRA $ 46,273.96

(CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.)

CON LETRA

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

9618 513 200 170 00 11 16 54 0 20 0000009

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY.REG.2018	1116540 20	9

CONCEPTO: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: PAVIMENTO Y SERV. DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MPIO.

FACTURA FE49947

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Adolfo Ma[illegible]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 24843

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

RAMIRO OCHOA CUADRA 46,273.96

La cantidad de $ _____

(CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.)

PAGO POR

por el siguiente concepto

LA COMPRA DE 108 MTS DE PVC HIDRAHULICO TUBO 12" ALCANTARILLADO , 138 MTS DE PVC HIDRAHULICO TUBO 6" ALCANTARILLADO ,23 PVC SILLETAS 315 X160 MM 12 X6 , 5 PEGAMENTO PVC WELD ON 7/1 1 LT ,5 PVC LIMPIADOR PVC PRESTO 500 ML PARA LA OBRA: PAVIMENTO Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO.

* FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA 25 DEL AYTO. DE ADMINISTRACION 2015-2018 SAYULA JAL. OCV

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA JAL.

_____ Jal., a 11 de MAYO de 2018

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

LC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

CH.

0000391

FERRETERIA COLON

RAMIRO OCHOA CUADRA R.F.C. OOCR7008315H5
COLON 453-B COL. CENTRO C.P. 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Tels. 01(341) 41-2-69-99 Fax: 01(341) 41-2-36-07 Nextel 04533-307-72657 ID 62*14*7235 E-mail: colon453@yahoo.com.mx
Lugar de Exp. : CP: 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
FE49947
Fecha de Timbrado
2018-05-02T12:47:22

Folio Fiscal
DC7EAF8B-95CB-4F2E-8349-35AC798BF2E0

Datos del Cliente

Nombre : MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
Domicilio : ESCOBEDO 52
Colonia: , C.P. 49330, SAYULA, , JALISCO, MEXICO
Rfc : MSA8501018C8 Tels:
Clave : 0287 Agente: 9 Lista de Precios: Precio 3

Fecha de Emisión
2018-05-02T12:47:19
Vencimiento
17/05/2018
Condiciones
QUINCE DIAS

Observaciones:
Folio Referencia:
Horario Entrega:

Cant	Código	UdeM	Clave SAT	Descripción	%Des	IVA	Precio Unit.	Importe
108	9836	MT MTR	40171500	PVC HIDRAULICO TUBO 12 ALCANTARILLADO 315		16	$241.46	$26,078.09
138	9767	MT MTR	40171500	PVC HIDRAULICO TUBO 6" ALCANTARILLADO 160		16	$59.59	$8,222.90
23	2632	PZA H87	27112729	PVC S.I.SILLETA 315 X 160 MM 12X6		16	$136.47	$3,138.90
23	1454	PZA H87	40172808	PVC CODOS 45o 6 ROJO S-25		16	$41.74	$960.05
5	G297	PZA H87	31201600	PEGAMENTO PVC WELD ON 711 1 LTS.		16	$242.92	$1,214.61
5	C073	PZA H87	40171500	PVC LIMPIADOR PVC PRESTO 500 ML		16	$55.36	$276.79

Total De Peso: (0.00 Kgs)

Importe con Letra
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.

Método De Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma De Pago : 99 Por definir
Uso de CFDI : G03 Gastos en general
Tipo de Relación de CFDI :
UUID :

Totales

Subt. 16% :	$39,891.34
Subt. 0% :	
SubNeto :	$39,891.34
IVA :	$6,382.62
Total :	$46,273.96

Sello Digital CFDI EB6g2XITtNMG0Nhnn+bUrlo+C48vze/AXP9YdQtvh8FsBmWf19j3WfVZIMTtPQljUPkFtFepFdMjAfS2mSEFq5fgNVQiQAdJLcv532wl1tHgXEmgtfbhDt7YtDN2szcWMLQZhPMYqhO/N7DoNXUHp4f3ne7tQqZggocM6wdQBg=

Sello Digital SAT ZmUzAuDk4SZRFDzIb9ZoFulsCapkLy1sJW4/YptsPZcgEtIbja58Psjde5fadOndlo8/VWkQqECf9FIqrz0onRF86Oq2ojCZ8BDOMotE5yHzHlWkHeXd2jwss2csy+TyM4UWTU2nMDkxKSaGibthT8H2BW+xAddc+LIFkeFhwG/s3qax+6R66Ne9BgpB+DM69Da+PAxTK3jdIZ9EZ8Rq4CINSuQZgZTQS2q75HaOOmxosRXEBvsKIK1EmD/TdFESF+HVcxRioPpg0IMgoID8DguoKiih/+h47kTJRrkypqa2laapLzUU2cEdbdSDI6WNb+MM

Cadena Original de Certificación Digital del SAT

||1.1|DC7EAF8B-95CB-4F2E-8349-35AC798BF2E0|2018-05-02T12:47:22|EB6g2XITtNMG0Nhnn+bUrlo+C48vze/AXP9YdQtvh8RsBmWf19j3WfVZIMTtPQljUPkFtFepFdMjAfS2mSEFq5fgNVQiQAdJLcv532wl1tHgXEmgtfbhDt7YtDN2szcWMLQZhPMYqhO/N7DoNXUHp4f3ne7tQqZggocM6wdQBg=|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Certificado CFDI 00001000000304620226 No. Certificado SAT 00001000000404594081

Debo y Pagaré a la orden de RAMIRO OCHOA CUADRA en esta ciudad de JALISCO el día 17/05/2018 la cantidad de $ 46273.96 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.), valor de mercancia recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancia causando un interes moratorio del 9 % mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y artículos correlativos.

FAVOR DE DEPOSITAR EN:

BANORTE CTA: 0523007173
CLABE: 072342005230071736
BANCOMER CTA: 0164120809
CLABE: 012342001641208097

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

Firma :

CANCELADO

00000392

BBVA Bancomer

CHEQUE POLIZA

91731546

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: RAMIRO OCHOA CUADRA

Fecha 18 de junio de 2018

$ 36,229.20

(TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

?68 3: 513 200 170: 00 111 654 020 ": 000000 18

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 18

CONCEPTO DEL PAGO: 1958 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Víctor Ochoa

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 25623

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

RAMIRO OCHOA CUADRA La cantidad de $ 36,229.20

(TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD. (FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALES 2018).

001968

SECRETARIA GENERAL

O. Ese Chavez

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA JAL.

SAYULA Jal., a 15 de JUNIO de 20 18

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00000394

FERRETERIA COLON

RAMIRO OCHOA CUADRA R.F.C. OOCR7008315H5
COLON 453-B COL. CENTRO C.P. 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Tels. 01(341) 41-2-69-99 Fax: 01(341) 41-2-36-07 Nextel 04533-307-72657 ID 62*147235 E-mail: colon453@yahoo.com.mx
Lugar de Exp. : CP: 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
FE51958
Fecha de Timbrado
2018-05-26T13:17:41

Folio Fiscal
D7C050C9-71B5-4948-9E5B-C37C4AA45FCD

Datos del Cliente

Nombre : MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
Domicilio : ESCOBEDO 52
Colonia: , C.P. 49330, SAYULA, , JALISCO, MEXICO
Rfc : MSA8501018C8 **Tels:**
Clave : 0287 **Agente:** 9 **Lista de Precios:** Precio 3

Fecha de Emisión
2018-05-26T13:17:37
Vencimiento
10/06/2018
Condiciones
QUINCE DIAS

Observaciones:
Folio Referencia:
Horario Entrega:

Cant	Código	UdeM	Clave SAT	Descripción	%Des	IVA	Precio Unit.	Importe
120	9103	MT MTR	40171500	PVC HIDRAULICO TUBO 3 RD26		16	$41.59	$4,990.34
20	6577	PZA H87	40171500	PVC ABRASADERAS P/TOMA AGUA 3"		16	$61.76	$1,235.17
120	2352	MT MTR	40142020	MANGUERA STRUPAK 1/2 ALTA PRESION C/150		16	$10.00	$1,200.00
20	2348	PZA H87	40141623	LLAVES INSERCION 1/2 POLIDUCTO FIG.80B		16	$105.36	$2,107.24
20	D012	PZA H87	40141720	CODO BRONCE POLIDUCTO RUGO 1/2 96B		16	$44.22	$884.48
20	8007	PZA H87	40183103	TUPLAS TUERCA UNION 1/2		16	$14.35	$287.07
60	7879	PZA H87	40183101	TUPLAS CODO 90o 1/2		16	$4.58	$274.66
30	2242	PZA H87	31201500	CINTA TEFLON TRUPER 1/2 CTF-1/2		16	$2.72	$81.70
48	7876	MT MTR	40183000	TUPLAS TUBO 1/2		16	$14.66	$703.86
6	9513	PZA H87	27111708	LLAVES COMPUERTA Fo.Fo. 3 BRIDADA		16	$1,318.03	$7,908.21
4	D323	PZA H87	31161500	TEE DE Fo. Fo. 3 X 3		16	$732.93	$2,931.72
10	9222	PZA H87	31181701	EMPAQUE PLOMO 3"		16	$43.91	$439.14
15	9823	PZA H87	27121700	EMPAQUE NEOPRENO 3"		16	$25.76	$386.38
3	6348	PZA H87	27121700	JUNTAS GIUBAULT 3" 90 92 95 MM		16	$118.78	$356.35
15	9541	PZA H87	40171500	PVC BRIDA ROSCADA 3" C-40		16	$55.32	$829.79
3	6661	PZA H87	40173608	PVC HIDRAULICO RED BUSHING 3 X 2		16	$21.10	$63.31
100	D323	PZA H87	31161500	TORNILLOS 5/8 X 3 CON TUERCA, RONDANA PLANA		16	$10.43	$1,043.10
6	C654	PZA H87	24122004	TAPA PARA CAJA DE VALVULAS PLASTICO		16	$771.98	$4,631.90
20	D984	PZA H87	40141607	VALVULA ESFERA MUELLER 1/2		16	$38.41	$768.10
40	9105	PZA H87	40183100	TUPLAS NIPLE 1/2 X R/C		16	$2.74	$109.55

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001969

00000395

FERRETERIA COLON

RAMIRO OCHOA CUADRA R.F.C. OOCR7008315H5
COLON 453-B COL. CENTRO C.P. 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Tels. 01(341) 41-2-69-99 Fax: 01(341) 41-2-36-07 Nextel 04533-307-72657 ID 62*14*7235 E-mail: colon453@yahoo.com.mx
Lugar de Exp. : CP: 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
FE51958
Fecha de Timbrado
2018-05-26T13:17:41

Folio Fiscal
D7C050C9-71B5-4948-9E5B-C37C4AA45FCD

Datos del Cliente

Nombre : MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
Domicilio : ESCOBEDO 52
Colonia: , C.P. 49330, SAYULA, , JALISCO, MEXICO
Rfc : MSA8501018C8 Tels:
Clave : 0287 Agente: 9 Lista de Precios: Precio 3

Fecha de Emisión
2018-05-26T13:17:37
Vencimiento
10/06/2018
Condiciones
QUINCE DIAS

Folio Referencia:
Horario Entrega:

Observaciones:

Cant	Código	UdeM	Clave SAT	Descripción	%Des	IVA	Precio Unit.	Importe

Total De Peso: (0.00 Kgs)

Importe con Letra
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.

Método De Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma De Pago : 99 Por definir
Uso de CFDI : G03 Gastos en general
Tipo de Relación de CFDI :
UUID :

Moneda: MXN Peso Mexicano

Totales	
Subt. 16% :	$31,232.07
Subt. 0% :	
SubNeto :	$31,232.07
IVA :	$4,997.13
Total :	$36,229.20

Sello Digital CFDI
bLXgVe4LNuzXnuINNdz2XC+WU/Ri5FUzCUOf+u3dTAGtg0xPgNfnt8sIjtWS5/a6aPYxXCPsj7ELIIoMARTrY6YmgAHmeqIwNYdi0INB2LqbutJw/UlAOMypM7IpII8n6k1Uz2WYDtQdb1SO9adMjywkEDgXC/r1upi6BJSAyw=

Sello Digital SAT
pPK0qwdxdYhzZX+GVacgSpRGTp3b1D+CyU4fXXWin8haP7hKmIwthFiQne+AXTCm6ZOeI...Xaf9qIpz9EjnS/dR5tr/sYcVa/p3/aKdQu5dvCrG2dWAIWLy99Atk0vclyF62PhRfsgKgTDu/6zVYYua/KB4axeP/K...zzF
M0jry70lxyRNkm6zYr8lJxLHJW4IPxHqcEVEjrnnzZIHXLDUPe1OF9O5iPR6FoiYillcDOVpazJ/rglUtCXsdsK3MuEbdZ+NDEZDNfymaNBEpGtZVYk2A5BijgVTfAymNqJpgT39g23crbLRndI8H1Vkfb1aOXXWl94lyoj

Cadena Original de Certificación Digital del SAT

||1.1|D7C050C9-71B5-4948-9E5B-C37C4AA45FCD|2018-05-26T13:17:41|bLXgVe4LNuzXnuINNdz2XC+WU/Ri5FUzCUOf+u3dTAGtg0xPgNfnt8sIjtWS5/a6aPYxXCPsj7ELIIoMARTrY6YmgAHmeqIwNYdi0INB2LqbutJw/UlAOMypM7IpII8n6k1Uz2WYDtQdb1SO9adMjywkEDgXC/r1upi6BJSAyw=|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Certificado CFDI 00001000000304620226 No. Certificado SAT 00001000000404594081

Debo y Pagaré a la orden de RAMIRO OCHOA CUADRA en esta ciudad de JALISCO el dia 10/06/2018 la cantidad de $ 36229.2 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.), valor de mercancia recibida de entera conformidad, el recibo total de la mercancia causando un interes moratorio del 9 % mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de titulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y artículos correlativos.

FAVOR DE DEPOSITAR EN:

BANORTE CTA: 0523007173
CLABE: 072342005230071736
BANCOMER CTA: 0164120809
CLABE: 012342001641208097

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. Firma : _____

ESTE ES EL FORMATO PARA PAGO DE LA CUENTA PREDIAL DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

001970

00000396

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

COPIA DEL CHEQUE

67156692

Páguese por este cheque a la orden de: RAMIRO OCHOA CUADRA

Fecha: 2 de julio de 2018

$ 1,050.48

CON LETRA: (UN MIL CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

0613513200170100111654020100000023

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 23

CONCEPTO DEL PAGO: FACTURA 3201 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO: Adolfo Morales

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

002939

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					0000397

Impresos JEC P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 25894

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

RAMIRO OCHOA CUADRA La cantidad de $ 1,050.48

(MIL CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR LA COMPRA DE JUNTAS GIUBAUTL UTI-- ZADAS EN EN LA OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.(FONDO DE PROYECTO REGIONAL 2018).

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE S.AYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Adolfo Novoa L.

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

SAYULA Jal., a 03 de JULIO de 20 _____

ING. [illegible] AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

002940

0000039

FERRETERIA COLON

RAMIRO OCHOA CUADRA R.F.C. OOCR7008315H5
COLON 453-B COL. CENTRO C.P. 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Tels. 01(341) 41-2-69-99 Fax: 01(341) 41-2-36-07 Nextel 04533-307-72657 ID 62*14*7235 E-mail: colon453@yahoo.com.mx
Lugar de Exp. : CP: 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
FE53201
Fecha de Timbrado
2018-06-11T17:08:06

Folio Fiscal
7C95A2B9-4AEB-4C16-A83C-D08CB1E6D8D3

Datos del Cliente

Nombre : MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
Domicilio : ESCOBEDO 52
Colonia: , C.P. 49330, SAYULA, , JALISCO, MEXICO
Rfc : MSA8501018C8 **Tels:**
Clave : 0287 **Agente:** 9 **Lista de Precios:** Precio 3

Fecha de Emisión
2018-06-11T17:07:57
Vencimiento
26/06/2018
Condiciones
QUINCE DIAS

Observaciones:
Folio Referencia:
Horario Entrega:

Cant	Código	UdeM	Clave SAT	Descripción	%Des	IVA	Precio Unit.	Importe
4	9216	PZA	H87	27121700 JUNTAS GIUIBAUTL 2" 65 62 MM		16	$95.43	$381.72
2	6348	PZA	H87	27121700 JUNTAS GIUBAULT 3" 90 92 95 MM		16	$118.78	$237.57
3	9217	PZA	H87	27121700 JUNTAS GUIBAUTL 2 1/2" 75 85 MM		16	$95.43	$286.29

Total De Peso: (0.00 Kgs)

Importe con Letra
MIL CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.

Método De Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma De Pago : 99 Por definir
Uso de CFDI : G03 Gastos en general
Tipo de Relación de CFDI :
UUID :
Moneda: MXN Peso Mexicano

Totales	
Subt. 16% :	$905.59
Subt. 0% :	
SubNeto :	$905.59
IVA :	$144.89
Total :	$1,050.48

Sello Digital CFDI
Q58wdwu8PZJYfEWSk3lqvhskV5H9Ob9UoZawHr/v9yJ8cUbRdEuQxNM2mumX2ZJPbaORieR4IjtQ1KUXBwp72q9KgP/7mqwzBKZw17ojIYZLZqAXs+IZLeZI9R7gkZztkc70/1jQlqB0/mMwX2wppIOuxDGQfceHOjxmIaN0NYo=

Sello Digital SAT
SFm4Z5ovUhhxOKt2UaNhq5QS3g4Lb0gQEzMLRcJbwCWEcxLe4hPqHDDEzIsFG6WvpCK3UEQFu+dYdpNz9hGVQtHab58QTmCjZk+9Z4o+J6evAkIsY1...SRIbXbpPm52VXNZi66Om8hInwhFuFc9zRaHXjPbTBoQ4Iy8YUIY5Mu+cL2Zd2MHazQpF420p6JbILbESWwH5TZmReW8jR5NHRyT4JR2OswA6qLY...yHHwzeFcsbyO3w4W7LYf625FWLrRJYUfPeG/Kx86qi

Cadena Original de Certificación Digital del SAT

||1.1|7C95A2B9-4AEB-4C16-A83C-D08CB1E6D8D3|2018-06-11T17:08:06|Q58wdwu8PZJYfEWSk3lqvhskV5H9Ob9UoZawHr/v9yJ8cUbRdEuQxNM2mumX2ZJPbaORieR4IjtQ1KUXBwn72q9KgP/7mqwzBKZw17ojIYZLZqAXs+IZLeZI9R7gkZztkc70/1jQlqB0/mMwX2wppIOuxDGQfceHOjxmIaN0NYo=|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Certificado CFDI 00001000000304620226
No. Certificado SAT 00001000000404594081

Debo y Pagaré a la orden de RAMIRO OCHOA CUADRA en esta ciudad de JALISCO el día 26/06/2018 la cantidad de $ 1050.48 (MIL CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.), valor de mercancia recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancia causando un Interés moratorio del 9 % mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y artículos correlativos.

FAVOR DE DEPOSITAR EN:

BANORTE CTA: 0523007173
CLABE: 072342005230071736
BANCOMER CTA: 0164120809
CLABE: 012342001641208097

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

Firma : _____

ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

002941

0000039

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

99845975

COPIA DEL CHEQUE

1

Páguese por este cheque a la orden de: DAVEGA SERVICE CONCRETOS S.A DE C.V.

Fecha 23 de agosto de 2018

$ 257,583.34

CONTRA ENTREGA (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

0 73 11 513 200 170 100 111 654 020 1 000000 4,0

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 40

CONCEPTO DEL PAGO
FACTURAS A 1/9 ANTICIPO POR LA OBRA; PAVIMENTO Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

003495

SUMAS IGUALES

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					00000400

Impresos JEC® P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

1

ORDEN DE PAGO SAY 26981

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

DAVEGA SERVICE CONCRETOS S.A DE C.V. La cantidad de $ 257,583.34

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR EL ANTICIPO DE LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

003496

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA

SAYULA Jal., a 23 de AGOSTO de 20 16

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL SAYULA, JAL.

LIC. JOSE LAMAS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA [illegible] RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

0000401

Folio: 219 Serie: A
Factura realizada por cuenta Admin.

Folio: 219 Serie: A

Fecha de emisión:	2018-08-22 14:30:00
Fecha de certificación:	2018-08-22T14:31:21
Certificado emisor:	00001000000407608456
Certificado SAT:	00001000000403442064
Tipo comprobante:	Ingreso

Davega Service
Concretos

DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV
RFC: DSC170824UH0
Régimen: 601, General de Ley Personas Morales
AV. JOSE MA GONZALEZ HERMOSILLO #202, Col. Ciudad GuzmÃ¡n Centro, C.P. 49000, , ZapotlÃ¡n el Grande, MÃ©xico
Teléfono: 3411328890
Correo: davega.service@hotmail.com

MUNICIPIO DE SAYULA , JALISCO
RFC: MSA8501018C8
Uso CFDI: I01, Construcciones

ESCOBEDO #52 Col. CENTRO C.P.: 49300, Sayula, SAYULA, 15

Folio fiscal: 8B7335D3-B35A-4A2C-8008-A8F77774E6FC
No. de comprobante: 219 Lugar expedición: 49000
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 02-Cheque nominativo

Moneda: MXN Tipo cambio: 1.000000
Condiciones de Pago:

Factura 003497

Cantidad	Código	Clave prod/sv	Clave unidad	Descripción	P/U	Importe
1		72121000	E48	ANTICIPO DE PAVIMENTACIÓN CALLE PORFIRIO DIAZ	222,054.60	222,054.60
					Subtotal	222,054.60
				Traslado IVA	**Tasa 16%**	35,528.74
Doscientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y tres pesos 34/100 M.N.					**TOTAL**	257,583.34

"Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|8B7335D3-B35A-4A2C-8008-A8F77774E6FC|2018-08-22T14:31:21|GQ+6Aci9+IdUvS1zPbHULW3fJ2WxsYj1Ql1z2Okrs32erR+6ciqwQgRRg9hVyo/IXnx8nkuzsJLvdbZdVdCLWIlLZo49o/rqHIJj5lyXnLAqZlrCZbcQBj9yU2HOxtWnjKgfUzGykTPo8ZdT45qDTlgpWmkOcCgXwWexuxWqsUDQ/NHrQ34wbx2MacyigMdaiZnbmmYsO4B0lwSGmlRDFYPxQWHusLmwO92gt23LdsepaZ30XWEsEhL99Dtuft+G4yg==|00001000000403442064|

Sello Digital del Emisor:

GQ+6Aci9+IdUvS1zPbHULW3fJ2WxsYj1Ql1z2Okrs32erR+6ciqwQgRRg9hVyo/IXnx8nkuzsJLvdbZdVdCLWIlLZo49o/rqHIJj5ly483KP43NEDJIlbXoE0jxdP2DA5KBBkU2pZx8J6rynXnLAqZlrCZbcQBj9yU2HOxtWnjKgfUzGykTPo8ZdT45qDTlgpWmkOcCgXwWexuxEB+VuisVUoanalwyqNsDH+ZM8QOFbAzZuNi7x+zJ5WqsUDQ/NHrQ34wbx2MacyigMdaiZnbmmYsO4B0lwSGmlRDFYPxQWHusLmwO92gt23LdsepaZ30XWEsEhL99Dtuft+G4yg==

Sello Digital del SAT:

Ix+TEzzWjvGmdDME9zI94OBU6EwA6BcuMi5PeXEC6ZGvdNktVEQtEAN6Cw5xuUw4OQCo8N8d8S1OoLTfCXlddEr0HFeFkQ5UiQ4cvS7g/nV52r5WEVI3Zr9A8DszN32JfYk0QJqzhI8dE5QxXf27udpbqe+NDjLznHDTyQwJGNDBRMK+jrmpmV1/8dM2XrU7EFtzSWadO4nkNS3IOSwF02i3eXv5Dmn+HX4wVH0RQBT9P/Q0bVkd+oHvrWT2kmMWl6mnL7iTJxqKv0djbfw+Qduq/6QrhDrOg8CGmg88qVDinzvuCjmqFUMeaA1IPcejWNjO/YwqJo53EWsarE8BBppQ==

RFC PAC: IAD121214B34

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00000402

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA **PARTE "EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.",** REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS **ING. JORGE CAMPOS AGUILAR** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, **ABOG. JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES** SÍNDICO MUNICIPAL, **L.C.P. ADRIANA GARCÍA RODRÍGUEZ** TITULAR ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y EL **ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ **"EL AYUNTAMIENTO"** Y POR OTRA PARTE LA SRA. **DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES,** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **"DAVEGA SERVICE CONCRETOS."**, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **DSC170824UH0** Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

D E C L A R A C I O N E S:

I.- "EL AYUNTAMIENTO", DECLARA: 003498

A. ES UN AYUNTAMIENTO LIBRE, BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL, DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EL NUMERAL 73 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y EL DISPOSITIVO LEGAL 2° DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

B. QUE DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ES FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO CELEBRAR CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS TENDIENTES A LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INTERÉS COMÚN, SIEMPRE QUE NO CORRESPONDA SU REALIZACIÓN AL ESTADO.

C. QUE EL C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR, PRESIDENTE MUNICIPAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 1, DEL ARTÍCULO 47, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, TIENE ENTRE SUS OBLIGACIONES LA DE EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE APEGUEN A LA LEY; Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS PARA LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES, PARA LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL 1° PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2015 HASTA EL 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

D. QUE EL C SÍNDICO, ABOG. JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES, CONFORME A LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 52, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, TIENE LA OBLIGACIÓN DE REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE; Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS PARA LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES, PARA LA

0000400

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS PARA LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES, PARA LA INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL DÍA 1° PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2015 HASTA EL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2018, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

E. QUE LA L.C.P. ADRIANA GARCÍA RODRÍGUEZ, ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO OTORGADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO REALIZADA EL DÍA 1° PRIMERO DE OCTUBRE DE 2015.

F. QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL, EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO NUMERO 52, EN SAYULA, JALISCO, C.P. 49300, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

1.2.- EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 1 (fracción VI), 27 (fracción II), 41 Y 42 (fracción III) DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, EL PROYECTO DENOMINADO **"PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ"**, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, PRESUPUESTOS (COTIZACIÓN), ESPECIFICACIONES, Y CALENDARIO DE OBRAS, ASÍ COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, QUEDANDO POR REPRODUCIDO ÍNTEGRAMENTE.

ESTE FOLIO FORMA PARTE DE LA COPIA CERTIFICADA DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

II.- "EL CONTRATISTA", DECLARA:

003499

II.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO, ADEMÁS DE QUE SU OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROFESIONALES ESTÁN RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE LOS OBRAS REQUERIDAS.

II.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

II.3.- QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL SIGUIENTE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **GCR1712231T0**, QUE DICHO REGISTRO ESTÁ VIGENTE Y CORRESPONDE AL **RÉGIMEN GENERAL DE LEY**, ASIMISMO MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADA Y NO TIENE ADEUDOS O MULTAS, DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA.

II.4.- QUE AL MOMENTO DE INTEGRAR EL ANTICIPO POR EL 30% PORCIENTO POR EL CONCEPTO DE ANTICIPO, SE INSPECCIONARÁ DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO POR AMBAS PARTES, "CONTRATISTA" Y "AYUNTAMIENTO" (RESIDENTE DE OBRA), A FIN DE CONSIDERAR

0000404

TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. (CONTEMPLANDO TODOS LOS DETALLES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO Y COTIZACIÓN).

II.5.- QUE SU DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA **CALLE JOSE MA GONZALEZ HERMOSILLO # 202, COLONIA CENTRO, EN CUIDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.**

II.6.- QUE SE OBLIGA A CUMPLIR, CON LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES, PLAZOS, TÉRMINOS, CUALIDADES, CALIDADES, PRESUPUESTOS Y CALENDARIOS DE TRABAJO PROGRAMADOS Y ENUNCIADOS EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DETALLADO EN EL PUNTO 1.2 DEL PRESENTE CONTRATO.

II.7.- "EL AYUNTAMIENTO" (RESIDENTE DE OBRA) SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO UNA BITÁCORA DE OBRA, DONDE SE ASENTARÁ DIARIAMENTE LAS INCIDENCIAS DEL TRABAJO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, PERO LA CUAL SERA SUPERVISADA POR AMBAS PARTES "EL CONTRATISTA" Y "EL AYUNTAMIENTO" (RESIDENTE DE OBRA).

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRAS PROFESIONALES A PRECIO UNITARIO Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

CLÁUSULAS: 003500

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO 1. 2 (UNO PUNTO DOS) DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: **$858,611.12 (Ochocientos Cincuenta y Ocho mil Seiscientos Once Pesos 12/00 M.N.) IVA INCLUIDO,** CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS. EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARÁN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA PRESTACIÓN DE OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **día 06 (seis) de agosto de 2018 (dos mil dieciocho)** y a concluirlos el **día 28 (veintiocho) de Septiembre de 2018 (dos mil dieciocho).**

CUARTA.- RECALENDARIZACIÓN.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA, SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACIÓN, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR EN UN MÁXIMO DE 07 SIETE DÍAS HÁBILES, LA SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE INICIO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO, NO TENDRÁ DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

QUINTA.- PRÓRROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRÓRROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 CINCO DÍAS HÁBILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. **"EL AYUNTAMIENTO"** TENDRÁ UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SI ESTO

0000405

NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLICITUD. DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA **"EL CONTRATISTA"** TIENE UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EL NUEVO PROGRAMA DE OBRAS.

SEXTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERÁN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LOS CUALES NO MODIFICARÁN EL CALENDARIO DE PRESTACIÓN DE OBRAS, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN RESPECTIVA SEGÚN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, **"EL AYUNTAMIENTO"** TENDRÁ UN PLAZO DE 05 DÍAS HÁBILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- **"EL CONTRATISTA"** RECIBIRÁ DE **"EL AYUNTAMIENTO"** UN **30% TREINTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO**, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LOS TRABAJOS EFECTUADOS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 50 (fracción II) DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

OCTAVA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 07 SIETE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO. EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO A RECALENDARIZACIÓN DE SU FECHA DE INICIO.

ESTE FOLIO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚB. DEL AYTO. DE SAYULA, AL ADMINISTRACIÓN 2015-2018

NOVENA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LAS ESTIMACIONES CONFORME A LOS AVANCES DE LA PRESTACIÓN DE OBRAS REALIZADAS, EN LAS FECHAS QUE "EL CONTRATISTA" DETERMINE, LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO EN MÁXIMO DE 05 CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, ESTA ULTIMA CONTARA CON UN TERMINO DE 03 TRES DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR ALGUNA OBSERVACIÓN, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, DE EXISTIR OBSERVACIÓN EN LA ESTIMACIÓN, SE LE HARÁ DEL CONOCIMIENTO AL CONTRATISTA INMEDIATAMENTE PARA QUE LA SUBSANE O CORRIJA Y UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS Y ACEPTADA LA ESTIMACIÓN, SE ABONARA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE QUE RESULTE DE LA ESTIMACIÓN PRESENTADA. EL RETRASO EN LA ENTREGA DEL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN POR PARTE DEL "AYUNTAMIENTO" SE APLICARÁ UNA SANCIÓN POR ATRASO QUE SE IRÁ INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE EL **"AYUNTAMIENTO"** NO ENTREGUE EL IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, DICHA SANCIÓN SE CALCULARÁ SEGÚN LA SIGUIENTE FORMULA:
SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: **=IE X 0.15 x ((FRE-FPE)-5)/30)**

IE= IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN.
FPE= FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN.
FRE= FECHA REAL DE ENTREGA DEL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN.

003501

DÉCIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO A JUICIO DE **"EL AYUNTAMIENTO"**, SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA **"EL AYUNTAMIENTO"** DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SEÑALE SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN LOS NUEVOS PRECIOS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE,

00000406

PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS DEBERÁ DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE LOS ANTERIORMENTE CONTRATADOS.

LA AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARÁ LA AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACIÓN PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO **"EL AYUNTAMIENTO"** CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

DÉCIMA PRIMERA.- FIANZAS.- DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, OTORGARA FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO, POR EL VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVÉS DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERÁ CONTENER, CUANDO MENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR "EL CONTRATISTA" EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, SEGÚN ASIGNACIÓN DE OBRA. ASÍ MISMO PARA GARANTIZAR LAS EROGACIONES QUE **"EL AYUNTAMIENTO"** TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRAS RESPONSABILIDADES QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A PARTIR DE ESA FECHA, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, EL **"CONTRATISTA"** EXHIBIRÁ LA FIANZA CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS, Y QUE SOLO PODRÁ CANCELARSE POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO O POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO, SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA FIANZA, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SURTIRÁ EFECTOS.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DÉCIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, SE LIQUIDARÁ EL MONTO RESTANTE PACTADO EN LA SEGUNDA CLÁUSULA DE ESTE CONTRATO, ASIMISMO SE DEBERÁ ENTREGAR Y FIRMAR DE CONFORMIDAD POR **"LAS PARTES"**, CARTA FINIQUITO EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE TANTO **"EL AYUNTAMIENTO"** COMO **"EL CONTRATISTA"**, RUBRICAN LA SATISFACCIÓN DE LA OBRA TERMINADA Y NO SE TIENE PAGO ADEUDADO O TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR.

003502

DÉCIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS.- **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ ENCOMENDAR O SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, PREVIA PETICIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO A **"EL AYUNTAMIENTO"**.

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS, ASÍ COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, DESLINDANDO A PARTIR DE ESTE MOMENTO AL **"AYUNTAMIENTO"** DE CUALQUIER ACCIÓN DE CARÁCTER CIVIL, LABORAL, ADMINISTRATIVA Y PENAL.

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.- EN CASO DE REQUERIR MODIFICACIONES AL PROYECTO DEBERÁN SER NOTIFICADAS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA SU AUTORIZACIÓN O RECHAZO, DEBIENDO SER POR ESCRITO TANTO LA SOLICITUD COMO LA RESPUESTA.

00000407

DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN.- **"EL AYUNTAMIENTO"** A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A **"EL CONTRATISTA"** LAS OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO.- **"EL CONTRATISTA"** QUE NO CONCLUYA LA PRESTACIÓN DE OBRAS EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, CONFORME A LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, CUBRIRÁ TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA, LO ANTERIOR CON BASE A LA SIGUIENTE FORMULA: SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: **= 0.15x (IC-IE).**

IC= INVERSIÓN CONTRATADA
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.

DÉCIMA OCTAVA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMÁS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARÁ UNA SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS QUE SE IRÁ INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE **"EL CONTRATISTA"** NO ENTREGUE TOTALMENTE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DICHA SANCIÓN SE CALCULARÁ SEGÚN LA SIGUIENTE FORMULA: SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS: **=0.15x x (FTR-FTA)/30**

IC= INVERSIÓN CONTRATADA
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS.
FTA= FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA NOVENA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DE FINIQUITO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS A LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA PÚBLICA A MAS TARDAR 30 DÍAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACIÓN. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACIÓN TARDÍA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PÚBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS PARA PAGO. PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE **"EL AYUNTAMIENTO"**, NO SEA IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE **"EL AYUNTAMIENTO"** PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A **"EL CONTRATISTA"**.

VIGÉSIMA.-RESCISIÓN.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO; SIENDO NECESARIO QUE SE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES EN ESTA CIUDAD DE SAYULA, JALISCO Y SE OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

003503
SECRETARÍA GENERAL
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

VIGÉSIMA PRIMERA.- PAGO POR RESCISIÓN.- SI ALGUNA PARTE OPTA POR LA RESCISIÓN, LA PARTE RESPONSABLE DE LA CAUSA DE LA RECISIÓN ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL A FAVOR DE LA OTRA PARTE HASTA EL MONTO DE LA GARANTÍA OTORGADA.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO Y NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO **"LAS PARTES"** SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO QUE POR RAZÓN DE DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS **"LAS PARTES"** DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAYULA, JAL. **01 (uno) de Agosto de 2018 (dos mil dieciocho).**

POR EL *"AYUNTAMIENTO"*

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

ABOG. JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES.
SÍNDICO MUNICIPAL.

003504

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

L.C.P. ADRIANA GARCÍA RODRÍGUEZ.
TITULAR ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

"EL CONTRATISTA"

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
DAVEGA SERVICE CONCRETOS S.A. DE C.V.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00000409

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

COPIA DEL CHEQUE

15592198

23 de agosto de 2018

Páguese por este cheque a la orden de: DAVEGA SERVICE CONCRETOS S.A DE C.V.

Fecha

$ 336,693.47

(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

3952-513-200170-001116540201-000004.1

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	00111654020	CH 41

CONCEPTO DEL PAGO: 223 PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
623	1 - 6300 - 6142	5504	336,693.47		
111	1 - 01 - 83			336,693.47	
			003506		
		SUMAS IGUALES			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

Impresos JEC® P-1013NCR

00000410

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26980

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

DAVEGA SERVICE CONCRETOS S.A DE C.V. La cantidad de $ 336,693.47

(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA;

PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003507

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

YULA Jal., a 23 de AGOSTO de 20 18

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL SAYULA JAL

00000411

Folio: 223 Serie: A
Factura realizada por cuenta Admin.

Folio: 223 Serie: A

Fecha de emisión:	2018-08-23 12:56:43
Fecha de certificación:	2018-08-23T12:58:17
Certificado emisor:	00001000000407608456
Certificado SAT:	00001000000403442064
Tipo comprobante:	Ingreso

Davega Service
Concretos

DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV
RFC: DSC170824UH0
Régimen: 601, General de Ley Personas Morales
AV. JOSE MA GONZALEZ HERMOSILLO #202, Col. Ciudad GuzmÃ¡n Centro, C.P. 49000, , ZapotlÃ¡n el Grande, MÃ©xico
Teléfono: 3411328890
Correo: davega.service@hotmail.com

MUNICIPIO DE SAYULA , JALISCO

RFC: MSA8501018C8
Uso CFDI: I01, Construcciones

ESCOBEDO #52 Col. CENTRO C.P.: 49300, Sayula, SAYULA, 15

Folio fiscal:
AEDD9AFE-88AB-48B3-B9C5-950D0CE2AEE4
No. de comprobante: 223 Lugar expedición: 49000
Método de pago: PUE Pago en una sola exibición
Forma pago: 02-Cheque nominativo
Núm. Cuenta: 5366
Moneda: MXN Tipo cambio: 1.000000
Condiciones de Pago:

Factura

Cantidad	Código	Clave prod/sv	Clave unidad	Descripción	P/U	Importe
1		72121000	E48	PRIMERA ESTIMACION DE PAVIMENTACIÓN CALLE PORFIRIO DIAZ, IMPORTE DEL 100% DE LA ESTIMACION SIN IVA $417,216.20, 16% IVA $66,754.59, TOTAL DE LA ESTIMACION $483,970.79, AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 145,191.24 NETO A FACTURAR $338,779.55, DEDUCCION 5% AL MILLAR $2,086.08, NETO A PAGAR $336,693.47	290,252.99	290,252.99
					Subtotal	290,252.99
				Traslado IVA	**Tasa 16%**	46,440.48
Trescientos treinta y seis mil seiscientos noventa y tres pesos 47/100 M.N.					**TOTAL**	336,693.47

003508

"Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|AEDD9AFE-88AB-48B3-B9C5-950D0CE2AEE4|2018-08-23T12:58:17|fc9g91TbPeBCTeYlmwO1P410Z2siXHJ7hklX3wWPJfyLRVyarQPQ68/OH7SWsso8lFSUDd9gmvb/rpR7a/YgTZT3mnmo47ZdtcpgvcAsyfXW/FQo+uZqBZnFxr8ZVezFvivxl1vbpOdTfFW0FeRlbJ98MH0pdgxieT/kXps2b16ueexP4qH93ZSKe1bqp6jNZO2fUtBbREwii18uXLubKowoQarw3NeDr10M9egMubl6oGzWdbwO3UvcP1ZYB9y1qy9Araz2xJqfM6ACRFtfbBF4AnjKhlCPt5FQa8cilTj469sSEg/ZPUdpyb7lPHCuEhSzeiXGa7zymzP2mgWezQ==|00001000000403442064|

Sello Digital del Emisor:

fc9g91TbPeBCTeYlmwO1P410Z2siXHJ7hklX3wWPJfyLRVyarQPQ68/OH7SWsso8lFSUDd9gmvb/rpR7a/YgTZT3mnmo47ZdtcpgvcAsyfXW/FQo+uZqBZnFxr8ZVezFvivxl1vbpOdTfFW0FeRlbJ98MH0pdgxieT/kXps2b16ueexP4qH93ZSKe1bqp6jNZO2fUtBbREwii18uXLubKowoQarw3NeDr10M9egMubl6oGzWdbwO3UvcP1ZYB9y1qy9Araz2xJqfM6ACRFtfbBF4AnjKhlCPt5FQa8cilTj469sSEg/ZPUdpyb7lPHCuEhSzeiXGa7zymzP2mgWezQ==

Sello Digital del SAT:

dGp4vYLlY13l8Cr2pVqcDNcFoCp0ZqoxBtAQU4mpH1FVBkp37dNRHvYmxm5dkM93Sv1ljGZz14FoTLOZo7ltrEjbv23SQx8Op78jeQMqQmqTTDoe+SCJODfEk1fyZGM/hW7nN0pVOv3UXhBCpSMX5GGDdIXSncuygSFl09WB70x2msNCCf/gHqutXdJYFUKup74bgrMt5u6kqfr33+fwdNX88cGvOSQZPWDuc9ZwK4GJYsQV/SQeboL568V0jlVszlNJXkWNXhVnlWBZBi9L9/XJdj6C0uSJKV7tLQbRWXvQszu/AxAsEMZX26kOdi5PtwVl+cTf4i6+1nhD9D/VkDw==

RFC PAC: IAD121214B34

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00000412

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA

CARATULA DE LA ESTIMACIÓN

FECHA: 22-ago-18

Contrato: SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01
Orden de Trabajo:
Clave Presupuestal:
No. de Obra:
Contratista: DAVEGA SERVICE CONCRETOS
Obra: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

Localidad: SAYULA
Municipio: SAYULA
Fecha de Inicio: 6-ago-18
Fecha de Término: 28-sep-18
Estimación No.: 1 (uno)
Periodo: 6-ago-18 Al: 22-ago-18

003509

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	417,216.20	417,216.20
+ Aditiva	-	-
- Deductiva	-	-
+ IVA: 16%	66,754.59	483,970.79
- Amortización	145,191.24	338,779.55
Total	338,779.55	338,779.55

Avance	
Fecha Inicial:	06/08/2018
Financiero %	55.00%
Fisico %	55.00%
Documental %.	
Fecha:	Al: 22-ago-18

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	858,611.12	Esta Estimacion	483,970.79
Convenio Adicional	-	Acumulado Anterior	
Suma Escalatorias	-	Acumulado Actual	483,970.79
Total	858,611.12	Saldo	374,640.33

Anticipo		
Anticipo	30.000000%	257,583.34
Amort. Del acumulado		
Esta amortizaciòn		145,191.24
Total Amortizado		145,191.24
Saldo por Amortizar		112,392.10

Detalle	Federal	Estatal	Municipio
Importe	292,051.34		
Escalatoria			
IVA	46,728.21		
Total a Facturar	338,779.55		
2 al millar			
5 al millar	2,086.08		
Sanción			
Total a Pagar	336,693.47		

Sumas
292,051.34
-
46,728.21
338,779.55
-
2,086.08
-
336,693.47

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.

DAVEGA SERVICE CONCRETOS

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES

00000413

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

SAYULA

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			ESTIMACIÓN Nº:	UNO
CONTRATO Nº:	SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01	FRENTE:		PERIODO DE ESTIMACION:	6-ago-18 AL 22-ago-18
ORDEN DE TRABAJO:	AYUNTAMIENTO 2015 - 2018				
No. DE CONCEPTO:	2	CODIFICACION:		NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAVEGA SERVICE CONCRETOS
CONCEPTO:	MACHUELO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SECCION TIPO "L" DE 40X40X20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, Y ACABADO TIPO PECHO DE PALOMA Y DESCIMBRA.				

LOCALIZACIÓN EJE	TRAMO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUBTOTAL
1							
2	0+000		4.07	0.40	0.40	ML	4.07
3	0+000 ARCO		3.42	0.40	0.40	ML	3.42
4	0+000 al 0+020		18	0.40	0.40	ML	18.00
5	0+020 al 0+026.95		6.95	0.40	0.40	ML	6.95
6	0+026.95 al 0+029.70	DIAGONAL	4.09	0.40	0.40	ML	4.09
7	0+029.70 AL 0+038.20		8.5	0.40	0.40	ML	8.50
8	0+038.20 AL 0+040.95	DIAGONAL	4.05	0.40	0.40	ML	4.05
9	0+040.95 al 0+060		19.05	0.40	0.40	ML	19.05
10	0+060 al 0+080		20	0.40	0.40	ML	20.00
11	0+080 al 0+091.72		9.72	0.40	0.40	ML	9.72
12	0+091.72 ARCO		3.2	0.40	0.40	ML	3.20
13	0+091.72 al 0+180		2.59	0.40	0.40	ML	2.59
						ML	103.64

CROQUIS Y OBSERVACIONES

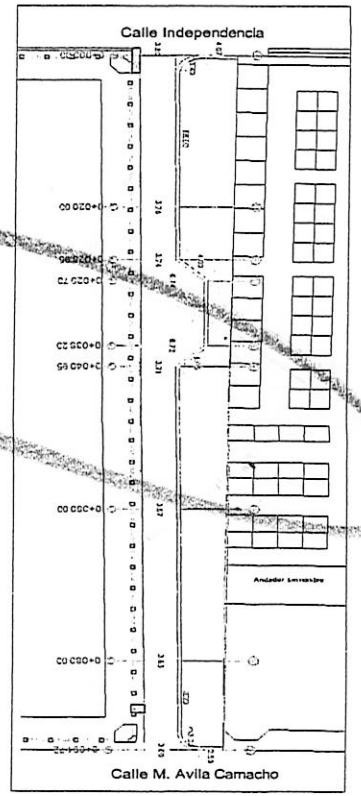

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

ELABORÓ	VALIDÓ	FECHA DE AUTORIZACION
DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES CONTRATISTA	ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO. SUPERVISIÓN MUNICIPIO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

00000411

NORTE

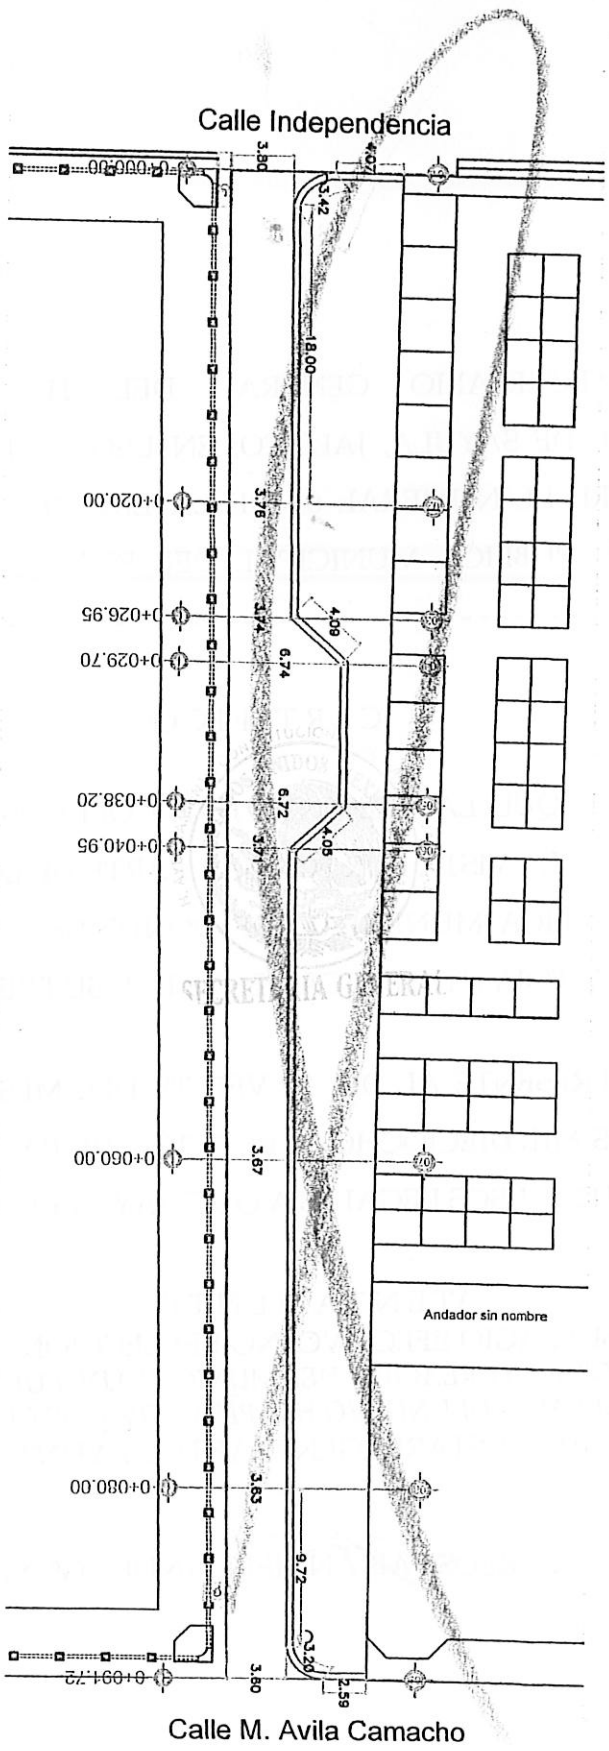

003513

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-20

00000415

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA

ALBUM FOTOGRAFICO					HOJA 5 DE 5		
OBRA:	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			ESTIMACIÓN Nº:	UNO		
CONTRATO Nº:	SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01	FRENTE:		PERIODO DE ESTIMACION:	6-ago-18	AL	22-ago-18
ORDEN DE TRABAJO: / No. DE CONCEPTO:	AYUNTRAMIENTO 15- 18	CODIFICACION:		NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAVEGA SERVICE CONCRETOS		
CONCEPTO:	MACHUELO DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2, SECCION TIPO "L" DE 40X40X20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, Y ACABADO TIPO PECHO DE PALOMA Y DESCIMBRA.						

LOCALIZACIÓN			PIEZA	OBSERVACIONES:
EJE	TRAMO	ID		

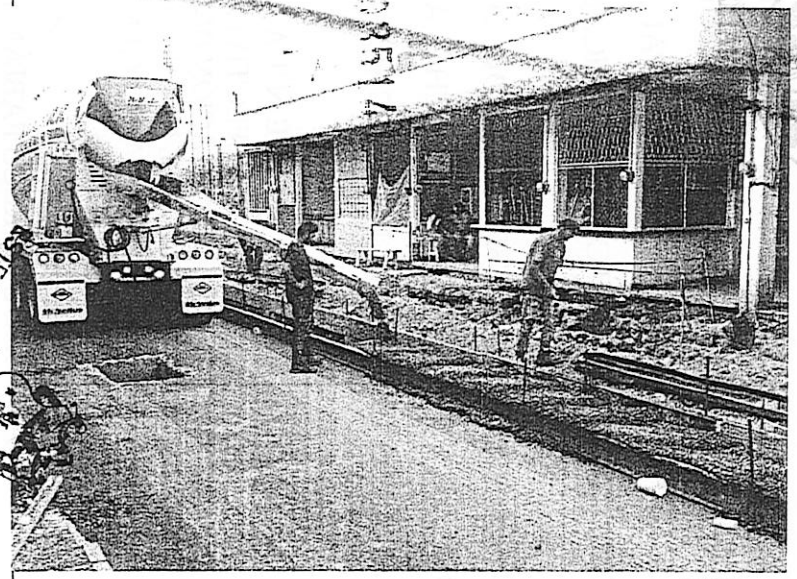

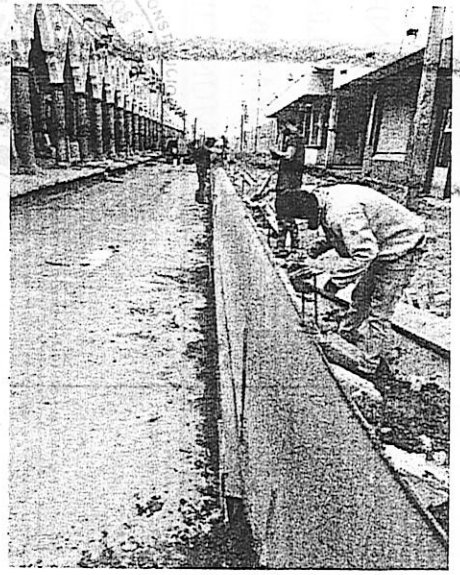

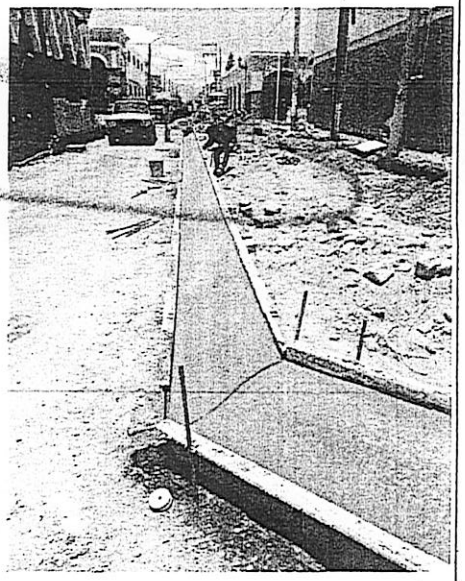

ELABORO	VALIDO	FECHA DE AUTORIZACION
DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES CONTRATISTA	ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO. SUPERVISIÓN MUNICIPIO	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00000416

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA

CUERPO DE LA ESTIMACION					HOJA 2 DE 5		
OBRA:	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			ESTIMACIÓN Nº: 1	uno		
CONTRATO Nº:	SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01	FRENTE:		PERIODO DE ESTIMACION:	6-ago-18	AL	22-ago-18
ORDEN DE TRABAJO:							
No. DE CONCEPTOS:	1	CODIFICACION:		NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAVEGA SERVICE CONCRETOS		

		CANTIDADES							IMPORTES			
CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	SALDO	IMPORTE ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR $	ACUMULADO ACTUAL $	SALDO POR EJERCER $
PARTIDA				0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 NORMAL 28 DIAS, REV.10 CM. TMA 40 MM DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE ELEMENTOS METALICOS Y VIBRADO DE CONCRETO.	M2	375.90	$ 950.00	$ 357,105.00	375.90		375.90	0.00	$ 357,105.00	0.00	$ 357,105.00	$ -
MACHUELO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, SECCION TIPO "L" DE 40X40X20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, Y ACABADO TIPO PECHO DE PALOMA Y DESCIMBRA.	ML	103.64	$ 580.00	$ 60,111.20	103.64		103.64	0.00	$ 60,111.20	0.00	$ 60,111.20	$ -
BANQUETA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, COLOR INTEGRAL ROJO, ACABADO ESTAMPADO, ESPESOR 8 CMS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ESTAMPADO Y DESCIMBRADO.	M2	448.56	$ 720.00	$ 322,965.79			0.00	448.56	$ -	0.00	$ -	$ 322,965.79
		SUBTOTAL		740181.99			0.00	740181.99	$ 417,216.20	0.00	0.00	0.00
		IVA		118429.12					$ 66,754.59			0.00
		TOTAL		$ 858,611.11	479.54	0.00	479.54	740630.56	$ 483,970.79	0.00		$ -

ELABORÓ	VALIDÓ	FECHA DE AUTORIZACION
DANIELA GEORGINA DA MOTA FUETES	ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.	
EMPRESA	SUPERVISIÓN MUNICIPIO	

0000417

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

SAYULA

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			ESTIMACIÓN N°:	UNO
CONTRATO N°:	SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01	FRENTE:		PERIODO DE ESTIMACION:	6-ago-18 AL 22-ago-18
ORDEN DE TRABAJO:	AYUNTAMIENTO 2015 - 2018				
No. DE CONCEPTO:	1	CODIFICACION:		NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAVEGA SERVICE CONCRETOS
CONCEPTO:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 NORMAL 28 DIAS, REV 10 CM, TMA 40 MM DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE ELEMENTOS METALICOS Y VIBRADO DE CONCRETO.				

LOCALIZACIÓN EJE	LOCALIZACIÓN TRAMO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUBTOTAL
VALLARTA				3.80			
1	0+000 AL 0+020		20	3.76	0.20	M2	75.60
2	ARCO ESQUINA0+000				0.20		1.30
3	0+020 AL 0+026.95		6.95	3.75	0.20		26.06
				3.74	0.20		0.00
4	0+026.95 AL 0+029.70		2.75	6.74	0.20		14.41
5	0+029.70 AL 0+038.20		8.5	6.72	0.20		57.21
6	0+038.20 AL 0+040.95		2.75	3.71	0.20		14.34
7	0+040.95 AL 0+080		39.05	3.68	0.20		143.31
8	0+080 AL 0+091.72		11.72	3.60	0.20		42.37
9	RCO ESQUINA0+091.7						1.30
						M2	375.90

CROQUIS Y OBSERVACIONES

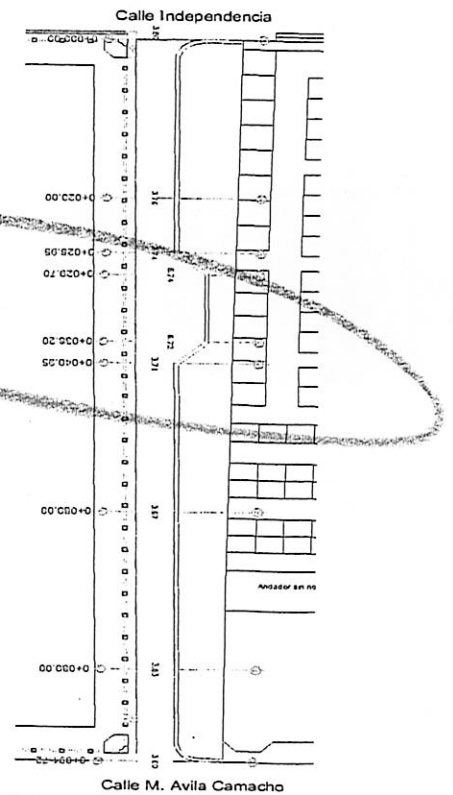

ELABORÓ
DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES
CONTRATISTA

VALIDÓ
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
SUPERVISIÓN MUNICIPIO

FECHA DE AUTORIZACIÓN

ESTE DOC. FORM. PARTE DE LA CUENTA PUB. SAYULA ADMINISTRACIÓN 2015-2018

00000418

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA

ALBUM FOTOGRAFICO

HOJA 4 DE 5

OBRA:	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			ESTIMACIÓN Nº:	UNO		
CONTRATO Nº:	SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01	FRENTE:		PERIODO DE ESTIMACION:	6-ago-18	AL	22-ago-18
ORDEN DE TRABAJO:							
No. DE CONCEPTO:	AYUNTAMIENTO 15- 18	CODIFICACION:		NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAVEGA SERVICE CONCRETOS		
CONCEPTO:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 NORMAL 28 DIAS, REV 10 CM, TMA 40 MM DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE ELEMENTOS METALICOS Y VIBRADO DE CONCRETO.						

LOCALIZACIÓN			PIEZA	OBSERVACIONES:
EJE	TRAMO	ID		
DEL 01 AL 08				

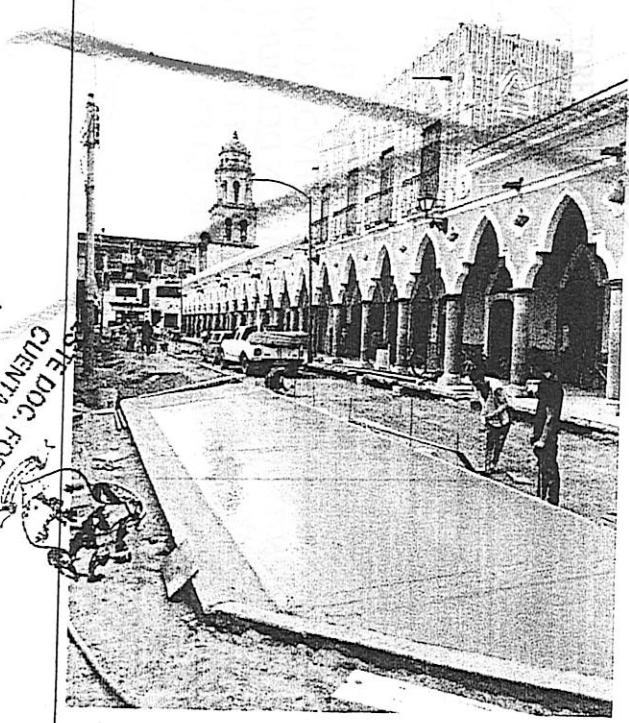

ELABORO	VALIDO	FECHA DE AUTORIZACION
DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES CONTRATISTA	ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO. SUPERVISIÓN MUNICIPIO	

ADMINISTRACION 2018-2021
SAYULA, JAL.
CUENTA PUB. DEL MTO. DE
ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
008515
0000041

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
DA MOTA
FUENTES
DANIELA GEORGINA
EDAD 28
SEXO M
DOMICILIO
C CEDRO 34
FRACC LAS PALMAS 36200
ROMITA, GTO
FOLIO 0000143288841 AÑO DE REGISTRO 2002 04
CLAVE DE ELECTOR DAFNDN83111111M000
CURP MOFD831111MGTTNN02
ESTADO 11 MUNICIPIO 020
LOCALIDAD 0001 SECCION 2059
EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022
FIRMA

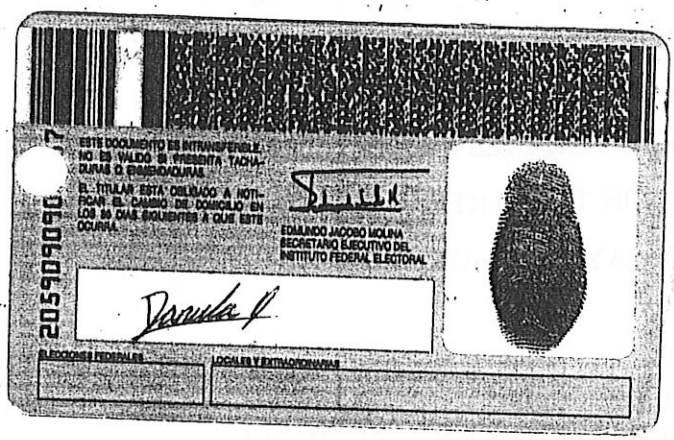
205909090 17
ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
ELECCIONES FEDERALES
LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA GENERAL

003516

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00000420

BBVA Bancomer

CHEQUE POLIZA

44529921

COPIA DEL CHEQUE

Páguese por este cheque a la orden de: DAVEGA SERVICE CONCRETOS S.A DE C.V.

Fecha: 03 DE SEPTIEMBRE 2018

$ 260,633.39

CON LETRA (DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

⑆169⑆513200170⑆00111654020⑈0000047

1

47

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	111654020	CH 48

CONCEPTO: ESTIMACION 227 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
9220	030	0-6142	260,633.39		
1112	01	87			

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

00000421

Impresos JEC® P-1013NCR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 26867

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

DAVEGA SERVICE CONCRETOS S.A. DE C.V. La cantidad de $ 260,633.39

(DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SECRETARIA GENERAL

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAYULA Jal., a 03 de SEPTIEMBRE de 20 18

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LIC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

00000422

Folio: 227 Serie: A
Factura realizada por cuenta Admin.

Folio: 227 Serie: A

Fecha de emisión:	2018-08-29 14:31:13
Fecha de certificación:	2018-08-29T14:35:48
Certificado emisor:	00001000000407608456
Certificado SAT:	00001000000403442064
Tipo comprobante:	Ingreso

Davega Service
Concretos

DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV
RFC: DSC170824UH0
Régimen: 601, General de Ley Personas Morales
AV. JOSE MA GONZALEZ HERMOSILLO #202, Col. Ciudad GuzmÃ¡n Centro, C.P. 49000, , ZapotlÃ¡n el Grande, MÃ©xico
Teléfono: 3411328890
Correo: davega.service@hotmail.com

MUNICIPIO DE SAYULA , JALISCO
RFC: MSA8501018C8
Uso CFDI: I01, Construcciones
ESCOBEDO #52 Col. CENTRO C.P.: 49300, Sayula, SAYULA, 15

Folio fiscal: 1B9CEAF3-A468-46A8-8205-81C60F6AE074
No. de comprobante: 227 Lugar expedición: 49000
Método de pago: PUE Pago en una sola exibición
Forma pago: 02-Cheque nominativo
Núm. Cuenta: 5366
Moneda: MXN Tipo cambio: 1.000000
Condiciones de Pago:

Factura

Cantidad	Código	Clave prod/sv	Clave unidad	Descripción	P/U	Importe
1		72121000	E48	SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTACIÓN CALLE PORFIRIO DIAZ IMPORTE DEL 100% SIN IVA $322,965.79, 16% IVA $51,674.53, TOTAL DE LA ESTIMACION $374,640.32, AMORTIZACION DEL ANTICIPO $112,392.09 NETO A FACTURAR $262,248.22 DEDUCCION 5% AL MILLAR, $1,614.83 NETO A PAGAR $260,633.39.	224,683.96	224,683.96
					Subtotal	224,683.96
				Traslado IVA	**Tasa 16%**	35,949.43
Doscientos sesenta mil seiscientos treinta y tres pesos 39/100 M.N.					**TOTAL**	260,633.39

"Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI"

Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|1B9CEAF3-A468-46A8-8205-81C60F6AE074|2018-08-29T14:35:48|DvOpEWRF+13JBhGL2bZ5+a2K5xTnqajtAOVskPJh6IDSxczUiKSZ9vk1Vp5NYWlg7xAr3RZPYHznBN/Aji65omuQzQoPzNeJ9bYEpCei1YJ8B2hkz/0915XktXq8tW/KPIGVZMCO3Ptzgo0OoY9gqFVAqTrYYcQiRe/A/AduDKWbn5+S3k8/ZVx9s613yAohvUAunI8LJOiVpHVha6YYPcWHNRMDgLCT8TVw+NUXJfnU/vfbAngl6vzzhCKrY1pLPTGWx5pZx9XexDY+XkNXxiUL4bxbuwT+krH3F5OYUWAycfk9ASjBI91mPV6y7f6x14ZJBgY6YHgIDARGZSaqbg==|00001000000403442064|

Sello Digital del Emisor:

DvOpEWRF+13JBhGL2bZ5+a2K5xTnqajtAOVskPJh6IDSxczUiKSZ9vk1Vp5NYWlg7xAr3RZPYHznBN/Aji65omuQzQoPzNeJ9bYEpCei1YJ8B2hkz/0915XktXq8tW/KPIGVZMCO3Ptzgo0OoY9gqFVAqTrYYcQiRe/A/AduDKWbn5+S3k8/ZVx9s613yAohvUAunI8LJOiVpHVha6YYPcWHNRMDgLCT8TVw+NUXJfnU/vfbAngl6vzzhCKrY1pLPTGWx5pZx9XexDY+XkNXxiUL4bxbuwT+krH3F5OYUWAycfk9ASjBI91mPV6y7f6x14ZJBgY6YHgIDARGZSaqbg==

Sello Digital del SAT:

VPxqtG6CdjKOfkbFLexo+aCy+eqdblLHe2qQQeChC0u02VokKl6txmyDUY4H1rH5UBMEpkrWGhbD7ZswNHXVNBxGl55QmhOD2xi0N6pKjf7PlUBBEdNz8FaShU3cVSyCLIDbbl6JIDo64W++y+0XVTzvsmYB6bzP37pPEp46GxPpMX/98xE3x7KwN17QI3oDFW8WNyFnnh96roly+CRK3xSp+keM7PtoSgujTpd/kBy9rkFvNJGjTsIvVruP/T8OCIbqMlraQzJjhd+CDW2catXafukjgWyVjPTYCFt6ELeMzROqH+N4cn3jq96fGydYXamaqLuZBILs/r6jFhWw==

RFC PAC: IAD121214B34

8270 - 0300 - 6172

DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00000423

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA

CARATULA DE LA ESTIMACIÓN

FECHA: 27-ago-18

Contrato: SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01
Orden de Trabajo:
Clave Presupuestal:
No. de Obra:
Contratista: DAVEGA SERVICE CONCRETOS
Obra: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

Localidad: SAYULA
Municipio: SAYULA
Fecha de Inicio: 6-ago-18
Fecha de Término: 28-sep-18
Estimación No.: 2 (dos)
Periodo: 23-ago-18 Al: 27-ago-18

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	322,965.79	322,965.79
+ Aditiva	-	-
- Deductiva	-	-
+ IVA: 16%	51,674.53	374,640.32
- Amortización	112,392.09	262,248.22
Total	262,248.22	262,248.22

Avance	
Fecha Inicial:	06/08/2018
Financiero %	100.00%
Fisico %	100.00%
Documental %.	
Fecha:	Al: 27-ago-18

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	858,611.11	Esta Estimación	374,640.32
Convenio Adicional	-	Acumulado Anterior	483,970.79
Suma Escalatorias	-	Acumulado Actual	858,611.11
Total	858,611.11	Saldo	0.00

Anticipo		
Anticipo	30.000000%	257,583.33
Amort. Del acumulado		145,191.24
Esta amortizaciòn		112,392.09
Total Amortizado		257,583.33
Saldo por Amortizar		-0.00

Detalle	Federal	Estatal	Municipio
Importe	226,076.05		
Escalatoria			
IVA	36,172.17		
Total a Facturar	262,248.22		
2 al millar			
5 al millar	1,614.83		
Sanción			
Total a Pagar	260,633.39		

Sumas
226,076.05
-
36,172.17
262,248.22
-
1,614.83
-
260,633.39

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.

DAVEGA SERVICE CONCRETOS

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUETES

00000424

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA

0000042700000

CUERPO DE LA ESTIMACION

HOJA 2 DE 5

OBRA:	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			ESTIMACIÓN N°: 2	DOS	
CONTRATO N°:	SAY-OP/FONDEREG2017/01	FRENTE:		PERIODO DE ESTIMACION:	23-ago-18	AL 27-ago-18
ORDEN DE TRABAJO:						
No. DE CONCEPTOS:	1	CODIFICACION:		NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAVEGA SERVICE CONCRETOS	

		CANTIDADES							IMPORTES			
CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	SALDO	IMPORTE ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR $	ACUMULADO ACTUAL $	SALDO POR EJERCER $
PARTIDA				0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 NORMAL 28 DIAS, REV 10 CM, TMA 40 MM DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE ELEMENTOS METALICOS Y VIBRADO DE CONCRETO.	M2	375.90	$ 950.00	$ 357,105.00		375.90	375.90	0.00	$ -	357105.00	$ 357,105.00	$ -
MACHUELO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, SECCION TIPO "L" DE 40X40X20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, Y ACABADO TIPO PECHO DE PALOMA Y DESCIMBRA.	ML	103.64	$ 580.00	$ 60,111.20		103.64	103.64	0.00	$ -	60111.20	$ 60,111.20	$ -
BANQUETA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, COLOR INTEGRAL ROJO, ACABADO ESTAMPADO, ESPESOR 8 CMS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ESTAMPADO Y DESCIMBRADO.	M2	448.56	$ 720.00	$ 322,965.79	448.56		448.56	0.00	$ 322,965.79	0.00	$ 322,965.79	$ -
		SUBTOTAL		740181.99			0.00	740181.99	$ 322,965.79	0.00	0.00	0.00
		IVA		118429.12					$ 51,674.53			0.00
		TOTAL		$ 858,611.11	448.56	103.64	552.20	740181.99	$ 374,640.32	60111.20		$ -

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ELABORO	VALIDO	FECHA DE AUTORIZACION
DANIELA GEORGINA DA MOTA FUETES	ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.	
EMPRESA	SUPERVISIÓN MUNICIPIO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

SAYULA

0000426

NUMEROS GENERADORES

OBRA:	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			ESTIMACIÓN Nº:	DOS	
CONTRATO Nº:	SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01	FRENTE:		PERIODO DE ESTIMACION:	23-ago-18	AL 27-ago-18
ORDEN DE TRABAJO:	AYUNTAMIENTO 2015 - 2018					
No. DE CONCEPTO:	3	CODIFICACION:		NOMBRE DEL CONTRATISTA	DAVEGA SERVICE CONCRETOS	
CONCEPTO:	BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, COLOR INTEGRAL ROJO, ACABADO ESTAMPADO, ESPESOR 8 CMS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ESTAMPADO Y DESCIMBRADO.					

LOCALIZACIÓN EJE	LOCALIZACIÓN TRAMO	PIEZA	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD	SUBTOTAL
	0+000 al 0+91.72		4.891		0.08	m2	448.56
						M2	448.56

CROQUIS Y OBSERVACIONES

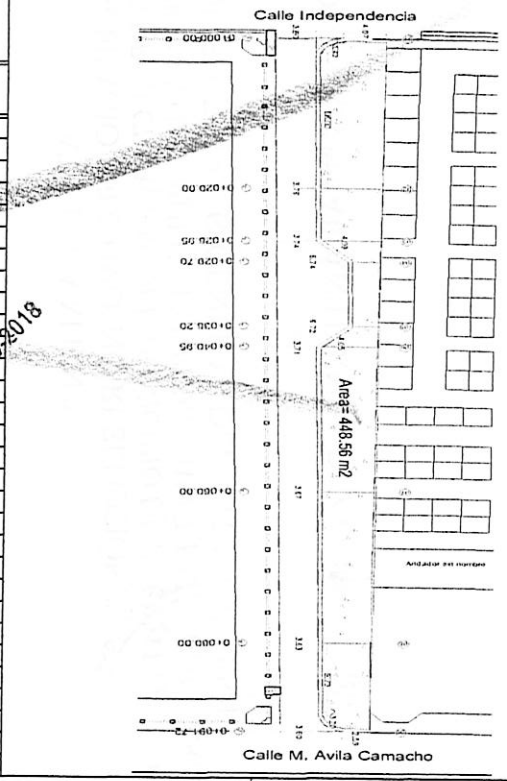

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ELABORÓ	VALIDÓ	FECHA DE AUTORIZACION
DANIELA GEORGINA DA MOTA FUETES CONTRATISTA	ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO. SUPERVISIÓN MUNICIPIO	

00000427

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

NORTE

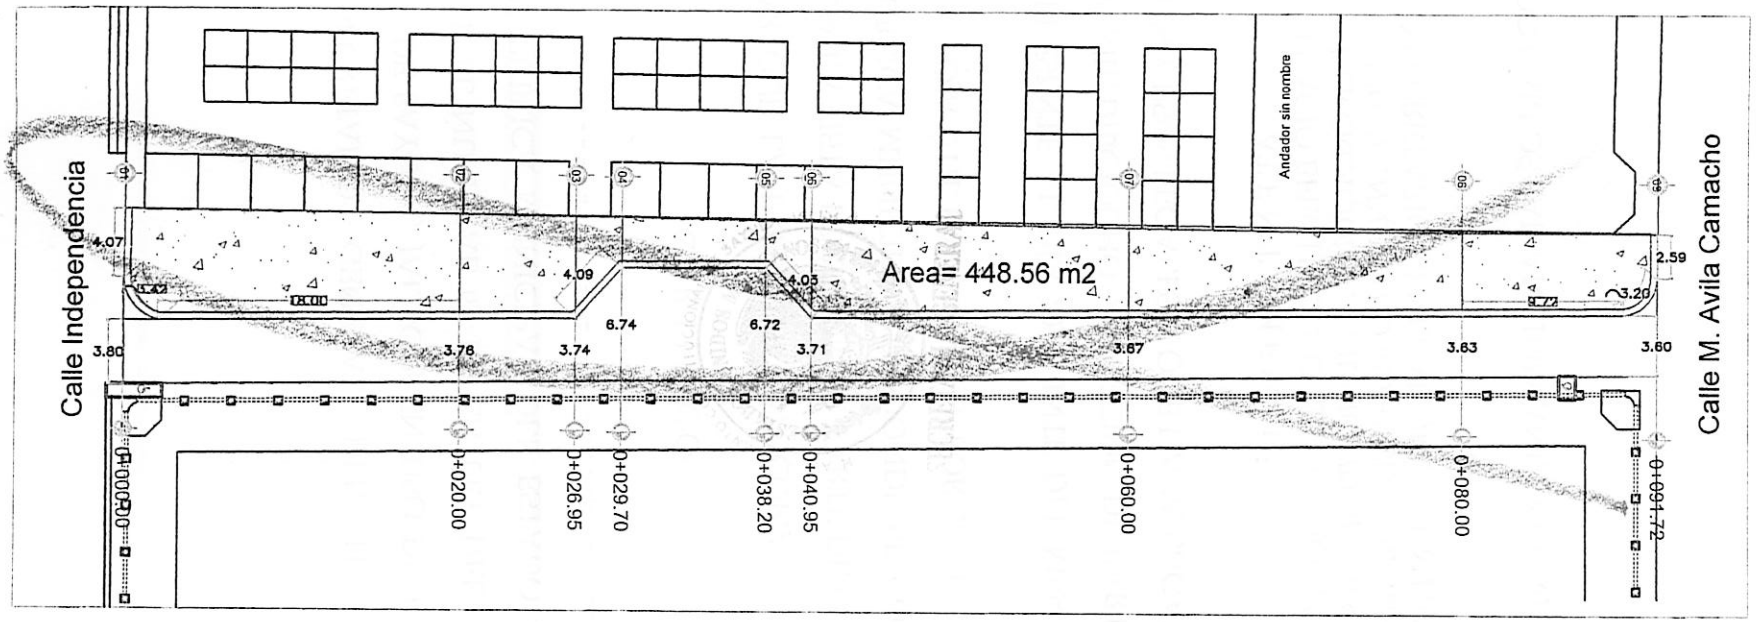

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SAYULA

ALBUM FOTOGRAFICO

OBRA:	PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ			ESTIMACIÓN Nº:	HOJA DE DOS		
CONTRATO Nº:	SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01	FRENTE:		PERIODO DE ESTIMACION:	23-ago-18	AL	27-ago-18
ORDEN DE TRABAJO:	AYUNTRAMIENTO 15- 18	CODIFICACION:		NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DAVEGA SERVICE CONCRETOS		
No. DE CONCEPTO:							
CONCEPTO:	BANQUETA DE CONCRETO F`C= 150 KG/CM2, COLOR INTEGRAL ROJO, ACABADO ESTAMPADO, ESPESOR 8 CMS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ESTAMPADO Y DESCIMBRADO.						

LOCALIZACIÓN			PIEZA	OBSERVACIONES:
EJE	TRAMO	ID		

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

ELABORÓ	VALIDO	FECHA DE AUTORIZACION
DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES	ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.	
CONTRATISTA	SUPERVISIÓN MUNICIPIO	

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES 18

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS 18

0285442850 EEED

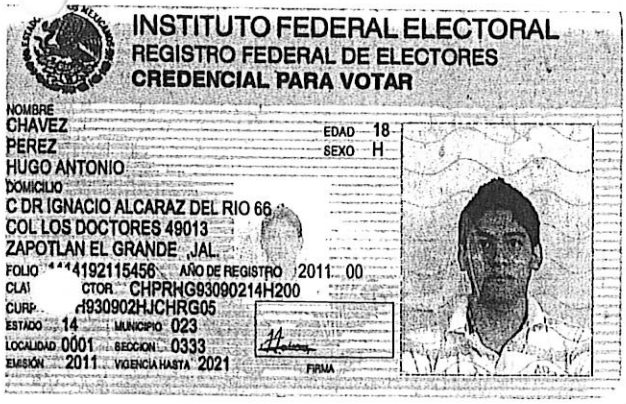

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CHAVEZ
PEREZ
HUGO ANTONIO

EDAD 18
SEXO H

DOMICILIO
C DR IGNACIO ALCARAZ DEL RIO 66
COL LOS DOCTORES 49013
ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

FOLIO 0444192115456 AÑO DE REGISTRO 2011 00
CLAVE CTOR. CHPRHG93090214H200
CURP H930902HJCHRG05
ESTADO 14 MUNICIPIO 023
LOCALIDAD 0001 SECCION 0333
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

0

0000043

BBVA Bancomer

7954765

COPIA DEL CHEQUE

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Páguese por este cheque a la orden de: RAMIRO OCHOA CUADRA Fecha $ 2,727.81

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 81/100 M.N.)

CON LETRA

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

⑆506⑆ 513 200 170⑆00 111 654 020⑈0000048

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO DE PROYECTOS REG.	11165 4020	48

FACTURA FE58642 PAGO POR LA COMPRA DE 3 BROCAL POZO DE VISITA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO IAZ DE ESTE MUNICIPIO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ofelia Chávez

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
829	1-03-04-6147		2,727.81		
1117	-01-87			2,727.81	

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 20984

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

RAMIRO OCHOA CUADRA La cantidad de $ 2,727.81

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 81/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR

LA COMPRA DE 3 BROCAL POZO VISITA PLASTICO PARA LA OBRA:PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO.

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Viga chávez

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL.

_____ Jal., a ____ de 7 SEPTIEMBRE de 20 18

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

CH.

00000431

FERRETERIA COLON

RAMIRO OCHOA CUADRA R.F.C. OOCR7008315H5
COLON 453-B COL. CENTRO C.P. 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
Tels. 01(341) 41-2-69-99 Fax: 01(341) 41-2-36-07 Nextel 04533-307-72657 ID 62*14*7235 E-mail: colon453@yahoo.com.mx
Lugar de Exp. : CP: 49000 ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO

Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
FE58642
Fecha de Timbrado
2018-08-15T13:39:11

Folio Fiscal
C967B0A1-B52E-4CA5-875C-38029454349E

Datos del Cliente

Nombre : MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
Domicilio : ESCOBEDO 52
Colonia: , C.P. 49330, SAYULA, , JALISCO, MEXICO
Rfc : MSA8501018C8 **Tels:**
Clave : 0287 **Agente:** 9 **Lista de Precios:** Precio 3

Fecha de Emisión
2018-08-15T13:35:26
Vencimiento
30/08/2018
Condiciones
QUINCE DIAS

Observaciones:

Folio Referencia:
Horario Entrega:

Cant	Código	UdeM	Clave SAT	Descripción	%Des	IVA	Precio Unit.	Importe
3	B831	PZA	H87	30121605 BROCAL POZO VISITA PLASTICO		16	$783.85	$2,351.56

Total De Peso: (0.00 Kgs)

Importe con Letra
DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 81/100 M.N.

Método De Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma De Pago : 99 Por definir
Uso de CFDI : G03 Gastos en general
Tipo de Relación de CFDI :
UUID :
Moneda: MXN Peso Mexicano

Totales	
Subt. 16% :	$2,351.56
Subt. 0% :	
SubNeto :	$2,351.56
IVA :	$376.25
Total :	$2,727.81

Sello Digital CFDI
LFVJ27xsNlluXnhrNm6jFPDex9bgbbXg+EExmLjGEq2n/7yD1QW+YMOx/fS9fn4kxyO70dVqNcnAXXPNX9vfBe1+3jnb/fVVNCCoiqeIfzlXrl4ANfCLStbd5JeWbKqL0391A+P091DaHrqxD0tshLW4anwz1ae1dvete3S
SrPiF9tWjlRQkQEEdmk/MmxohdA8XCax6Z9rSGnec0oCaCE6Omu0R6HRbq73duCqlM+ERAt2+yvw5xYG9yXQKlz8+OMKmVro2Dw/2P14581SSx4GCBHcqQxLnVENHn6fhhGPVYyrW7Pj560Q7W3AuLB9LapK

Sello Digital SAT
dl9Jvvi8CZzPrAL6hayy1meHaXOVm988vlFYU26ekgVYEG26y5RzBEVvk1+sGhmThV6EOYQ7FmrZgSxFG5nwra6DHWNlhSxVCzw/KLVBY4BZYsl/TGm4+jksCv9JckqO5lsd15iJTCWwltLlv0ojPxemxqzUAuNQp
Ggp88qB+XptHphKeXtLhHpRLXKlD/kDphFjmmBX2X0RFp5fKblUDTYhz7p6RSmLLlxEWeA9lDujY3emh75hV5LZSgRz+3KaDFJpQEqq6EmZ0vaUEPlQI5A550lHv780GRxPhzUvHT67e8HaictGl9Xe+2SUnyA1v

Cadena Original de Certificación Digital del SAT

||1.1|C967B0A1-B52E-4CA5-875C-38029454349E|2018-08-15T13:39:11|LFVJ27xsNlluXnhrNm6jFPDex9bgbbXg+EExmLjGEq2n/7yD1QW+YMOx/fS9fn4kxyO70dVqNcnAXXPNX9vfBe1+3jnb/fVVNCCoiqeIfzlXrl4ANfCLStbd5JeWbKqL03
91A+P091DaHrqxD0tshLW4anwz1ae1dvete3SSrPiF9tWjlRQkQEEdmk/MmxohdA8XCax6Z9rSGnec0oCaCE6Omu0R6HRbq73duCqlM+ERAt2+yvw5xYG9yXQKlz8+OMKmVro2Dw/2P14581SSx4GCBHcqQxLnVENHn6fhhGPVYyrW7Pj5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Certificado CFDI 00001000000411190802 **No. Certificado SAT** 00001000000404594081

Debo y Pagaré a la orden de RAMIRO OCHOA CUADRA en esta ciudad de JALISCO el día 30/08/2018 la cantidad de $ 2727.81 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 81/100 M.N.), valor de mercancia recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancia causando un interes moratorio del 9 % mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de titulos y operaciones de crédito en su articulo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y articulos correlativos.

FAVOR DE DEPOSITAR EN:

BANORTE CTA: 0523007173
CLABE: 072342005230071736
BANCOMER CTA: 0164120809
CLABE: 012342001641208097

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. **Firma :** _____

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

0000432

BBVA Bancomer

91516389

COPIA DEL CHEQUE

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Páguese por este cheque a la orden de: ALVARO ALFARO MUNGUIA

Fecha

$ 34,800.00

(TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CON LETRA

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

⑈836⑈ ⑆513200170⑆00111654020⑈00000050

9038

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO DE PROYECTOS REG.	11165 4020	50

CONCEPTO DEL PAGO

FACTURA 284 PAGO POR LA ELABORACION DE PUERTAS, REGISTROS, PARA LA OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MÚNICIPIO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alvaro Alfaro M

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
822	0 - 0300 - 6142	(5504)	34,800=		
1112	- 04 - 87			34,800	

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					00000433

Impresos TEC P-1013

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO SAY 20986

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

ALVARO ALFARO MUNGUIA **34,800.00**

La cantidad de $ _____

(TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PAGO POR

por el siguiente concepto

LA ELABORACION DE REGISTRO REFORZADO DE 80X50 CM , 16 HECHURA DE REGISTRO DE 50CM X50 CM, 12 HECHURA DE REGISTRO DE 20 CM X 40 CM, 2 HECHURA DE REGISTRO REFORZADO DE 1.50 MTS X 75 CM PARA LA OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO.

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Alvaro Alfaro

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAYULA, JAL.

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL

_____ Jal., a _____ de 7 SEPTIEMBRE de 2018

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

CH.

00000434

ALVARO ALFARO MUNGUIA

RFC: AAMA831114D17

Factura

Domicilio y Expedido en:
C.AQUILES SERDAN N° Ext.109 Col.SAN MIGUEL CP.49314,SAYULA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 49314
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA8501018C8
Domicilio: C.ESCOBEDO N° EXT.52 COL.CENTRO CP.49300,SAYULA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 0233A566-BAFC-2C43-867C-A1A6B57816EC
Número de comprobante: 284
Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Fecha comprobante: 2018-08-24T13:03:31
Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-24T13:07:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4	PZ	HECHURA DE REGISTRO REFORZADO DE 80 CM X 50 CM	1,600.00	6,400.00
16	PZ	HECHURA DE REGISTROS DE 50 CM X 50 CM	750.00	12,000.00
12	PZ	HECHURA DE REGISTRO DE 20 CM X 40 CM	350.00	4,200.00
2	PZ	HECHURA DE REGISTROS REFORZADOS DE 1.50 MTS X 75 CMX	3,700.00	7,400.00

Subtotal	30,000.00
IVA (16) %	4,800.00
Total	**34,800.00**

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000409576145

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0233A566-BAFC-2C43-867C-A1A6B57816EC|2018-08-24T13:07:16|SCD1101056S4|RBXl3BRJSfm/DHam916DfCS6lu8SAcFxGUACcpQBsXHA1bxb5ZF1i9j5MDnT0mOltfY9/+WNM9dUolqkhqICRy+ESOj+k72HzX4vadmiXYFOg9SBvgem4LISl7tg3iWFIe5aYeoPzPlWDqmhGJJlgdGlFbEARjFmJsjkWFojYhhRBZVlaB6zfWhQVQVjnuMga/cnEDpQlrP0jDxuRTXiRDaq+gmTYMDZ5QTLZ0ucn/ZDTZH1fyx0aaX/U5yUyFq/+pdO04rJAOn1w3yUEbt3heZqwCNt1X+4kNdq3zrEoSXZxQl3+eTJyTO8HPCoMh/lSnJ3d+pCgQ/iRT3NPGwQ==|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor:

RBXl3BRJSfm/DHam916DfCS6lu8SAcFxGUACcpQBsXHA1bxb5ZF1i9j5MDnT0mOltfY9/+WNM9dUolqkhqICRy+ESOj+k72HzX4vadmiXYFOg9SBvgem4LISl7tg3iWFIe5aYeoPzPlWDqmhGJJlgdGlFbEARjFmJsjkWFojYhhRBZVlaB6zfWhQVQVjnuMga/cnEDpQlrP0jDxuRTXiRDaq+gmTYMDZ5QTLZ0ucn/ZDTZH1fyx0aaX/U5yUyFq/+pdO04rJAOn1w3yUEbt3heZqwCNt1X+4kNdq3zrEoSXZxQl3+eTJyTO8HPCoMh/lSnJ3d+pCgQ/iRT3NPGwQ==

Sello digital del SAT:

t6yINZNwgnYQSYPARkwfl9PHSIlpEocOaFVUnpf9UMBQewOVctGKY+aleVYg/oevgcLfydO5JJgQYfXNgIpbtqSsudX332Qy0qHytmdTxJQ5qgZcNHMMnxSxGNqD77FoRCrKBqF/tre8qEcv1GccFVNgCbuO2W6QNozul6Q8KuF5qPfOVYgUdnqPVVRYl2mzubekLD8BD30PdUolfoXo0uCqFwYN/1qQaVaBedrNG9deYXAOQBRgE4uZou38QgXPWvgLQUt/BtXJjCsRLv0M42TV3t/flEMfkHB+zmMFX3Ar7D0eT0m3kBtGKp68CNJqeYfsABpyKYMkBuOwDIQ==

Emitido por: FACTUR@ Aspel de Mexico S.A. de C.V.

00000435

BBVA Bancomer

73796484

COPIA DEL CHEQUE

(1)

Páguese por este cheque a la orden de: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

$ 81,482.02

(OCHENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.)

CON LETRAS

Moneda Nacional

DBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma (s)

9182

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

0819: 513200170: 00111654020" 0000051

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO DE PROYECTOS REG.	11165 4020	51

FACTURA E8964 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Yesenia Aguilar

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
827	0 - 0300 - 6142	5504	81,482 02		
1112	- 01 - 87			81,482	02

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

Impresos JEC P-1013

00000436

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

1

ORDEN DE PAGO SAY 20983

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ La cantidad de $ 81,482.02

(OCHENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.)

PAGO POR

por el siguiente concepto

LA COMPRA DE ARENA, GRAVA, MANTECA VEGETAL, CEMENTO GRIS , BLOCK, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, VARILLA 3/8, CAL PERLA, VIAJES DE PIEDRA , HILO ALBAÑIL, DISCO DE DIAMANTE, CLAVOS, GUANTES, PINTURA AEROSOL, BANDA DE PLASTICO, POLIN 4X4, CIMBRAPLAY PARA LA OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO.

SEGÚN COMPROBANTE ANEXO

FORMA PARTE DE LA LIB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Yesenia Aguilar

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAYULA, JAL.

Jal., a _____ de 7 SEPTIEMBRE de 2018

HACIENDA MPAL. SAYULA, JAL.

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

LC. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

CH.

00000437

Factura E 3964

FERRE-MATERIALES GANTE

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

RFC: AUBL820329LK1 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000406868638

Folio Fiscal: 179e4d81-5966-46ae-8527-eba5ebc6ee32

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE	EXPEDIDO EN
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	CP:49300
RFC: MSA8501018C8	Fecha y hora de emisión: 2018-08-14T17:32:54
Uso CFDi: G03 - Gastos en general	

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
4	MTR - MT	11111700 - VIAJE ARENA	2,490.00	002 - IVA: 1593.60	9,960.00
3	MTR - MT	11111611 - VIAJE GRAVA	2,960.00	002 - IVA: 1420.80	8,880.00
5	H87 - pieza	15121500 - MANTECA VEGETAL	50.00	002 - IVA: 40.00	250.00
120	H87 - PZA	30111600 - SACO CEMENTO GRIS	163.79	002 - IVA: 3144.83	19,655.17
4000	H87 - PZA	30131502 - BLOCK	4.74	002 - IVA: 3034.43	18,965.20
20	KGM - KG	01010101 - ALAMBRE RECOCIDO	29.31	002 - IVA: 93.79	586.21
20	KGM - KG	01010101 - ALAMBRON	22.41	002 - IVA: 71.72	448.27
6	H87 - PZA	30102400 - VARILLA 3/8	136.21	002 - IVA: 130.76	817.24
[illegible]	H87 - PZA	30111600 - CAL PERLA 25 KILOS SACO	56.90	002 - IVA: 91.03	568.97
1	MTR - MTR	11111600 - VIAJE PIEDRA	2,979.31	002 - IVA: 476.69	2,979.31
4	H87 - pieza	11151700 - HILO ALBAÑOL 100 X 100	34.48	002 - IVA: 22.07	137.93
4	H87 - pieza	31191602 - Disco de diamante, rin segmentado, diámetro 4-1/2'	280.17	002 - IVA: 179.31	1,120.69
5	KGM - KG	31162000 - KILO CLAVO STD 2 1/2	36.21	002 - IVA: 28.97	181.03
5	H87 - pieza	46181500 - Guantes de carnaza, largo	161.21	002 - IVA: 128.97	806.03
6	H87 - pieza	31211501 - Pintura aerosol	42.24	002 - IVA: 40.55	253.45
6	H87 - pieza	41122703 - Banda de plástico 'precaución', 1000 ft	135.34	002 - IVA: 129.93	812.07
	H87 - PZA	30103622 - POLIN DE 4X4	163.79	002 - IVA: 209.66	1,310.34
	H87 - PZA	30111900 - CIMBRA PLAY 18 MM	837.07	002 - IVA: 401.79	2,511.21

SECRETARIA GENERAL

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Condiciones de Pago : PAVIMENTO PORFIRIO DIAZ

SubTotal $	70,243.12
+IVA (16%) $	11,238.90
=TOTAL $	81,482.02

00000438

CANTIDAD CON LETRA : OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 02/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 02 - Cheque nominativo

FECHA TIMBRADO : 2018-08-14T17:34:23

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

MKRdwJsVAKXRdSxK048FAuoELCLJ8wKd9N2Prv4/pyXeEiEs4ZRRXhxp9hUl8+kTjUDLIUedgZW6jIoIcHtak+UuourWHIRRDobmnSnqhQ4hAKN+dfuwExr+m/BB7B8309agthCxtvib9K0oce5wjjkm0LrqUYOmThzcdooAALnq853m3Na2w3/N3JkcOx4DTc6B2UcWt/7WKJwuGh4ghRNzUq1076sSvbDYksOsaoa8HhGHIDWFafbvxInYFB1xUZ4TPp0eITCov7EjeJUf34Fwfo2OPPJ4/dQzh5gpW1Hvzg6kgSIJTNicbD+ifKFFd2Da9mkht8KD+xuZozVcXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|179e4d81-5966-46ae-8527-e5a5ebc6ee32|2018-08-14T17:34:23|LSO1306189R5|MKRdwJsVAKXRdSxK048FAuoELCLJ8wKd9N2Prv4/pyXeEiEs4ZRRXhxp9hUl8+kTjUDLIUedgZW6jlolcHtak+UuourWHIRRDobmnSnqhQ4hAKN+dfuwExr+m/BB7B8309agthCxtvib9K0oce5wjjkm0LrqUYOmThzcdooAALnq853m3Na2w3/N3JkcOx4DTc6B2UcWt/7WKJwuGh4ghRNzUq1076sSvbDYksOsaoa8HhGHtDWFafbvxInYFB1xUZ4TPp0eITCov7EjeJUf34Fwfo2OPPJ4/dQzh5gpW1Hvzg6kgSIJTNicbD+ifKFFd2Da9mkht8KD+xuZozVcXA==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE DOC FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

CHEQUE POLIZA

BBVA Bancomer

COPIA DEL CHEQUE

58196771

Páguese por este cheque a la orden de: JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

Fecha 23 de agosto de 2018

$ 32,596.01

(TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO
RFC: MSA850101 8C8
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00111654020
GUADALAJARA, JAL.

Firma (s)

3912151320017010011165402010000045

BANCO	No. DE CUENTA	No. DE CHEQUE
FONDO PROY REG 2018	00111654020	CH 45

CONCEPTO DEL PAGO: 105 PAGO POR LA COMPRA DE TEPETATE Y GRAVA ARENA UTILIZADA EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
829	- 0300 - 6147	BSM	32,596	01	
112	- 501 - 37			32,596	01

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003529

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

Impresos JEC® P-1013NCR

00000440

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

1

ORDEN DE PAGO SAY 26978

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN La cantidad de $ 32,596.01

(TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

por el siguiente concepto PAGO POR LA COMPRA DE TEPETATE Y GRAVA ARENA

UTILIZADA EN LA OBRA; PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO

DIAZ DE ESTA CIUDAD. José Arturo Altamirano G.

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

003530

SEGUN COMPROBANTE ANEXO

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA JAL.

SAYULA Jal., a 28 de AGOSTO de 20 15

LIC. [illegible] RAMPOS AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAYULA, JAL.

LIC. ADRIANA [illegible] RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

HACIENDA MPAL SAYULA JAL

00000441

<IMG SRC="FA0000000105_Log.jpg">

I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: A 105

FECHA: 21/8/2018 13:51:00

Folio Fiscal: A31B54B9-14DC-4062-9823-1B133F890C52
Fecha y hora de certificación: Agosto 21 2018 - 13:51:05
Serie del Certificado del emisor: 00001000000305365791
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

CONDICIONES:

USO CFDi: P01 - Por definir

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN

RFC: AAGA9007197F7 Contreras Medellin No. 24 El Santuario, San Gabriel 49700
San Gabriel Jalisco México

EXPEDIDO EN: CP: 49700

CLIENTE:	SAYULA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	**R.F.C:** MSA8501018C8
DOMICILIO:	Escobedo No. 52, COLONIA: Sayula Centro, POBLACIÓN: Sayula, Jalisco, C.P.: 49300	
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir, **MÉTODO DE PAGO:** PPD - Pago en parcialidades o diferido, **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano		
Observaciones:		Referencia:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
70.0000	H19 - Hectómetro cúbico	TEPETATE SAT: 11111502	TEPETATE	120.00	002 - IVA - 1,344.00 --	8,400.00
105.0051	H19 - Hectómetro cúbico	GRAVAARENA SAT: 11111501	GRAVARENA	187.61	002 - IVA - 3,152.00 --	19,700.01

IMPORTE CON LETRA
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
621 - Incorporación Fiscal

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL:	28,100.01
ImpuestosTrasladados I.V.A. 16%:	4,496.00
Impuestos Retenidos	
TOTAL:	32,596.01

Sello digital del CFDI:

pGyx5Qpak5wnqM1Z97VyGCIPuzIXINZ0TDYvHkHT+JpnoYRMnhw1CjXJ+NuDNqixRCAX22AhzZHyrPcbixNrQ2
To+dxHxKXOOxXIOcKEh3dA0rdG7GqCQCrJD9+yM6DR71VusL6+0yZ30uQg3fpadtq4ZwbvKmX62s/P9ivRtXM=

Sello del SAT:

TFQ6Ax24DxzNUMUR9w1h+1GL58WvV91ZQtW80uqdjmbNyzmTsWIA1G6pHW22D7JtiH59r2MLD4WkRRoF
ll2q+NTQSUxopMM2vyQQIUXdUG9P34iHyaINozPkrD4r67yDWradj1mDeoWl66yBpI7b6+l1Ev+efLZR
sTJQWG5Rl10wcuDl9fgYLIVoQMjC0FksLgyfY55pefgMcz+lgsjLrKZV4QMS2Dap7TuyXdMqYUPOP9n
Pn4a2qcSpEEXZUhExGDWdtr3+aqgdBENAtcifcBsCMcyudJ/DHSwdwAA1eJJcMhW2r7kAcwWvlErYBwc
OH1PSYNdhPujWnDq3/EYaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A31B54B9-14DC-4062-9823-1B133F890C52|2018-08-21T13:51:05|MAS0810247C0|pGyx
5Qpak5wnqM1Z97VyGCIPuzIXINZ0TDYvHkHT+JpnoYRMnhw1CjXJ+NuDNqixRCAX22AhzZHyrPcbixNr
Q2To+dxHxKXOOxXIOcKEh3dA0rdG7GqCQCrJD9+yM6DR71VusL6+0yZ30uQg3fpadtq4ZwbvKmX62s/P
9ivRtXM=|00001000000404486074||

Banco:

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN en San Gabriel, Jalisco el día _____ la cantidad de: $32,596.01 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.), valor recibido en _____ mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Firma de Aceptación

003531

ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

00000442

INSURGENTES®
AFIANZADORA

Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta
RFC: AIS970115HG4
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 8
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	5319-10208-3
Código de Seguridad:	d5U5ygq
Folio:	1214632
Monto de la fianza:	$257,583.33
Monto de este movimiento:	$257,583.33

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 1 de Agosto de 2018 **Moneda:** MXN
Movimiento: Emisión
Fiado: DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:
Ante A FAVOR Y A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO.

ANTE: A FAVOR Y A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO.

"PARA GARANTIZAR POR: DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V., Y RFC DSC170824UH0, LA DEBIDA INVERSION O EN SU CASO LA DEVOLUCION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018, POR UN IMPORTE DE $858,611.12 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, REFERENTE A LA OBRA: "PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ". ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION

AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA EXPRESAMENTE DECLARA:

I.- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

II.- EN CASO QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA, EN LO QUE SE REFIERE A LA FIANZA O DE EXISTIR ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA.

III.- PARA SER LIBERADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO O POR LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO.

V.- LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 3, 11, ARTS. 279, 282, ARTICULOS 283, 290, 178, 289 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ASI COMO LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA JURISDICCION.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo:"NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

MARCIA GUILLERMINA BARRAGAN VARGAS

Firma Digital: XL0YGtyxrouh+pscpO44N9IF5NqWmXxcYc/aFLcd0w40hyNBbJj6UjxMZLZjaNtOlJ+yOD8h+ntsW14hZmv7bhucFOG9vnZrcTnoB9HeyIEIS/3/cmup+/+mli56vjyqofnRpTZcWCV03hWOdlvQwL8DoOMTSDttNA+KZrHWM=
Firmante: MARCIA GUILLERMINA BARRAGAN VARGAS, Serie Certificado: 00000100009900009121, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban

LÍNEA DE VALIDACIÓN
I15G A8ZA 18

E/R XX-IX-MMXVIII V.1

0861608
00000443

INSURGENTES®
AFIANZADORA

Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta
RFC: AIS970115HG4
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 8
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	5319-10209-0
Código de Seguridad:	ihgdRiT
Folio:	1214636
Monto de la fianza:	$85,861.11
Monto de este movimiento:	$85,861.11

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 1 de Agosto de 2018 **Moneda:** MXN
Movimiento: Emisión
Fiado: DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:
Ante A FAVOR Y A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO.

ANTE: A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO.

PARA GARANTIZAR POR DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V., Y RFC DSC170824UH0, CON DOMICILIO EN AV. TECNOLOGICO NO. 969, COLONIA CENTRO, C.P. 49000, CIUDAD GUZMAN, JAL. EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE SUS OBLIGACIONES A SU CARGO Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NO. SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018, ASI COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA, ASI COMO LA CORRECTA EJECUCION Y OPORTUNA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO AQUI MENCIONADOS, CELEBRADO CON LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO, RELATIVO A: "PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ". CON NUMERO DE OBRA SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01, CON UN IMPORTE TOTAL DE $858,611.12 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.) INCLUYE I.V.A..

I. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE AMPARA;

II. PARA CANCELAR LA PRESENTE FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA", LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE;

EN EL CASO DE LA FIANZA QUE SE CONSTITUYA COMO GARANTIA A LA QUE ALUDE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, DESPUES DE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DE PRESENTARSE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DEL MISMO REGLAMENTO, "EL CONTRATISTA" PRESENTARA ANTE LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO , EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA;

III. LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE GARANTIZA Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE AMPARA, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo:"NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

MARCIA GUILLERMINA BARRAGAN VARGAS

Firma eHO6IH42/cQaw13xsmpj9p0R4Y7TB5sAM2zXQFLS9g91Tw70Mn2fXTUSIINhvEVkHqlMn0TWPsruzC6l4Y2762tAT5JN6XGl4qiIGrEAEoGiS6x6VswtGK/7jOwGj1sEn533+0CVbaxfO4xU3M4ZW8Tbhm5+DoSISmFc+3NF6g=
Digital Firmante: MARCIA GUILLERMINA BARRAGAN VARGAS, Serie Certificado: 00001000009900009121. Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban

LÍNEA DE VALIDACIÓN
I15G A8ZZ 18

0861609
0000044

INSURGENTES®
AFIANZADORA

Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta
RFC: AIS970115HG4
Avenida Periférico Sur Número 4829, Interior Piso 8
Col. Parque del Pedregal
México 14010, Delegación Tlalpan, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número:	5319-10209-0
Código de Seguridad:	ihgdRiT
Folio:	1214636
Monto de la fianza:	$85,861.11
Monto de este movimiento:	$85,861.11

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, 1 de Agosto de 2018 **Moneda:** MXN
Movimiento: Emisión
Fiado: DAVEGA SERVICE CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:
Ante A FAVOR Y A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO.

RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME;

IV. LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. TRATANDOSE DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO, EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION SERA EL PREVISTO EN LOS ARTICULOS 279 AL 282 DE LA CITADA LEY, DEBIENDOSE ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 276 DE ESTA LEY:

V. LA PRESENTE FIANZA RESPONDE POR LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA PUBLICA QUE AMPARA, AUN CUANDO PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATARE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A QUE HACE REFERENCIA; Y

VI. PARA SER CANCELADA LA PRESENTE FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAYULA, JALISCO.

AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 36, 279, 280, 282, 283 Y 293, ASI COMO DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA JURISDICCION.

=FIN DE TEXTO=

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.afianzadora.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo:"NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

MARCIA GUILLERMINA BARRAGAN VARGAS

Firma Digital: eHO6IH42/cQA0j13rspnj9p0R4Y7TB5sAM2zXQFLS9g91Tw70Mn2fXTUSIfNhvEVkHqIMn0TWPsruzC6l4YZ762IAT5JN6XGI4qiIGrEAEoGS6x6VswIGK/7jOwGj1sEn533+0CVbaxfC4xU3M4ZW8Tbhm5+DoSlSmFc+3NF6g=
Firmante: MARCIA GUILLERMINA BARRAGAN VARGAS, Serie Certificado: 00001000009900009121, Prestador de Servicios de Certificación: Cecoban

LÍNEA DE VALIDACIÓN
I15G A8ZZ 18

0861610
00000445

E/R XX-IX-MMXVIII V.1

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCIÓN	OBRAS PÚBLICAS.
EXPEDIENTE	ÚNICO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

ACTA DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01

"Pavimentación y Servicios de la calle Porfirio Díaz del municipio de Sayula, Jalisco"

En la ciudad de Sayula, Jalisco; siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos del día 31 treinta y uno de julio de 2018 dos mil dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, ubicadas en la calle Mariano Escobedo número 52, colonia centro; el *C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO, EL C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR, LA C. DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA Y EJECUTOR DE OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO, EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO C. ABOG. JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES Y EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL C. ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO* fungiendo como testigos de asistencia, para llevar a cabo la firma de la presente **"ACTA DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO"**, para llevar a cabo la ejecución de la obra pública consistente en: ***"Pavimentación y Servicios de la calle Porfirio Diaz del municipio de Sayula, Jalisco"*** por un monto de *$858,611.12 (ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos once pesos 12/100 m.n.)*, bajo la modalidad de *"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y POR TIEMPO DETERMINADO"*.

Analizado el presupuesto correspondiente, calendario de obra y las especificaciones técnicas por parte de la Dirección Municipal de Obras Públicas, y toda vez que se ajusta con los *criterios de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad,* así como por *reunir las condiciones legales, técnicas y económicas* requeridas por este ente público *para garantizar de manera satisfactoria en tiempo y forma las obligaciones respectivas*, se determina adjudicar el contrato para la ejecución de la obra pública antes mencionada a la *C. DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.*

- *Cumpliendo con las condiciones legales exigidas a los licitantes.*
- *Concordando con la proposición, misma que incluye la información, documentación y requisitos establecidos en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.*
- *Las características, especificaciones y calidad de los materiales son los requeridos para la ejecución de dicha obra.*
- *El análisis, cálculo e integración de los precios son acordes con las condiciones de costos vigentes.*

Lo anterior co
166 y 182 [illegible]

SAYULA, JALISCO

OBRA: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

CONTRATO N°:	SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01	
ORDEN DE TRABAJO:		
No. DE CONCEPTOS:	3	

CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE
PARTIDA				0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 NORMAL 28 DIAS, REV 10 CM, TMA 40 MM DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE ELEMENTOS METALICOS Y VIBRADO DE CONCRETO.	M2	375.90	$950.00	$357,105.00
MACHUELO DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2, SECCION TIPO "L" DE 40X40X20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, Y ACABADO TIPO PECHO DE PALOMA Y DESCIMBRA.	ML	103.64	$580.00	$60,111.20
BANQUETA DE CONCRETO F`C= 150 KG/CM2, COLOR INTEGRAL ROJO, ACABADO ESTAMPADO, ESPESOR 8 CMS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ESTAMPADO Y DESCIMBRADO.	M2	448.56	$720.00	$322,965.79
			SUBTOTAL	$740,181.99
			IVA	$118,429.12
			TOTAL	$858,611.11

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 11/100 M.N.)

ELABORÓ

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUETES

EMPRESA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

00000447

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO.

Concurso No. -
Obra: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

Duración: 54 días naturales
Fecha: 04/08/2018

Inicio Obra: 06/08/2018
Fin Obra: 28/09/2018
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE INDEPENDENCIA Y AVILA CAMACHO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	PAVIMENTO HIDRAULICO	Análisis No.:		80			
Análisis:	**27**		**ml**		**103.6400**	**$60,111.20**	

MACHUELO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2, SECCION TIPO "L" DE 40X40X20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, COLADO Y ACABADO TIPO PECHO DE PALOMA Y DESCIMBRA.

MATERIALES							
365-VAR-0104	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS HIDRAULICOS	KG	$61.00	*	0.300000	$18.30	3.84%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8" Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$20.60	*	0.100000	$2.06	0.43%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$15.50	*	0.175000	$2.71	0.57%
365-CON-0102	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 K/CM2 11/2 REV 10+2	m3	$1,954.00	*	0.123600	$241.51	50.73%
365-VAR-0106	REGLA METALICA	PZA	$242.00	*	0.049663	$12.02	2.52%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$276.61**	**58.10%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$968.15	/	5.000000	$193.63	40.67%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$193.63**	**40.67%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$193.63	*	0.030000	$5.81	1.22%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$5.81**	**1.22%**
	(CD) Costo directo					**$476.04**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2739%	$48.91	
	SUBTOTAL1					$524.95	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.4428%	$2.32	
	SUBTOTAL2					$527.28	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	$52.73	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					**$580.00**	
	(* QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. *)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

0000044

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO.

Concurso No. -
Obra: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

Duración: 54 días naturales
Fecha: 04/08/2018

Inicio Obra: 06/08/2018
Fin Obra: 28/09/2018
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE INDEPENDENCIA Y AVILA CAMACHO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	PAVIMENTO HIDRAULICO	Análisis No.:		90			
Análisis:	**28**		**m2**		**448.5600**	**$322,965.79**	

BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE F´C=200KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/8, RR 28 DIAS, DE 8CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION DE PISO, HECHURA DE CONCRETO, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, TERMINADO ESTAMPADO PATA DE ELEFANTE COLOR OCRE.

MATERIALES							
365-CON-0101	CONCRETO PREMEZCLADO COLOR OCRE F'c=200 K/CM2 11/2 REV 10+2	m3	$2,450.00	*	0.082000	$200.90	34.00%
365-VAR-0104	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS HIDRAULICOS	KG	$61.00	*	0.100000	$6.10	1.03%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8" Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$20.60	*	0.050000	$1.03	0.17%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$15.50	*	0.175000	$2.71	0.46%
302-CEM-0202	CEMENTO BLANCO, TONELADA	TON	$3,800.00	*	0.002658	$10.10	1.71%
DESMOL	DESMOLDANTE	KG	$215.00	*	0.345000	$74.18	12.55%
MOLDE	MOLDE PARA CONCRETO ESTAMPADO	PZA	$615.00	*	0.075000	$46.13	7.81%
AGUAPIPA	AGUA ADQUIRIDA EN PIPA	m3	$37.56	*	0.003000	$0.11	0.02%
365-VAR-0106	REGLA METALICA	PZA	$242.00	*	0.001613	$0.39	0.07%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$341.65**	**57.81%**
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR	$968.15	/	4.000000	$242.04	40.96%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$242.04**	**40.96%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$242.04	*	0.030000	$7.26	1.23%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$7.26**	**1.23%**
	(CD) Costo directo					**$590.94**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2739%	$60.71	
	SUBTOTAL1					$651.66	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.4428%	$2.89	
	SUBTOTAL2					$654.54	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	$65.45	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					**$720.00**	

(* SETECIENTOS VEINTE PESOS 36/100 M.N. *)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRC. DE OBRAS PUBLICAS MPALES

00000449

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO.

Concurso No. -
Obra: PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

Duración: 54 días naturales
Fecha: 04/08/2018

Inicio Obra: 06/08/2018
Fin Obra: 28/09/2018
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE INDEPENDENCIA Y AVILA CAMACHO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	PAVIMENTO HIDRAULICO	Análisis No.:		100			
Análisis:	**29**		**m2**		**375.9000**	**$357,105.00**	

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 1" ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS EN LOSAS DE 3 X 4m INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, CIMBRA, CURADO, Y CALAFATEO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION.

MATERIALES							
365-VAR-0104	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS HIDRAULICOS	KG	$61.00	*	0.080000	$4.88	0.63%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8" Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	$20.60	*	0.040000	$0.82	0.11%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	$15.50	*	0.005000	$0.08	0.01%
365-VAR-0101	VARILLA LISA 6, (3/4), 6M, 2.24 KG/M	KG	$20.60	*	0.044000	$0.91	0.12%
359-CMB-0601	GRASA LUBRICANTE	LT	$60.00	*	0.002500	$0.15	0.02%
346-PHD-0113	TUBO PVC HIDRAULICO 25 MM RD-13.5	PZA	$102.00	*	0.002400	$0.24	0.03%
365-VAR-0102	CELOTEX DE 13 MM (1/2) HOJA DE 1.22X2.44	PZA	$242.00	*	0.002000	$0.48	0.06%
DESMOL	DESMOLDANTE	KG	$215.00	*	0.345000	$74.18	9.51%
MOLDE	MOLDE PARA CONCRETO ESTAMPADO	PZA	$615.00	*	0.075000	$46.13	5.92%
359-CMB-0701	ACEITE QUEMADO	LT	$5.00	*	0.060000	$0.30	0.04%
365-VAR-0103	MEMBRANA DE CURADO BASE AGUA	LT	$28.38	*	0.250000	$7.10	0.91%
365-CON-0103	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 K/CM2 11/2 REV 10+2	m3	$2,100.00	*	0.206000	$432.60	55.48%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$567.86**	**72.83%**
MANO DE OBRA							
2A+4A-U	CUADRILLA No. 76 (1 ALBAÑIL + 4 AY) URBANNIZACION	JOR	$2,317.44	/	11.500000	$201.52	25.84%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$201.52**	**25.84%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQRVIB	REGLA VIBRATORIA MODULAR WHITEMAN	HOR	$117.82	*	0.087805	$10.35	1.33%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$10.35**	**1.33%**
	(CD) Costo directo					**$779.72**	**100.00%**
	(CI) INDIRECTOS				10.2739%	$80.11	
	SUBTOTAL1					$859.83	
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.4428%	$3.81	
	SUBTOTAL2					$863.64	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	$86.36	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					**$950.00**	

(* NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

00000450

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO.

P R E S E N T E.-

Por este medio reciba un cordial saludo y deseo de éxito en todas las actividades que usted emprenda, a su vez aprovecho la ocasión para ***INFORMAR*** que el día ***06 de agosto de 2018***se dio ***INICIO*** la ejecución de la obra pública denominada ***"Pavimentación y servicios de la calle Porfirio Díaz"*** atendiendo la fecha establecida en el contrato bajo la referencia SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01.
Reiterando el compromiso adquirido, lo exhorto a supervisar los trabajos que se estarán llevando a cabo en la ejecución de la obra pública en cuestión.

Sin más por el momento, agradezco la atención recibida y quedando a su orden para cualquier duda o aclaración.

C. DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.
CONTRATISTA Y EJECUTOR DE OBRA

00000451

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO.

P R E S E N T E.-

Por este medio reciba un cordial saludo y deseo de éxito en todas las actividades que usted emprenda, a su vez aprovecho la ocasión para ***INFORMAR*** se recae en mi persona la responsabilidad como **SUPERINTENDENTE** a cargo de la obra pública denominada ***"Pavimentación y servicios de la calle Porfirio Díaz"*** misma obra que está amparada mediante contrato bajo la referencia SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01.
Reiterando el compromiso adquirido, lo exhorto a supervisar los trabajos que se estarán llevando a cabo en la ejecución de la obra pública en cuestión.

Sin más por el momento, agradezco la atención recibida y quedando a su orden para cualquier duda o aclaración.

C. DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.
CONTRATISTA Y EJECUTOR DE OBRA

00000452

OBRA: **"PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ"**

NOTA 01

06 DE AGOSTO DE 2018

CON FECHA 06 DE AGOSTO A LAS 9:00 HRS, INICIA LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, PARA LO CUAL SE PROCEDIO A LA RECEPCION DE PRUEBA DE COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO Y RECTIFICACION DE NIVELES, PARA DAR INICIO A LA COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA MACHUELO.

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.
RESIDENTE

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

00000453

OBRA: **"PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ"**

NOTA 02

08 DE AGOSTO DE 2018

SE COMIENZA CON EL COLADO DE MACHUELO DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2, SECCION TIPO "L" DE 40X40X20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, Y ACABADO TIPO PECHO DE PALOMA Y DESCIMBRA.

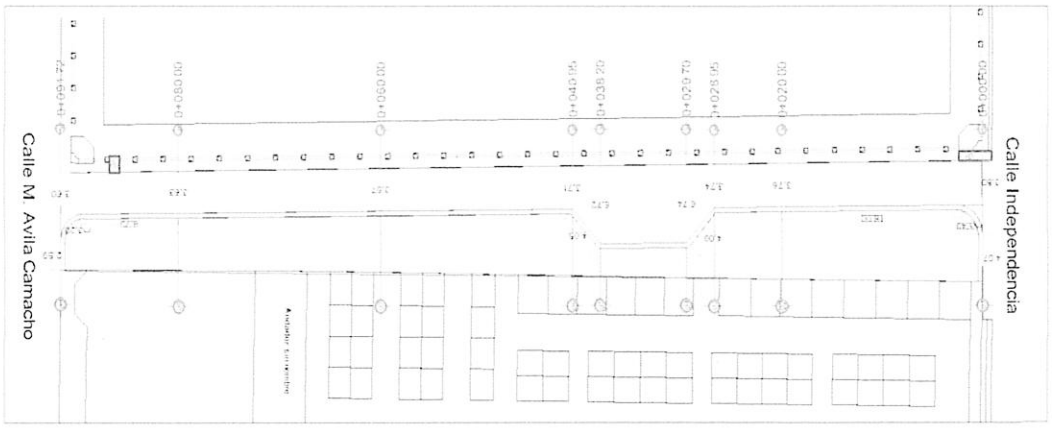

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.
RESIDENTE

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. 2015-2018
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES

00000454

OBRA: **"PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ"**

NOTA 03

11 DE AGOSTO DE 2018

SE TERMINO CON EL COLADO DE MACHUELO DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2, SECCION TIPO "L" DE 40X40X20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, Y ACABADO TIPO PECHO DE PALOMA Y DESCIMBRA.

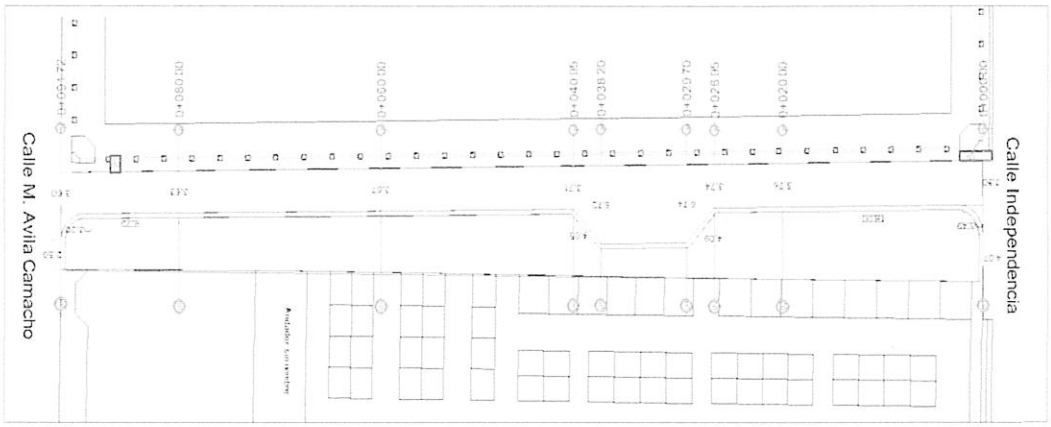

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.
RESIDENTE

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2015-2018 DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES.

00000455

OBRA: **"PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ"**

NOTA 04

13 DE AGOSTO DE 2018

SE COMIENZA CON LA RECTIFICACION DE NIVELES Y CON LA COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA EL POSTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 NORMAL 28 DIAS, REV 10 CM, TMA 40 MM DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE ELEMENTOS METALICOS Y VIBRADO DE CONCRETO. EL PUNTO DE INICIO ES EN LA ESQUINA DE MANUEL AVILA CAMACHO.

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.
RESIDENTE

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES

00000456

OBRA: **"PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ"**

NOTA 05

20 DE AGOSTO DE 2018

SE CONCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2 NORMAL 28 DIAS, REV 10 CM, TMA 40 MM DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA DE ELEMENTOS METALICOS Y VIBRADO DE CONCRETO. EL PUNTO DE INICIO ES EN LA ESQUINA DE MANUEL AVILA CAMACHO.

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.
RESIDENTE

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES

00000457

OBRA: **"PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ"**

NOTA 06

23 DE AGOSTO DE 2018

SE INICIA EL COLADO DE BANQUETA DE CONCRETO F`C= 150 KG/CM2, COLOR INTEGRAL ROJO, ACABADO ESTAMPADO, ESPESOR 8 CMS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ESTAMPADO Y DESCIMBRADO.

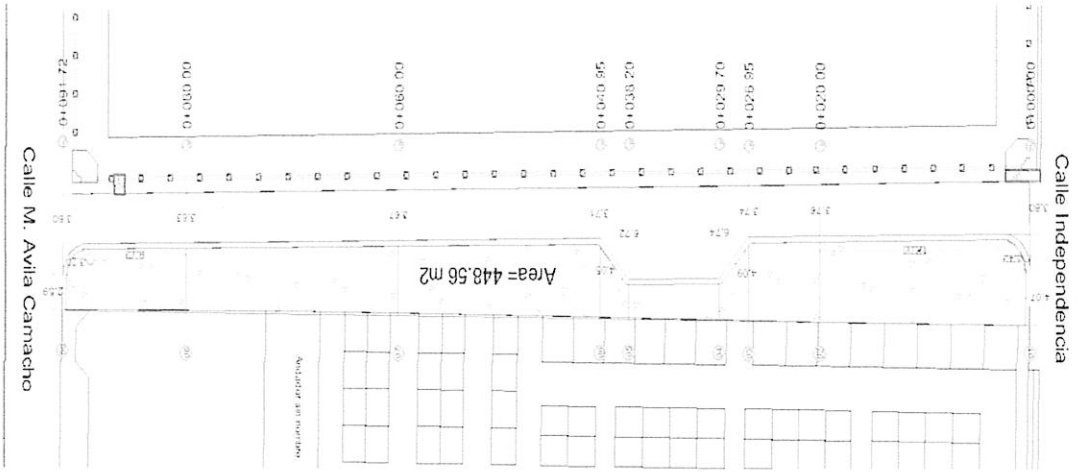

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.
RESIDENTE

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

00000458

OBRA: **"PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ"**

NOTA 07

27 DE AGOSTO DE 2018

SE TERMINA EL COLADO DE BANQUETA DE CONCRETO F`C= 150 KG/CM2, COLOR INTEGRAL ROJO, ACABADO ESTAMPADO, ESPESOR 8 CMS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ESTAMPADO Y DESCIMBRADO. POR CONSECUENTE SIENDO LAS 18:00 HRS SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ.

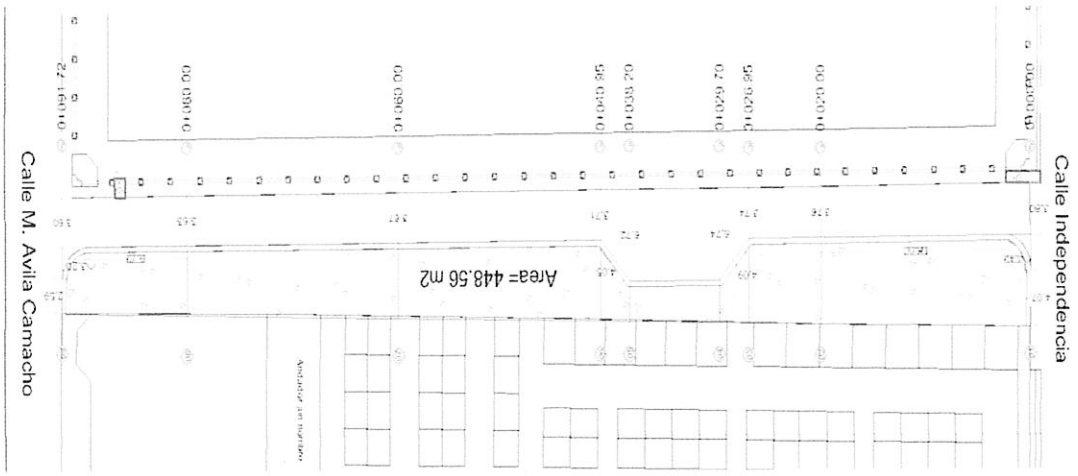

DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.
RESIDENTE

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

00000459

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO.

P R E S E N T E.-

Por este medio reciba un cordial saludo y deseo de éxito en todas las actividades que usted emprenda, a su vez aprovecho la ocasión para **INFORMAR** que el día ***27 de agosto de 2018*** se ***CONCLUYÓ*** la ejecución de la obra pública denominada ***"Pavimentación y Servicios de la calle Porfirio Díaz"*** cumpliendo cabalmente con los requisitos establecidos en el contrato de referencia SAY-OP/P.DIAZ-PDR/2018/01.

Sin más por el momento, agradezco la atención recibida y quedando a su orden para cualquier duda o aclaración.

C. DANIELA GEORGINA DA MOTA FUETES.
CONTRATISTA Y EJECUTOR DE OBRA

00000460

SAYULA, JALISCO

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA POR CONTRATACIÓN

PROGRAMA: **FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018**

MUNICIPIO: **SAYULA** LOCALIDAD: SAYULA EJERCICIO: 2018

FECHA DE INICIO: 06 DE AGOSTO DE 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE APROBACIÓN POR SESIÓN DE AYUNTAMIENTO: **16 DE ABRIL DE 2018**

NOMBRE DE LA OBRA:

"PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ"

INVERSIÓN TOTAL APROBADA $858,611.12
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN CONCURSO POR INVITACIÓN	CONTRATACIÓN CONCURSO POR LICITACIÓN
	X		

DATOS DE LA CONTRATISTA	
NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL)	DAVEGA SERVICE CONCRETOS S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIELA GEORGINA DA MOTA FUETES
RFC	DSC170824UH0
DOMICILIO	AV. JOSE MA. GONZALEZ HERMOSILLO nO. 202 CD. GUZMAN CENTRO, C.P.49000

Con fundamento en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

REPRESENTANTES DE LA EMPRESA

C. DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES.

00000461

ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS.

OBRA: *"PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ"*

En la ciudad de Sayula, Jalisco; siendo las 13:00 trece horas del día 31 treinta y uno de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, ubicadas en la calle Mariano Escobedo número 52, colonia centro; el *C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO, EL C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR, LA C. DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA Y EJECUTOR DE OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO, EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO C. ABOG. JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES Y EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL C. ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO* como testigos de asistencia, para llevar a cabo la firma del **"ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS"**, referente a la conclusión de la obra de ***"PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ"***, lo anterior en virtud de que se concluyó en los tiempos y las formas establecidas en el "***CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y POR TIEMPO DETERMINADO***", firmado con fecha del día 01 primero de agosto de 2018 dos mil dieciocho, cumpliendo cabalmente con los plazos de ejecución establecidos en el mismo contrato. Con las reservas de ley a posibles vicios ocultos y habiendo realizado la revisión correspondiente, el ***H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, POR CONDUCTO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JORGE CAMPOS AGUILAR*** se constató que la obra se realizó conforme a lo pactado en el contrato mencionado anteriormente, de igual manera la ***"C. DANIELA GEORGINA DA MOTA FUENTES CONTRATISTA Y EJECUTOR DE OBRA PÚBLICA"***, declara que recibió por parte del ***H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO***, el pago correspondiente por la realización de la obra antes descrita en los tiempos y formas establecidos; por tal motivo en este acto ***SE OTORGAN MUTUA Y RECÍPROCAMENTE EL MÁS AMPLIO Y TOTAL FINIQUITO RESP***

RESULTANTE
